



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE MURO-FACHADA, TAQUILLA, BAÑOS Y ACCESO (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) ✓

No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-15 ✓

PROGRAMA:

MONTO: \$ 730,048.70 ✓

SUBPROGRAMA:

FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 27/01/15 ✓ REAL 27/01/15 ✓

FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 25/02/15 ✓ REAL

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

DOMICILIO: AV. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA

TELÉFONOS:

TIPO DE TRABAJO: CONSTRUCCION DE FACHADA TAQUILLA ACCESO A ESTADIO ✓

REPRESENTANTE: ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

2.- REPRESENTANTE LEGAL


3.-

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:

DEL MUNICIPIO DE AHOME

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE

SUPERVISOR DE OBRA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

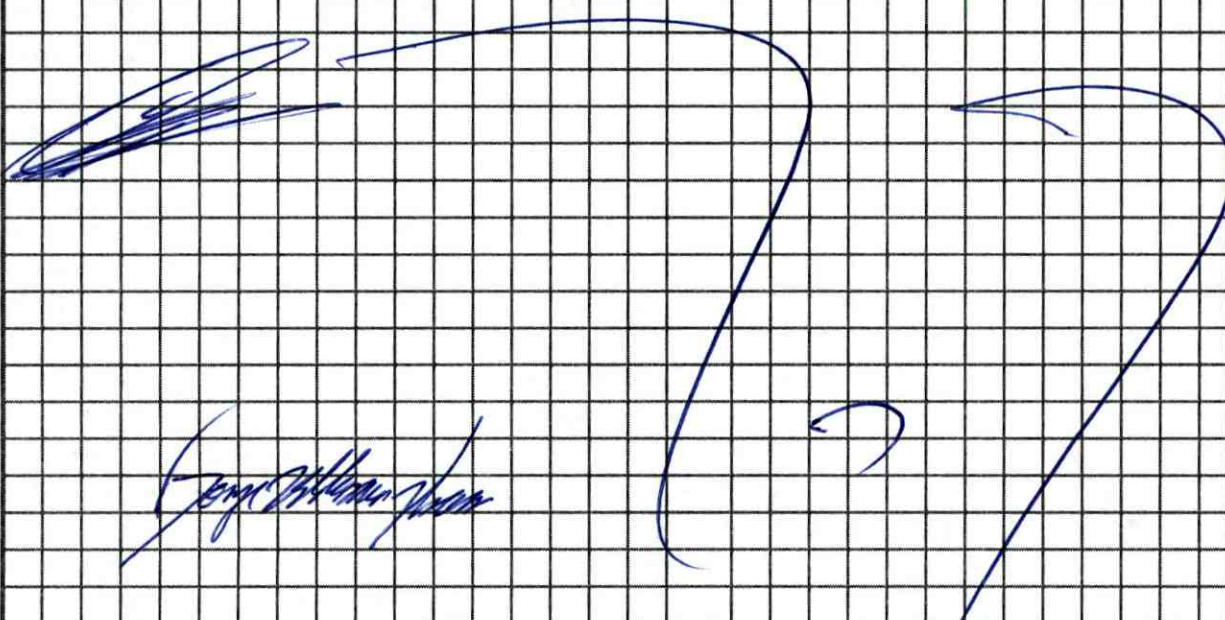
OBRA: CONSTRUCCION DE MURO-FACHADA, TAQUILLA, BAÑOS Y ACCESO (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 001

UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
EL CARRIZO ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
1	27/ENERO/2014	NOTA CON ESTA FECHA SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LOCALES Y FACHADA EN ESTADIO DEL CARRIZO POR LO QUE SE LE DA UN NIVEL Y TRAZO AL CONTRATISTA, INICIANDO CON TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A CONSTRUIR 

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE MURO-FACHADA, TAQUILLA, BAÑOS Y ACCESO (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
EL CARRIZO ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-15 ✓


No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

1/15/2015

NOTA 1
Se ha comenzado a trabajar con el
trazado de terreno para la construcción

NOTA 2
Se terminó en el cimentado y fondo
de zapatas y pilas

NOTA 3
Se está terminando de realizar
la excavación para la construcción



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE MURO-FACHADA, TAQUILLA, BAÑOS Y ACCESO (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 003

UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
EL CARRIZO ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-15 ✓

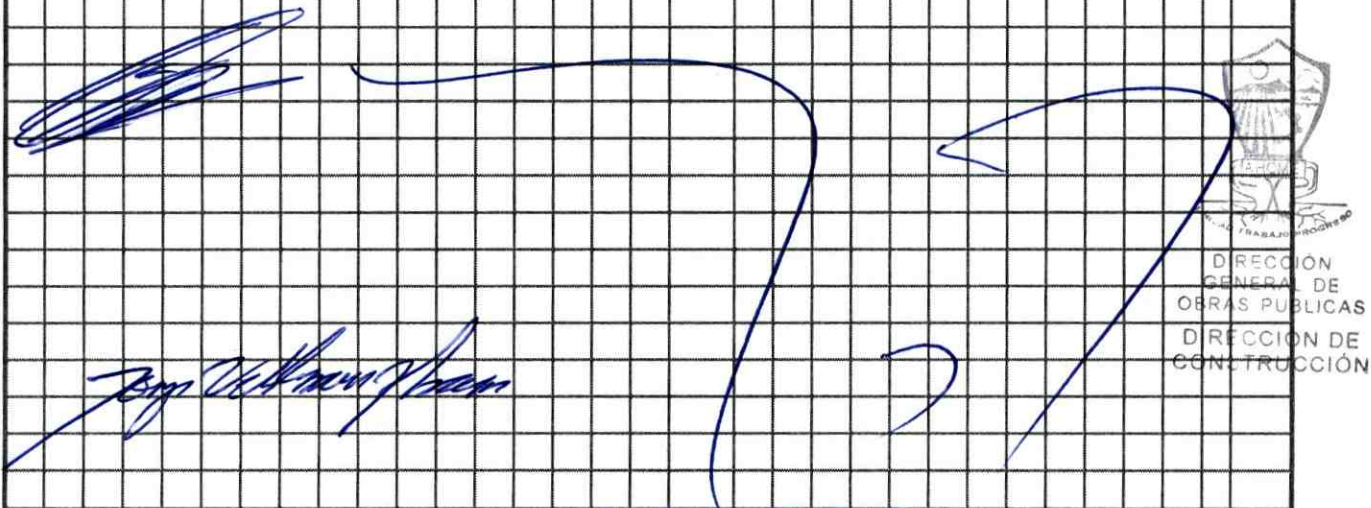
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

6/FEB/2011

NOTA 1
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE TAP
Y MUROS

NOTA 2
- SE TRABAJA CON EL CIMENTADO Y CEMENTO
DE PUNTO DE DESPUNTE ✓

NOTA 3
SE TRABAJA HABILITANDO ACCESO Y
MUROS PARA CERRILLOS Y PUNTO





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

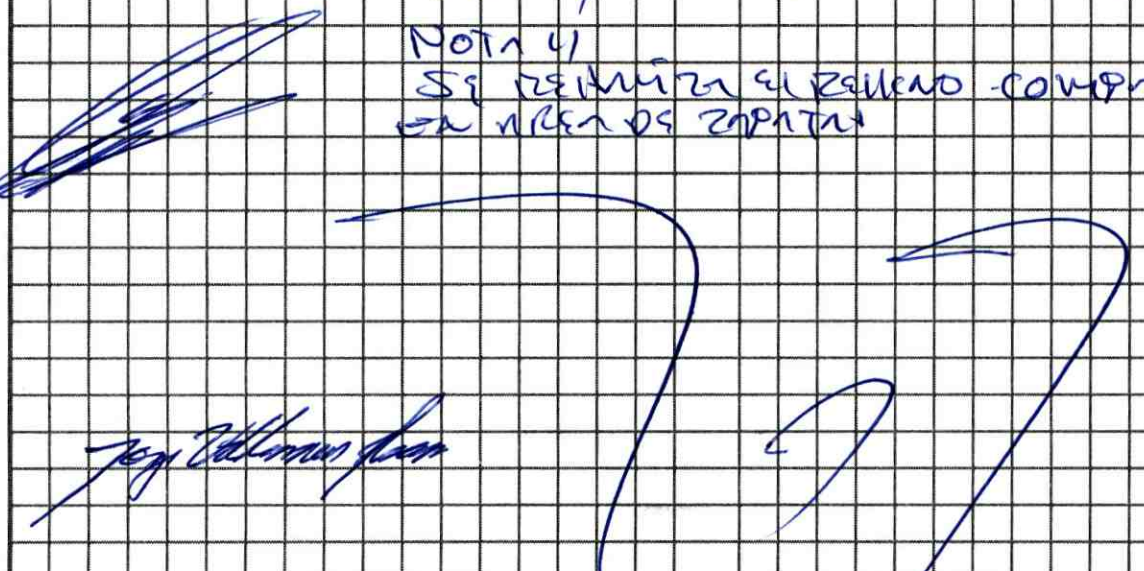
OBRA: CONSTRUCCION DE MURO-FACHADA, TAQUILLA, BAÑOS Y ACCESO (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 004

UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
EL CARRIZO ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	11/FEB/2015	NOTA 1 SE TRABAJA CON EL CIMENTANDO Y COLUMNO DE OLM ✓
		NOTA 2 SE HAN COLOCADO EL MURO DE BLOQUE DE CONCRETO REUNDO ✓
		NOTA 3 SE HAN HAZI VITANRO ACERO PARA OLMOS Y UNDEPA PARA LOS CASTILLOS ✓
		NOTA 4 SE REUNIZA EL REUNDO COMPACTADO EN AREA DE ZAPATA ✓
		


DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE MURO-FACHADA, TAQUILLA, BAÑOS Y ACCESO (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA ✓


HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
EL CARRIZO ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	13/feb/2015	Nota 1 SE TRABAJA CON RELUCCO COMPLETADO ENTRADA DE FIRMAS Y CIMENTACION Nota 2 SE TRABAJA CON LA COLOCACION DE OLIVOS DE CEMENTO Nota 3 Ya quedo colocado todo los muros de bloques y se esta procediendo al AMPLIARLO DE CIMENTOS Y MADERA PARA LOSA 


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

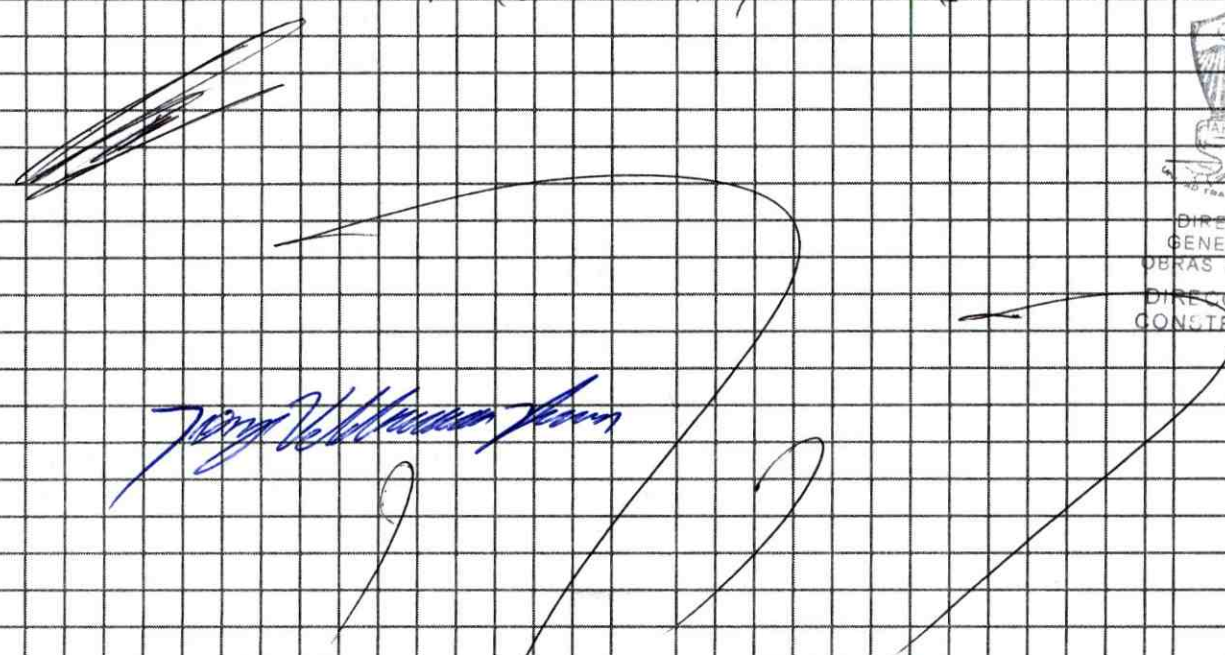
OBRA: CONSTRUCCION DE MURO-FACHADA, TAQUILLA, BAÑOS Y ACCESO (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓


HOJA DE BITACORA No. 006

UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
EL CARRIZO ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	14/FEB/2015	NOTA 1 - en fecha ya se colocó concreto en los muros de acceso NOTA 2 ya se colocó todo el fierro y así como se está trabajando en el resto de muros, materiales propuestos y exámenes y escaneo 



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN
