



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

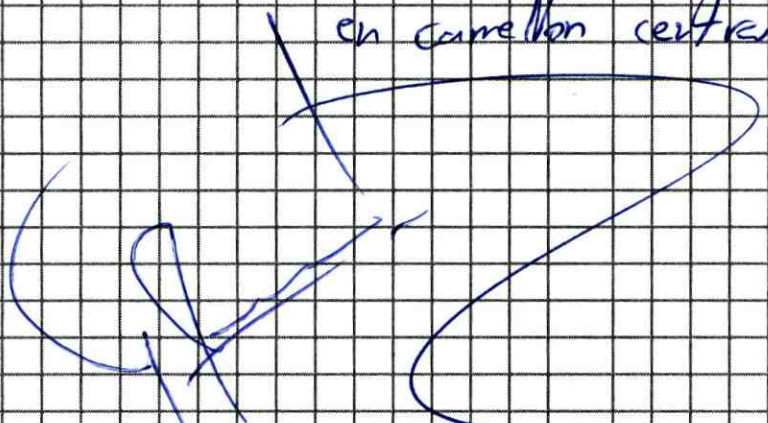
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-035-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#5	30/03/15	Se inicia con los trabajos de modificación de camellones centrales en cruce de Blvd. 10 de Mayo x Blvd. Adolfo Lopez Mateos, se realizan demoliciones de guardacostas, losa de concreto y excavaciones en camellon central 


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

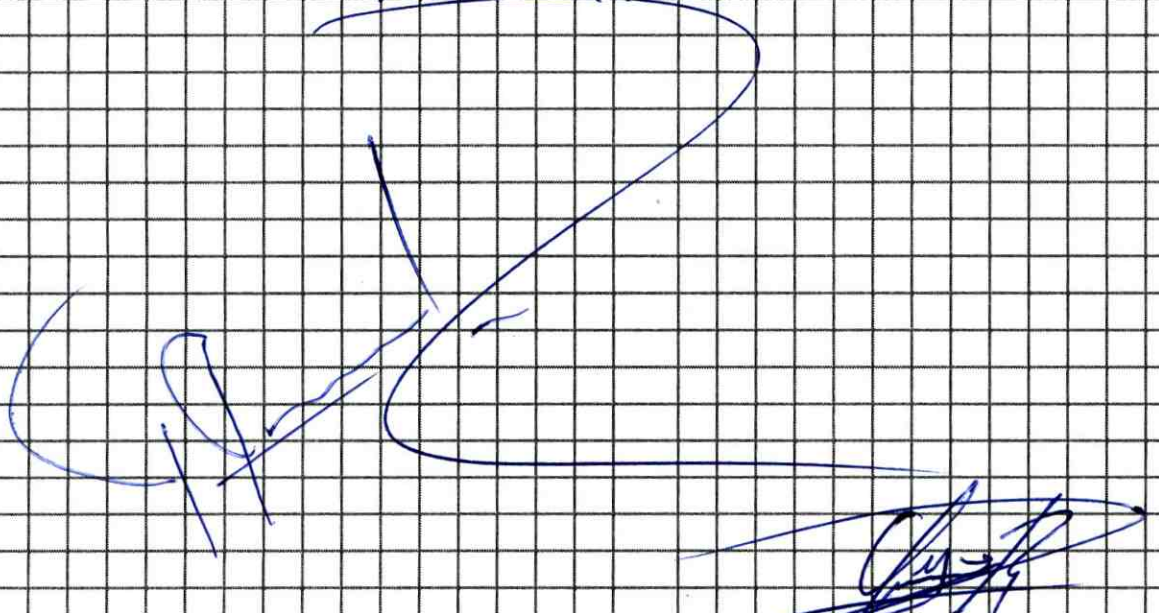
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 006

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-035-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#6	2/04/15	Se terminan los trabajos de excavaciones y retiros de material producto de excavaciones y demoliciones, se inicia con las coladas de concreto fluyente 


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 007

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-035-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#7	5/04/15	se termina con el colado de fluídos y se realizan colados de lasar de Pavimento de 300 Kg/cm ²

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

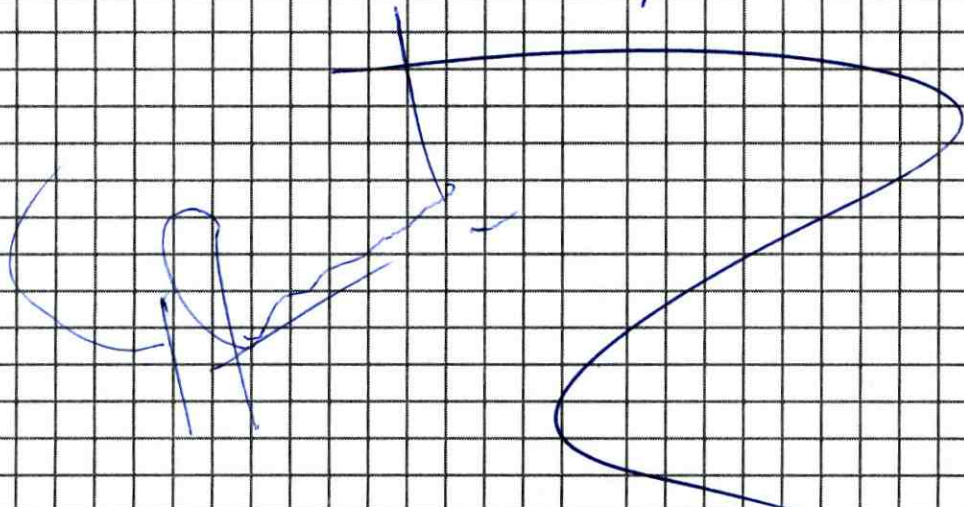
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓


HOJA DE BITACORA No. 008

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-035-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#8	8/04/15	se realizan cobos de guarniciones tipo "L", se aglutinan las juntas dando así por terminado los trabajos descritos en la Nota #3. Se cierra la presente Bitácora. 


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



20 al 29 de MARZO 2015



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-035-15

PROGRAMA:

MONTO: \$ 674,880.05

SUBPROGRAMA:

FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 20/03/15 REAL 20/03/15

FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 08/04/15 REAL

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO

DOMICILIO: CALLE SANTOS DEGOLLADO No. 2180 NTE. FRACC. LAS GAVIOTAS, LOS MOCHIS, SINALOA

TELÉFONOS:

TIPO DE TRABAJO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

REPRESENTANTE: ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1.- ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO

2.- REPRESENTANTE LEGAL

3.- _____

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:

DEL MUNICIPIO DE AHOME

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE

SUPERVISOR DE OBRA





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-035-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	23/03/2015	Nota 1 Se trabajó en la colocación de concreto fluido
		Nota 2 Se trabajó con retiro fuso de la obra de material producido de de demolición y excavación
		Nota 3 Se realizó cimbras para guarda- ción y volteo



