



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa Montos Mesuales de Inversión por Partidas (Punto 2.2.6. de las Bases)					
ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	Noviembre 01-30	01-31
		(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECÁMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			
		VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).			
		TRABAJOS PRELIMINARES			
30	1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1,206.25	1,206.25	
40	1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE BALASTRE PARA RELLENO PUESTO EN OBRA.	41,823.08	41,823.08	
50	1.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	9,343.58	9,343.58	
60	1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD	1,175.60	1,175.60	
		CIMENTACION			
80	2.01	TRABE EN CIMENTACIÓN DE 15 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON CONCRETO F'c=200 kg/cm2 tma de 38 mm. RFZO. HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES. EN L CON ACERO No 3 A	63,726.50	50,155.12	13,571.38

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ATENCIÓN:  
*[Signature]*  
OMAR ABUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 1

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

## Programa Montos Mesuales de Inversión por Partidas (Punto 2.2.6. de las Bases)

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	Noviembre	
				01-30	01-31
		CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA			
90	2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO A CUADROS	93,137.24	73,302.46	19,834.78
100	2.03	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN 3/8" FY=4200 KG/CM2 EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	5,753.75	5,753.75	
		<b>ESTRUCTURA</b>			
120	3.01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X20X40 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, EN DESPLANTE (2 HILADAS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	42,112.83	42,112.83	
130	3.02	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X12X29 CM. JUNTEADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA EN PROP. 1:3 CON 50 KG. DE CEMENTO GRIS POR M3 DE MORTERO, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA ACABADO COMÚN, BOQUILLA CORTADA, INCLUYE:	229,103.48	219,033.00	10,070.48

ATENTAMENTE:

OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL

Página # 2

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

## Programa Montos Mesuales de Inversión por Partidas (Punto 2.2.6. de las Bases)

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	Noviembre	
				01-30	01-31
		MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
140	3.03	CASTILLO DE CONCRETO 12X12 CM. DE SECCIÓN F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE, CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	48,833.23	37,488.14	11,345.09
150	3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X20-4, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	90,983.59	56,533.49	34,450.10
160	3.05	ANTEPECHO SOBRE PUERTA PRINCIPAL DE 12X20 CMS, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X20-4, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	7,210.12	4,480.07	2,730.05
		<b>LOSAS</b>			
180	4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A CADA 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS SEGUN PROYECTO INCLUYE BASTONES , INCLUYE : SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	58,006.60	34,616.84	23,389.76
190	4.02	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE AZOTEA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	84,848.71	45,411.98	39,436.73

ATENTAMENTE:

OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL

Página # 3

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa Montos Mesuales de Inversión por Partidas (Punto 2.2.6. de las Bases)					
ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	Noviembre 01-30	01-31
		TERMINADO SUPERIOR DE LA LOSA SERA PLANEADO, INCLUYE : SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.			
200	4.03	CIMBRA Y DESCIMBRA CON TRIPLAY EN LOSAS Y RAMPAS DE ESCALERA, MEDIDAS EN SUPERFICIE DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICIÓN	91,275.73	56,169.68	35,106.05
		<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
220	5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELECTRICOS MARCA MODUS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	25,793.60	13,110.56	12,683.04
		<b>COLOCACIÓN DE HERRERÍA.</b>			
240	6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.20X1.25 M., INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	35,463.12	14,137.32	21,325.80
250	6.02	COLOCACIÓN DE MARCOS METÁLICOS HASTA DE 100X210 CM. EN VANOS DE	11,808.72	4,707.53	7,101.19

ATENTAMENTE:  
  
 OMAR AHUMADA AGUILAR  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Pagina # 4

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
 DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

## Programa Montos Mesuales de Inversión por Partidas (Punto 2.2.6. de las Bases)

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	Noviembre	
				01-30	01-31
		PUERTAS, RECIBIDOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, PICADO, DESPERDICIOS, DETALLADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			
		<b>SUMINISTRO DE HERRERIA Y CANCELERIA</b>			
270	7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.20 x 1.25 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE NEGRO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR.	30,678.76	12,230.05	18,448.71
280	7.02	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE MARCO HASTA 100 X215 CM., CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, INCLUYE: BISAGRAS LATONADAS DE 3" SOLDADAS, MATERIAL, HECHURA, MANO DE OBRA Y APLICACIÓN DE PRIMARIO.	11,217.36	4,471.79	6,745.57
		<b>CARPINTERIA</b>			
300	8.01	COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 90X210 CMS.	4,855.48	1,935.63	2,919.85
		<b>SUMINISTRO DE PUERTAS Y CHAPAS</b>			
320	9.01	SUMINISTRO DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 90X210	29,718.08	29,718.08	

ATENTAMENTE:

OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL

Página # 5

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

## Programa Montos Mesuales de Inversión por Partidas (Punto 2.2.6. de las Bases)

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	Noviembre	
				01-30	01-31
		CMS, INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MARCA FANAL, PHILIPS O SIMILAR.			
		<b>VARIOS</b>			
340	10.01	APLANADO EN FACHADA ACABADO FLOTEADO CON MEZCLA, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	25,674.21		25,674.21
350	10.02	FILOS EN REMATE DE PRETILES, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	16,034.76		16,034.76
360	10.03	IMPÉRMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUÍDO CON AGUA EN PROP. 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	36,948.49		36,948.49

ATENTAMENTE:  
  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 6

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

### Programa Montos Mesuales de Inversión por Partidas (Punto 2.2.6. de las Bases)

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	Noviembre	
				01-30	01-31
370	10.04	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.	1,541.53	915.28	626.25



ATENTAMENTE:  
  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 7

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

## Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Noviembre 02-08	09-15
		(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECÁMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					
		VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).					
		TRABAJOS PRELIMINARES					
30	1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	07/Nov/2014	10c	16/Nov/2014		
40	1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE BALASTRE PARA RELLENO PUESTO EN OBRA.	07/Nov/2014	15c	21/Nov/2014		
50	1.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	12/Nov/2014	18c	29/Nov/2014		
60	1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD	07/Nov/2014	12c	18/Nov/2014		
		CIMENTACION					
80	2.01	TRABE EN CIMENTACIÓN DE 15 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON CONCRETO F' C=200 kg/cm2 tma de 38 mm. RFZO. HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No 3 A	14/Nov/2014	23c	06/Dic/2014		

ATENTAMENTE

OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL

Página # 1

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

## Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Noviembre 02-08	09-15
		CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA					
90	2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO A CUADROS	14/Nov/2014	23c	06/Dic/2014		
100	2.03	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN 3/8" FY=4200 KG/CM2 EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	07/Nov/2014	15c	21/Nov/2014		
<b>ESTRUCTURA</b>							
120	3.01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X20X40 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, EN DESPLANTE (2 HILADAS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	10/Nov/2014	15c	24/Nov/2014		
130	3.02	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X12X29 CM. JUNTEADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA EN PROP. 1:3 CON 50 KG. DE CEMENTO GRIS POR M3 DE MORTERO, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA ACABADO COMÚN, BOQUILLA CORTADA, INCLUYE:	12/Nov/2014	20c	01/Dic/2014		

ATENTAMENTE

CIMBRA AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL

Página # 2

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

## Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Noviembre 02-08	09-15
		MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
140	3.03	CASTILLO DE CONCRETO 12X12 CM. DE SECCIÓN F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE, CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	17/Nov/2014	20c	06/Dic/2014		
150	3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X20-4, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	20/Nov/2014	22c	11/Dic/2014.		
160	3.05	ANTEPECHO SOBRE PUERTA PRINCIPAL DE 12X20 CMS, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X20-4, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	20/Nov/2014	22c	11/Dic/2014		
		<b>LOSAS</b>					
180	4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A CADA 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS SEGUN PROYECTO INCLUYE BASTONES , INCLUYE : SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	19/Nov/2014	27c	15/Dic/2014		
190	4.02	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE AZOTEA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	20/Nov/2014	30c	19/Dic/2014		

ATENTAMENTE

OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL

Pagina # 3

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

## Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Noviembre 02-08	09-15
		TERMINADO SUPERIOR DE LA LOSA SERA PLANEADO, INCLUYE : SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.					
200	4.03	CIMBRA Y DESCIMBRA CON TRIPLAY EN LOSAS Y RAMPAS DE ESCALERA, MEDIDAS EN SUPERFICIE DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICIÓN	18/Nov/2014	28c	15/Dic/2014		
		<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
220	5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELECTRICOS MARCA MODUS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	19/Nov/2014	38c	26/Dic/2014		
		<b>COLOCACIÓN DE HERRERÍA.</b>					
240	6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.20X1.25 M., INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	26/Nov/2014	31c	26/Dic/2014		
250	6.02	COLOCACIÓN DE MARCOS METÁLICOS HASTA DE 100X210 CM. EN VANOS DE	26/Nov/2014	31c	26/Dic/2014		

ATENTAMENTE:  
  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 4

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FIS MDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)						
ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Noviembre 02-08 09-15

PUERTAS, RECIBIDOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, PICADO, DESPERDICIOS, DETALLADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

**SUMINISTRO DE HERRERIA Y CANCELERIA**

270 7.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.20 x 1.25 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE NEGRO. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR.

26/Nov/2014 31c 26/Dic/2014

280 7.02 FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE MARCO HASTA 100 X215 CM., CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, INCLUYE: BISAGRAS LATONADAS DE 3" SOLDADAS, MATERIAL, HECHURA, MANO DE OBRA Y APLICACIÓN DE PRIMARIO.

26/Nov/2014 31c 26/Dic/2014

**CARPINTERIA**

300 8.01 COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 90X210 CMS.

26/Nov/2014 31c 26/Dic/2014

320 9.01 SUMINISTRO DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 90X210

22/Nov/2014 8c 29/Nov/2014

ATENTAMENTE:  
  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 5

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

## Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Noviembre 02-08	09-15
		CMS, INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MARCA FANAL, PHILIPS O SIMILAR.					
		VARIOS					
340	10.01	APLANADO EN FACHADA ACABADO FLOTEADO CON MEZCLA, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	01/Dic/2014	15c	15/Dic/2014		
350	10.02	FILOS EN REMATE DE PRETILES, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	01/Dic/2014	15c	15/Dic/2014		
360	10.03	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUÍDO CON AGUA EN PROP. 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	08/Dic/2014	24c	31/Dic/2014		

ATENTAMENTE:  
  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 6

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)							
ID	Clv.	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Noviembre 02-08      09-15

370	10.04		SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.	07/Nov/2014	55c	31/Dic/2014	
-----	-------	--	--	-------------	-----	-------------	--

ATENTAMENTE:  
  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 7

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)							
ID	Noviembre 16-22	23-29	30-06	Diciembre 07-13	14-20	21-27	28-03


30

40

50

60

80

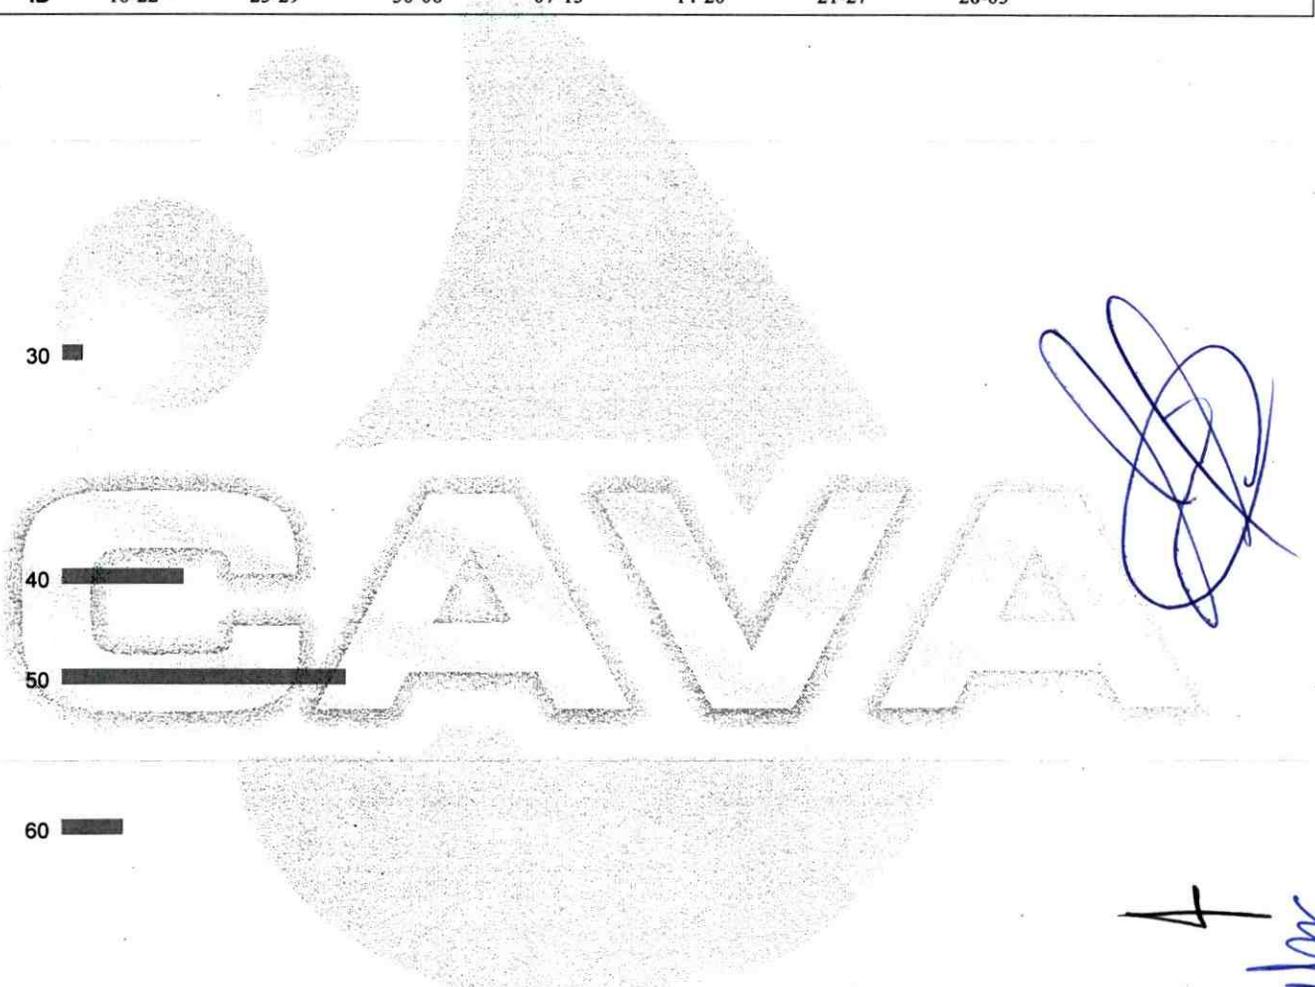

ATENTAMENTE:

OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 8

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014




Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)							
ID	Noviembre 16-22	23-29	30-06	Diciembre 07-13	14-20	21-27	28-03

90 

100 

120 

130 

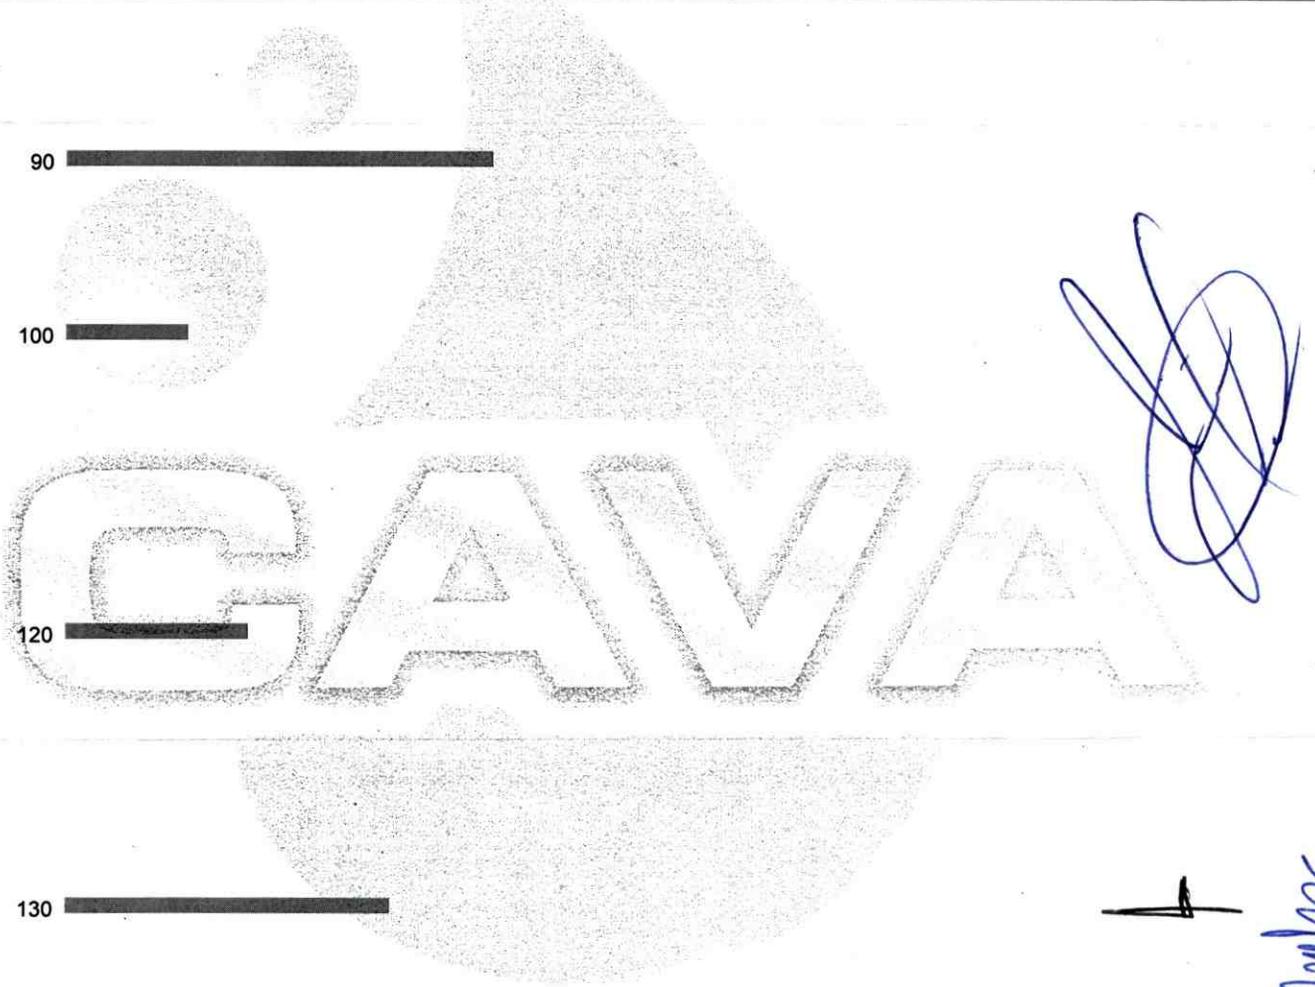

ATENTAMENTE  
  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 9



FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO





# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FIS MDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)							
ID	Noviembre 16-22	23-29	30-06	Diciembre 07-13	14-20	21-27	28-03

140



150



160



180



190



ATENTAMENTE:  
  
 OMAR AHUMADA AGUILAR  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Pagina # 10

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
 DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)							
ID	Noviembre 16-22	23-29	30-06	Diciembre 07-13	14-20	21-27	28-03

200

220

240

250

ATENTAMENTE:

OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 11

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)							
ID	Noviembre 16-22	23-29	30-06	Diciembre 07-13	14-20	21-27	28-03

270

280

300

320

ATENTAMENTE:

OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL

Página # 12

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)							
ID	Noviembre 16-22	23-29	30-06	Diciembre 07-13	14-20	21-27	28-03

340

350

360

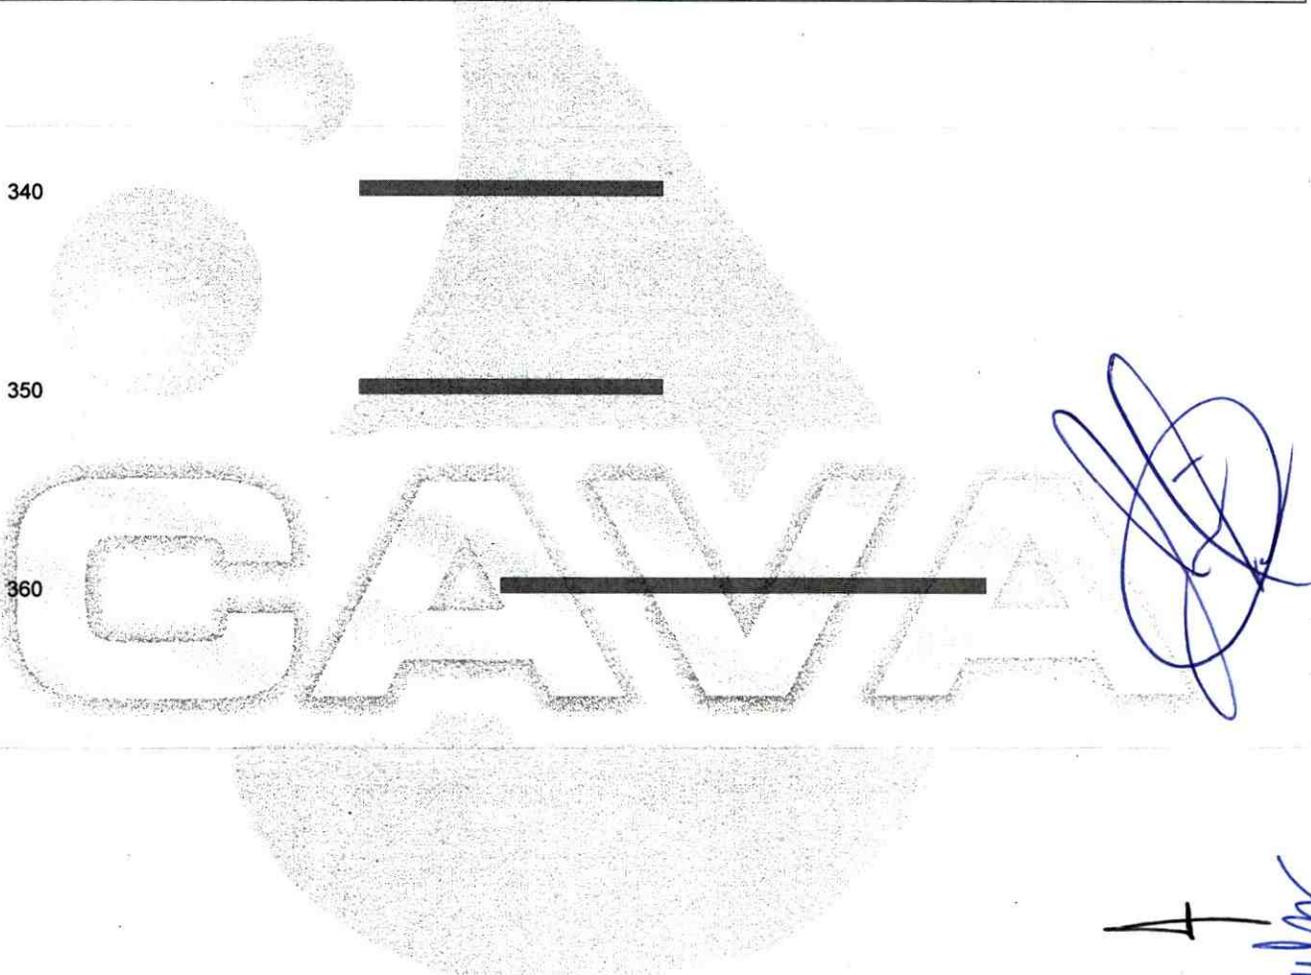

ATENTAMENTE:  
  
 OMAR AHUMADA AGUILAR  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Pagina # 13

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
 DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC. S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa General Calendarizado por Partidas (Punto 2.1.12. de las Bases)							
ID	Noviembre 16-22	23-29	30-06	Diciembre 07-13	14-20	21-27	28-03

370

CAVA

ATENTAMENTE:

OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL

Pagina # 14

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

## Programa Calendarizado de Utilización de Maquinaria (Punto 2.1.6. de las Bases)

Clave	Descripción	Inicia	Termina	Noviembre		
				02-08	09-15	16-22
AMAIN-006	Compresor portatil Ingerson Rand modelo P185	26/Nov/2014	26/Dic/2014			
AMAIN-010	Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp.	26/Nov/2014	26/Dic/2014			
EQUIPO001	VIBRADOR PARA CONCRETO DE GASOLINA	07/Nov/2014	31/Dic/2014		████████████████████	
EQUIPO002	REVOLVEDORA MIPSA 1 SACO DE 12 H.P. GASOLINA	07/Nov/2014	31/Dic/2014		████████████████████	
EQUIPO003	COMPACTADOR MARCA INGERSOLL RAND, MODELO: DD22, SERIE 143487 ( BANQUETERO)	12/Nov/2014	29/Nov/2014		████████████████	
MAMAL000	MALACATE 1 TON MOTOR KOHLER K-301 12 H.P. CON ACCESORIOS	19/Nov/2014	15/Dic/2014			████████



ATENTAMENTE  
  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO






# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

## Relación de Personal Técnico y Obrero, Programa Calendarizado (Punto 2.1.10. de las Bases)

Clave	Descripción	Inicia	Termina	Noviembre	
				Nov	Dic
MOCU001	OF. ALBAÑIL	07/Nov/2014	31/Dic/2014	██	
MOCU002	AYUDANTE GENERAL	07/Nov/2014	31/Dic/2014	██	
MOCU003	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	17/Nov/2014	15/Dic/2014	████████████████	
MOCU004	CARPINTERO OBRA BLANCA	26/Nov/2014	26/Dic/2014		████████████████
MOCU005	OFICIAL COLOCADOR	08/Dic/2014	31/Dic/2014		████████████████
MOCU006	OFICIAL ELECTRICISTA	19/Nov/2014	26/Dic/2014	████████████████	
MOCU007	FIERRERO	07/Nov/2014	15/Dic/2014	████████████████	
MOCU008	OFICIAL HERRERO	26/Nov/2014	26/Dic/2014		████████████████
MOCU010	PEON	07/Nov/2014	31/Dic/2014	██	
MOCU011	PEON (FIERRERO)	19/Nov/2014	15/Dic/2014	████████████████	



  
ATENTAMENTE:

OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 1

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa de Montos Mensuales Adquisición de Materiales (Punto 2.2.7. de las Bases)						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Noviembre 01-30
INS001	ACERO DE REFUERZO # 3	TN	2.31363	14,710.00	34,033.50	20,310.25
INS002	VARILLA CORRUGADA No.3 (3/8")	PZA	45.38625	98.26	4,459.65	4,459.65
INS003	ALAMBRE RECOCIDO	KG	238.46803	19.80	4,721.67	3,110.56
INS004	ARMEX 12X20-4 DE 6ML	PZA	69.97200	102.50	7,172.13	5,644.73
INS005	ARMEX 12X12/4	PZ	124.18269	101.00	12,542.45	8,440.53
INS006	CHILILLOS 1/4" X 3/4"	PZ	168.00000	0.55	92.40	36.84
INS007	CLAVO STD. DE 2" A 4"	KG	155.76159	22.33	3,478.16	2,226.52
INS008	MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 6 / 6	M2	348.97800	37.40	13,051.78	10,272.23
INS009	PERFIL TUBULAR No. 129	TRAMO	28.00000	120.71	3,379.88	1,347.38
INS010	PERFIL No. 154 JÚNQUILLO	TRAMO	19.32000	24.55	474.31	189.09
INS011	REDONDO DE FIERRO DE 1/2" DE ESPESOR (1.26 KG/CM2)	ml	350.00000	14.14	4,949.00	1,972.91
INS012	SOLERA DE FIERRO DE 1 1/2" x 1/8"	ml	170.80000	16.00	2,732.80	1,089.43
INS013	CALHIDRA SAN LORENZO	TON	6.27013	1,793.20	11,243.60	10,755.37
INS014	CEMENTO GRIS	TON	40.35526	2,379.40	96,021.31	60,877.41
INS015	ACARREO DE MATERIAL PETREO AL 1ER. KILOMETRO	KM/M3	93.52000	9.80	916.50	916.50
INS016	ACARREO DE MATERIAL PETREO A KILOMETROS SUBSECUENTES	KM/M3	1,776.88000	4.90	8,706.71	8,706.71
INS017	ARENA FINA	M3	28.80962	206.70	5,954.95	4,153.37
INS018	ARENON	M3	38.66775	301.10	11,642.86	7,705.46
INS019	BALASTRE	M3	112.22400	227.10	25,486.07	25,486.07

ATENTAMENTE:

  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 1

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO




# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC. S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa de Montos Mensuales Adquisición de Materiales (Punto 2.2.7. de las Bases)						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Noviembre 01-30
INS020	GRAVA DE 3/4" 19 MM	M3	70.75102	311.10	22,010.64	14,566.72
INS021	APAGADOR SENCILLO	PZ	56.00000	21.00	1,176.00	597.75
INS022	CABLE THW # 8	ML	84.00000	14.00	1,176.00	597.75
INS023	CABLE THW # 10	ML	42.00000	8.04	337.68	171.64
INS024	CABLE # 12	ML	446.60000	5.29	2,362.51	1,200.83
INS025	CABLE # 14	ML	134.40000	3.82	513.41	260.96
INS026	CAJA GALVANIZADA DE 3"	PZA	56.00000	2.63	147.28	74.86
INS027	CHALUPA GALVANIZADA DE 2"X4"	PZA	84.00000	3.45	289.80	147.30
INS028	CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA (MODUS)	PZ	56.00000	38.00	2,128.00	1,081.64
INS029	MANGUERA POLIDUCTO DE 1"	ML	42.00000	8.10	340.20	172.92
INS030	POLIDUCTO NARANJA DE 13 MM	ML	477.40000	5.88	2,807.11	1,426.82
INS031	ROSETA DE PORCELANA 3"	PZ	56.00000	7.63	427.28	217.18
INS032	TAPA 2 VENTANAS	PZ	25.53992	20.88	533.27	271.05
INS035	BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 20 CMS	PZA	801.92000	6.26	5,020.02	5,020.02
INS036	BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X 20 X 40 CMS	PZA	1,603.84000	9.05	14,514.75	14,514.75
INS037	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CMS	PZA	26,480.16000	3.48	92,150.96	88,100.37
INS038	CEMENTO PLASTICO (PROTECTO CEMEN) HTTP-400-A PARA SELLADO DE GRIETAS	LTS	16.91200	64.66	1,093.53	
INS039	PROTECTO FLEX PLUS (	M2	465.08000	2.28	1,060.38	

ATENTAMENTE:

  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO

Página # 2



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa de Montos Mensuales Adquisición de Materiales (Punto 2.2.7. de las Bases)						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Noviembre 01-30
MEMBRANA DE REFUERZO )						
INS040	SELLADOR ACRILICO CONCENTRADO	LT	26.76324	25.63	685.94	
INS041	THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES	LT	349.27085	57.47	20,072.60	
INS042	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDÁLICO BASE AGUA. COLOR GRIS LINEA ACQUA 100 PRIMER.	LT	14.00000	110.00	1,540.00	613.92
INS043	PINTURA ESMALTE	LT	14.00000	92.11	1,289.54	514.07
INS044	BISAGRA DE LIBRO DE 3"	PZA	56.00000	5.95	333.20	132.83
INS045	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	4.47872	45.00	201.54	201.54
INS046	CHAPA FANAL No. 175	PZ	28.00000	112.93	3,162.04	3,162.04
INS047	JALADERA LOCK #482	PZ	28.00000	60.00	1,680.00	1,680.00
INS048	MADERA DE 3RA. PARA CIMBRA	PT	1,484.67482	10.00	14,846.75	10,106.87
INS049	PUERTA MULTYPANEL LISA DE 90X210 CMS.	PZA	28.00000	720.69	20,179.32	20,179.32
INS050	PUNTAL ROLLIZO DE 2.4 A 3.5 MTS.	PZ	140.64960	35.00	4,922.74	3,029.38
INS051	REMACHE POP AS-64	PZ	56.00000	0.45	25.20	10.05
INS052	CIMBRAPLAY 5/8" 4X8"	PZ	69.60540	399.00	27,772.55	17,820.17
INS053	TUINO DE MADERA DE 1" ( 8'=2.44)	PZ	85.77533	6.96	597.00	367.39
INS054	VENTANA DE ALUMINIO COLOR NATURAL LÍNEA 1 1/2" PREFABRICADA DE 1.20X1.25 M. CON VIDRIO	PZ	28.00000	1,066.39	29,858.92	11,903.22

  
 ATENTAMENTE:  
 OMAR AHUMADA AGUILAR  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Pagina # 3

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
 DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC. S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa de Montos Mensuales Adquisición de Materiales (Punto 2.2.7. de las Bases)						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Noviembre 01-30
	TRANSPARENTE DE 3 MM					
INS055	MADERA DE PINO COMERCIAL EN BARROTOS	PT	64.96140	10.00	649.61	511.27
INS056	MADERA DE PINO COMERCIAL EN DUELA	PT	108.26900	10.00	1,082.69	852.12
INS057	ACEITE LUBRICANTE USADO DE MOTOR	LT	426.17883	3.00	1,278.54	790.70
INS059	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	39.36144	7.74	304.66	226.59
INS060	ANUNCIO DE OBRA PREFABRICADO	PZ	1.00000	1,100.00	1,100.00	653.12
INS061	SEGUETA DIENTE FINO	PZ	2.80000	11.29	31.61	12.60
INS062	CEPILLO DE MADERA DE IXTLE CON EXTENSION FIJA DE 1.20 M.	PZ	4.22800	47.41	200.45	
INS063	DIESEL	LT	104.65000	10.97	1,148.01	706.47
INS064	ESCOBA DE 6 HILOS PARA LIMPIEZA EN GENERAL	PZ	4.22800	43.10	182.23	
INS067	SOLDADURA 6011 DE 1/8"	KG	9.80000	42.53	416.79	166.15
<b>TOTAL PARCIAL:</b>					<b>532,710.48</b>	<b>379,763.39</b>
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>						<b>379,763.39</b>

  
 ATENTAMENTE:  
 OMAR AHUMADA AGUILAR  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Pagina # 4

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
 DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa de Montos Mensuales Adquisición de Materiales (Punto 2.2.7. de las Bases)	
Clave	Diciembre 01-31
INS001	3,723.25
INS002	
INS003	1,611.11
INS004	1,527.40
INS005	4,101.92
INS006	55.56
INS007	1,251.64
INS008	2,779.55
INS009	2,032.50
INS010	285.22
INS011	2,976.09
INS012	1,643.37
INS013	488.23
INS014	35,143.90
INS015	
INS016	
INS017	1,801.58
INS018	3,937.40
INS019	

ATENTAMENTE:  
  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 5

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC. S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa de Montos Mensuales Adquisición de Materiales (Punto 2.2.7. de las Bases)	
Clave	Diciembre 01-31
INS020	7,443.92
INS021	578.25
INS022	578.25
INS023	166.04
INS024	1,161.68
INS025	252.45
INS026	72.42
INS027	142.50
INS028	1,046.36
INS029	167.28
INS030	1,380.29
INS031	210.10
INS032	262.22
INS035	
INS036	
INS037	4,050.59
INS038	1,093.53
INS039	1,060.38

ATENTAMENTE:  
  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 6

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa de Montos Mensuales Adquisición de Materiales (Punto 2.2.7. de las Bases)	
Clave	Diciembre 01-31

INS040	685.94
INS041	20,072.60
INS042	926.08
INS043	775.47
INS044	200.37
INS045	
INS046	
INS047	
INS048	4,739.88
INS049	
INS050	1,893.36
INS051	15.15
INS052	9,952.38
INS053	229.61
INS054	17,955.70

  
ATENCIÓN:  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 7

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

## Programa de Montos Mensuales Adquisición de Materiales (Punto 2.2.7. de las Bases)

Clave	Diciembre 01-31
INS055	138.34
INS056	230.57
INS057	487.84
INS059	78.07
INS060	446.88
INS061	19.01
INS062	200.45
INS063	441.54
INS064	182.23
INS067	250.64
	152,947.09
	532,710.48

  
ATENTAMENTE:  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 8

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa Montos Mensuales Utilización Personal Técnico, Advo., Obrero (Punto 2.2.8 de las Bases)						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Noviembre 02-08
MOCU001	OF. ALBAÑIL	jor	194.99547	540.08	105,313.15	148,21
MOCU002	AYUDANTE GENERAL	jor	157.05789	371.14	58,290.47	43,98
MOCU003	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	jor	71.99005	548.90	39,515.34	
MOCU004	CARPINTERO OBRA BLANCA	JOR	3.87016	548.90	2,124.33	
MOCU005	OFICIAL COLOCADOR	JOR	7.68650	540.08	4,151.32	
MOCU006	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	9.24000	548.90	5,071.84	
MOCU007	FIERRERO	jor	13.36184	540.08	7,216.46	11,58
MOCU008	OFICIAL HERRERO	JOR	14.92400	540.75	8,070.15	
MOCU010	PEON	jor	267.28496	365.93	97,807.59	461,34
MOCU011	PEON (FIERRERO)	jor	13.30628	363.55	4,837.50	
<b>TOTAL PARCIAL:</b>					<b>332,398.15</b>	<b>665.11</b>
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>						<b>665.11</b>

ATENTAMENTE:  
  
 OMAR AHUMADA AGUILAR  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Pagina # 1

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
 DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC. S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Programa Montos Mensuales Utilización Personal Técnico, Advo., Obrero (Punto 2.2.8 de las Bases)								
Clave	Noviembre				Diciembre			
	09-15	16-22	23-29	30-06	07-13	14-20	21-27	28-03
MOCU001	28,948.08	25,987.63	20,990.64	19,246.52	7,282.32	2,019.01	687.46	3.28
MOCU002	6,609.94	16,882.63	12,324.69	10,628.01	7,017.96	2,593.49	1,892.09	297.68
MOCU003		17,254.50	7,738.15	7,738.15	6,040.38	744.17		
MOCU004			846.86	330.13	330.13	330.13	287.07	
MOCU005					2,057.61	830.26	830.26	433.18
MOCU006		1,933.46	644.49	644.49	644.49	644.49	560.42	
MOCU007	9.86	2,964.29	1,332.97	1,332.97	1,332.97	231.82		
MOCU008			3,217.15	1,254.15	1,254.15	1,254.15	1,090.56	
MOCU010	25,150.75	26,541.97	19,914.02	15,848.79	7,119.86	2,294.21	474.08	2.57
MOCU011		1,989.61	897.28	897.28	897.28	156.05		
	60,718.63	93,554.09	67,906.25	57,920.49	33,977.15	11,097.78	5,821.94	736.71
	61,383.74	154,937.83	222,844.08	280,764.57	314,741.72	325,839.50	331,661.44	332,398.15

ATENTAMENTE:  
  
 OMAR AHUMADA AGUILAR  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Pagina # 2

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
 DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO



# CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC. S.A. DE C.V.

(062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECAMARAS  
ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA  
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICTACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14  
FECHA DE CONCURSO: 05 NOVIEMBRE 2014

Personal en Indirectos CONSTRUCCIONES ANAHUAC UBRA 15 10 M2 (GRAL)				
Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2014	
			Nov	Dic
Director General	229.98	14,851.89	6,600.84	8,251.04
Gerente de Producción	164.27	9,000.00	3,999.99	5,000.00
Jefe del departamento técnico	223.41	14,427.55	6,412.25	8,015.30
Jefe de obras	131.42	7,200.00	3,200.00	4,000.00
Secretaria del departamento administrativo	213.55	13,791.05	6,129.35	7,661.68
Jefe del departamento de personal	114.99	6,300.00	2,800.01	3,500.00
<b>TOTAL PARCIAL:</b>		<b>65,570.49</b>	<b>29,142.44</b>	<b>36,428.02</b>
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>			<b>29,142.44</b>	<b>65,570.46</b>



ATENTAMENTE:  
  
OMAR AHUMADA AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pagina # 1

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE 2014  
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014  
DURACIÓN: 55 DIAS CALENDARIO
