



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

Sección de: D.G.O.P.

Oficio No.: S/N

Expediente:

Asunto: El que se indica

Lic. Juan Tachna Félix
Tesorero Municipal,
Municipio de Ahome.
Presente.-

Anexo al presente envío para su revisión y pago, estimación no. 3 (Tres), factura, carta de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva, números generadores, oficio de autorización de inversión, carta de no adeudo fiscal, constancia de no adeudo al buro municipal, reporte fotográfico, hojas de bitácora, de la siguiente obra:

Importe Total Estimado: \$ 5,310,768.54

Importe Estimado a Pagar: \$ 3,442,843.05

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
CONT-DGOP-DC-073-16	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, servicios de agua potable, drenaje pluvial y alcantarillado en prolongación Boulevard Rio Fuerte, tramo Fracc. Santa Teresa a Blvd. Pioneros del Valle, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Coci Homes, S.A. de C.V.


Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración quedo de Ud. muy.

Atentamente
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
Los Mochis, Sin., 15 de Diciembre de 2016

C. Ing. Lino Eddgardo Rios Montoya
Director General de Obras Públicas



C.c.p' C. Lic. Rolando Luque Rojas.-Director de Contraloría Municipal.
C.c.p' C. Lic. Anselmo Acosta Bojórquez.-Director de Egresos.
C.c.p' C. Daniel Kim Ortega.-Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.
C.c.p' Archivo



Municipio de Ahome

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero,
Director General de Obras Públicas.
Presente:


En atención al programa de obras del presente año, le agradeceré llevar a cabo los trámites necesarios para la contratación de los trabajos de:

Núm.	Obras	Inversión (Importe Neto)	Origen del Recurso
1.-	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, servicio de agua potable, drenaje pluvial y alcantarillado en prolongación Boulevard Río Fuerte, tramo Fracc. Santa Teresa a Blvd. Pioneros del Valle, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa	\$21'373.967.75	Gasto Directo


Sin otro particular por el momento, agradezco la atención prestada a este escrito y esperando contar con su valiosa colaboración, me despido de usted.

Atentamente
"AHOME ES LA FUERZA DE SU GENTE"
Los Mochis, Sinaloa, 28 Junio de 2016.

C. Lic. Arturo Duarte Gascón
Presidente Municipal



C.C.P. C. Lic. Martín López Monreal.-Secretario del H. Ayuntamiento.-Pte.-
C.C.P. C. Lic. Juan Tachna Félix.-Tesorero Municipal.-Pte.-
C.C.P. C. Lic. Edwin Arturo Ransírez Moreno.-Encargado de la Dirección de Contraloría Mpal.-Pte.-
C.C.P. Archivo.-
Director.



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

CHO03121869A

Folio Fiscal

89F8C236-02FD-4501-B8E4-6E8AC4F5F33C

Total del CFDI

\$3,451,999.55

Nombre o Razón Social del Emisor

COCI HOMES, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-12-17T11:06:32

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MAH1701013C0

Fecha Certificación SAT

2016-12-17T12:06:34

Estado CFDI

Vigente


Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE AHOME

PAC que Certificó

SIF0403229F9

Imprimir



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



COCI HOMES, S.A. DE C.V.
SERAPIO RENDON #315
Los Mochis, Sinaloa.
Tel: 668 816 76 11

R.F.C. CHO-031218-69A

FACTURA	
SERIE:	FA
FOLIO:	000071
FECHA:	17/Dic/2016

CLIENTE:		00005
NOMBRE:	MUNICIPIO DE AHOME	
CALLE:	DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N	No. INTERIOR:
COLONIA:	BIENESTAR	C.P.:
LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:
RFC:	MAH1701013C0	ESTADO:
	Sinaloa	PAIS:
		México

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
17/12/2016 11:06:32

Expedida en:

LOS MOCHIS, SINALOA

Método de Pago: 02 Régimen Fiscal: Personas Morales del Régimen General

Número de Cuenta: No Identificado

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	--------	----------	--------	---------

33	PAGO DE ESTIMACIÓN No.3 TRES RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO NO. CONT-DGOP-DC-073-16 AMORTIZACION DE ANTICIPO 1,858,768.99 0.2% SEGUN CONVENIO CMIC. 0.2% \$9,156.50 SUMA DEDUCCIONES \$1,867,925.49 IMPORTE A RECIBIR \$3,442,843.05	Pieza	1.00	2,975,861.6	2,975,861.58
----	--	-------	------	-------------	--------------



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

IMPORTE CON LETRA: Son: (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 55/100

SUBTOTAL 2,975,861.58

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QA3cz1PP2ldQW9KPS64V2wgPF4olmue+JyCHRNeg2J4xhYBsomGypLi2bV7Lt10bieaowwbTxs9l1U
RKUambn7FwOIJWdS6gUHyO3a3dNxXy5AB1kpUKNceGvTHnH13vW7PVefDqZfOT5IEQ2S3eP1AfrnVLW
Uq3lNZkBBw9SA=

IVA Iva 16% Gastos 476,137.87

TOTAL 3,451,999.55

POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE INMOBILIARIA COCI, S.A. DE C.V., EN

Los Mochis, Sin

EL 17 de Diciembre de 2016 LA CANTIDAD DE \$ 3,451,999.55

(Son: (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 55/100 M.N.)

ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y SU PAGO EXTEMPORANEO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS

A RAZON DE 12.00 MENSUAL



Folio Fiscal: 89F8C236-02FD-4501-B8E4-6E8AC4F5F33C

Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-17 11:06:34

No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000004011004

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA UN CFDI.

TIMBRADO POR: SIFEI

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

11.0189F8C236-02FD-4501-B8E4-6E8AC4F5F33C 2016
-12-17 11:06:34 Fj8j/qJ8vbsgruUPmEWIohwggM0117Q
ultYqFN5pYdIB5Stv2AfrPPJfrnm5KjhpS6hsxS3CHWKFPF
JCovvEyCt/SxZNBV1K61EzLzaVrxKcRk5y3hh6YEC/v17Gn
br0/PudvFtbsHT2c5hC8Oto2Jp1vd+iNN1vu0Xots7chC1g
XFluAhyXmoFq1SuQnVUowI4ThfvlnuHHVEYaj0/EG4Bzy+
12A9gOXiwXcyYKySgoNofeLzvgIyHonDgOE+38bZ2Cw1Q2S
Fz761hpYSVER5ON30xN3.2E7IBE2biWJap+9FCrEASw072
spETE/3cewHMLB1fc21VDezn9HWA==1000010000003011

NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000404266760

NOMBRE MUNICIPIO DE AHOME R.F.C. MAH-170101-3C0
DOMICILIO DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, COL. BIENESTAR, C.P. 81280
CIUDAD LOS MOCHIS, SIN.

FECHA DICIEMBRE DEL 2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1.0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 3 TRES RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		2,975,861.68

CONTRATO No. CONT-DGOP-DC-073-16

AMORTIZACION DE ANTICIPO	1,858,768.99
0.2%SEGUN CONVENIO CMIC. 0.2%	\$9,156.50
SUMA DEDUCCIONES	\$1,867,925.49

IMPORTE A RECIBIR \$3,442,843.05


IMPORTE CON LETRA

(TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.)

SUB-TOTAL 2,975,861.68

I.V.A. 476,137.87

TOTAL 3,451,999.55



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCION DE CONSTRUCCION.	
--	--

ESTIMACION No.: 3 (TRES)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES


DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL: COCI HOMES, S.A. DE C.V.
	DOMICILIO: RENDÓN No. 315
	CIUDAD: LOS MOCHIS ESTADO: SINALOA TELÉFONO: 816 7611

DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16	FECHA DE CONTRATO: 08/08/2016	IMPORTE DEL CONTRATO \$21,222,212.04 AÑO 2016
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		

BUENO POR: \$3,442,843.05




RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE: SON: (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.) EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 DEL 2016. DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN:			
	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$2,975,861.68	\$4,578,248.74	
I.V.A. 16%:	\$476,137.87	\$732,519.80	
SUMA:	\$3,451,999.55	\$5,310,768.54	
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$1,858,768.99	
RETENCIÓN 0.20% CONV. C.M.L.C. DE:		\$9,156.50	
RETENCION 3.0% INSP. CONTROL Y VIG.:		\$0.00	
TOTAL DE DEDUCCIONES:		\$1,867,925.49	
IMPORTE A PAGAR:		\$3,442,843.05	
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A		31 DE OCTUBRE DE 2016	

 RECIBÍ ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V.	 AUTORIZA ING. LINO EDDGARDO RÍOS MONTOLYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> IMPORTE A FACTURAR </td> <td style="width: 50%; text-align: right; padding: 2px;"> \$3,451,999.55 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> IMPORTE A PAGAR </td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"> \$3,442,843.05 </td> </tr> </table>		IMPORTE A FACTURAR	\$3,451,999.55	IMPORTE A PAGAR	\$3,442,843.05
IMPORTE A FACTURAR	\$3,451,999.55				
IMPORTE A PAGAR	\$3,442,843.05				

	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		ESTADO DE CUENTA
---	---	---	-------------------------

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	ORIGEN DEL RECURSO: GD	FECHA ACTUAL: 30/11/2016
-------	---	---------------------------	-----------------------------

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	\$ 21,222,212.04	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	\$ 7,427,774.21		CONT. No.:	CONT-DGOP-DC-073-16		
						PERIODO DEL CONTRATO :		DIAS CALIFICADOS:
						09/08/2016 AL 28/12/2016		140
No DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL	LIQUIDO A PAGAR
			AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN	C.M.I.C.	OTRAS (%)	DEDUCCIONES	
1 (UNO)	DEL: 14/09/2016			3%	0.20%			
	AL: 30/09/2016	\$1,399,366.14	\$489,778.15	\$0.00	\$2,412.70	\$0.00	\$492,190.85	\$907,175.29
2 (DOS)	DEL: 01/10/2016			\$0.00	\$5,685.18	\$0.00	\$1,159,776.18	\$2,137,626.68
	AL: 31/10/2016	\$3,297,402.86	\$1,154,091.00	\$0.00				
3 (TRES)	DEL: 01/11/2016			\$0.00	\$9,156.50	\$0.00	\$1,867,925.49	\$3,442,843.05
	AL: 30/11/2016	\$5,310,768.54	\$1,858,768.99					



CONFORME	REVISAR	Vo.Bo.	APROBADO
			
ING. ARISTÓTELES SAQUELES RODRÍGUEZ	ING. JESÚS RICARGO GAMEZ LEÓN	ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA	ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA
COCI HOMES, S.A. DE C.V.	SUPERVISOR	RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


 DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)
---	---

PERIODO DEL	01 DE NOVIEMBRE	AL	30 DE NOVIEMBRE	DE	2016	FECHA:	30/11/2016	
OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16				
				CONTRATISTA: COCI HOMES, S.A. DE C.V.				
No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES				
1.1	RED DE DRENAJE SANITARIO TERRACERIAS PAVIMENTOS	\$1,354,236.54	\$0.00	35% ANTICIPO				
1.4		\$2,694,702.25	\$1,555,415.75	ESTIMACIONES ANT.: \$1,643,869.15				
1.5		\$0.00	\$3,022,832.99	ESTA ESTIMACIÓN: \$1,858,768.99				
				TOTAL RETENIDO A LA FECHA: \$3,502,638.14				
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			2% SEGUN C.M.I.C.				
				ESTIMACIONES ANT.: \$8,097.88				
				ESTA ESTIMACIÓN: \$9,156.50				
	\$1,602,387.06	SUBTOTAL DE ESTIMACION	\$4,048,938.79	\$4,578,248.74	TOTAL RETENIDO A LA FECHA:			\$17,254.38
	\$258,381.93							
	\$1,858,768.99							
	TOTAL DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	I.V.A.:16 %	\$647,830.21	\$732,519.80	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA:			\$3,519,892.52
		TOTAL:	\$4,696,769.00	\$5,310,768.54				
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN: SON (CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 64/100 MN)								



ESTADO CONTABLE		ANTICIPO	
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$21,222,212.04	IMPORTE DE ANTICIPO	
ESTIMADO A LA FECHA:	\$10,007,537.54	ANTICIPO OTORGADO:	\$7,427,774.21
SALDO DE CONTRATO A ESTIMAR:	\$11,214,674.50	AMORTIZADO A LA FECHA:	\$3,502,638.14
		SALDO POR AMORTIZAR:	\$3,925,136.07

CONFÓRME  ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V.	REVISAR  ING. JESUS RICARGO GAMEZ LEÓN SUPERVISOR	Vo.Bo.  ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	ARTIFERA  ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
---	---	--	---

DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN

	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		ESTIMACIÓN No.: 3 (TRES) HOJA: 1 DE: 4
---	---	---	--




PERIODO:	DEL: 01 DE NOVIEMBRE	AL: 30 DE NOVIEMBRE	DEL AÑO: 2016	FECHA: 30/11/2016
----------	----------------------	---------------------	---------------	-------------------

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16 ✓		
						CONTRATISTA	COCI HOMES, S.A. DE C.V. ✓		
No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.4	TERRACERIAS								
1.4.2	NIVELACION DE TERRACERIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL EN CALLES, INCLUYE: MATERIALES, CAL, MADERA, EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA Y CONSERVACION DE NIVELES EN TODAS LAS ETAPAS DE CONSTRUCCION. NOTA: EL TRAZO LO DARA LA PARTE CONTRATANTE.	M2	1 DE 4	✓22,275.89	11,137.95	✓ 6,682.77	✓4,455.18	✓ \$13.87	✓ \$61,793.35
1.4.4	CORTE DE CAJA DE TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M2	1 DE 4	✓16,706.92	16,706.92	✓ 13,365.53	✓3,341.39	✓ \$12.25	✓ \$40,932.03
1.4.5	CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION A 1 KM MEDIDO EN BANCO.	M3	1 DE 4	✓18,934.50	18,934.50	✓ 15,593.11	✓3,341.39	✓ \$49.74	✓ \$166,200.74
1.4.6	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL (SUBRASANTE) EN 30 CM. ESP. INCLUYE: ESCARIFICACION, HOMOGENEIZACION DE MATERIAL, NIVELACION DE TERRENO.	M2	1 DE 4	✓22,275.89	22,275.89	✓ 8,910.36	✓13,365.53	✓ \$27.17	✓ \$363,141.45
1.4.7	FORMACION DE SUBASE DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL BALASTRE CRIBADO, COMPACTADO AL 90% DEL P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COMPACTADO, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1 DE 4	✓4,455.17	2,227.59	✓ 1,782.07	✓445.52	✓ \$374.53	✓ \$166,860.61
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.		APROBADO			
 ING. ARISTÓTELES SAQUELLARES RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V.		 ING. JESUS RICARGO GAMEZ LEÓN SUPERVISOR		 ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		 ING. LINO EDDGAR TORRES MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

 AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			ESTIMACIÓN No.: 3 (TRES)
				HOJA: 2
				DE: 4

PERIODO :	FECHA
DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO: 2016	30/11/2016

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16		
							CONTRATISTA	COCI HOMES, S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1.4	TERRACERIAS									
1.4.8	FORMACION DE BASE DE 20 CM. DE ESPESOR CON BALASTRE CRIBADO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD.INCLUYE: MEZCLADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTACION.	M2	2 DE 4	✓ 4,455.17	2,227.59	✓ 1,113.80	✓ 1,113.79	✓ \$395.70	✓ \$440,726.70	
1.4.9	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA FM-1 A 1.5 LT/M2 INCLUYE: ARENEO.	M2	2 DE 4	✓ 22,275.89	11,137.95	✓ 0.00	✓ 11,137.95	✓ \$28.35	✓ \$315,760.88	
								SUBTOTAL TERRACERIAS	\$1,555,415.75	
 CONFORME ING. ARISTOTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V.  REVISÁ ING. JESÚS RICARGO GAMEZ LEÓN SUPERVISOR  Vo.Bo. ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  APRUEBA ING. LINO EDDGARDO ROS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS										



MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		ESTIMACIÓN No.: 3 (TRES) HOJA: 3 DE: 4
---	---	--

PERIODO :	DEL: 01 DE NOVIEMBRE	AL : 30 DE NOVIEMBRE	DEL AÑO: 2016	FECHA: 30/11/2016
-----------	----------------------	----------------------	---------------	-------------------

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16		
						CONTRATISTA	COCI HOMES, S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.5	PAVIMENTOS								
1.5.1	TRAZO DE LA RED CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	3 DE 4	18,430.18	6,450.56	0.00	6,450.56	\$12.80	\$82,567.17
1.5.2	NIVELACION DE TERRACERIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL EN CALLES, INCLUYE: MATERIALES, CAL, MADERA, EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA.	M2	3 DE 4	21,344.85	7,470.70	0.00	7,470.70	\$13.87	\$103,618.57
1.5.3	GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L Ó PECHO DE PALOMA TRAMO CUEVO DE 70 CM. DE ANCHO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EN VACIADO, TENDIDO, VIBRADO, ACARREOS AGUA PARA ALBAÑILERIA, CURADO Y HERRAMIENTAS.	ML	3 DE 4	3,323.79	1,163.33	0.00	1,163.33	\$325.89	\$379,117.61
1.5.5	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 300 KG/CM2 T.M.A. 38 M.M., e=15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN VACIADO, TENDIDO, VIBRADO, ACARREOS, AGUA PARA ALBAÑILERIA, CURADO Y HERRAMIENTAS.	M2	3 DE 4	18,430.18	6,450.56	0.00	6,450.56	\$366.73	\$2,365,613.87
CONFORME									
REVISÁ									
Vº Bº.									
APROBADA									
ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V.		ING. JESUS RICARGO GAMEZ LEÓN SUPERVISOR		ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			







MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN									ESTIMACIÓN No.: 3 (TRES)	
							HOJA: 4			
							DE: 4			

PERIODO :		DEL: 01 DE NOVIEMBRE		AL: 30 DE NOVIEMBRE		DEL AÑO: 2016		FECHA: 30/11/2016	
-----------	--	----------------------	--	---------------------	--	---------------	--	-------------------	--

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16	
							CONTRATISTA: COCI HOMES, S.A. DE C.V.	

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGUN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.5	PAVIMENTOS								
1.5.6	JUNTA DE DILATACION DE 1.5" DE PVC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	M	4 DE 4	6,218.80	2,176.58	0.00	2,176.58	\$27.89	\$60,704.82
1.5.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A CADA 50 M. COMO MAXIMO, HECHO A BASE DE PASAJUNTA DE 60 CM DE LONGITUD CON VARILLA LISA DE 5/8" @ 30 CM. DE LA CUAL LA MITAD QUEDARA AHOGADA EN LA LOSA Y LA OTRA MITAD SE ARTICULARA CON GRASA PARA CHASIS Y FORRO DE POLIDUCTO NARANJA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HOJA DE CARTON ASFALTADO DE 1-3 MM, EN TODO EL ESPESOR DE LA LOSA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	M	4 DE 4	483.80	169.33	0.00	169.33	\$184.32	\$31,210.91
SUBTOTAL PAVIMENTOS									\$3,022,832.99
SUBTOTAL									\$4,578,248.74
IVA									\$732,619.80
TOTAL									\$5,310,768.54

 CONFORME ING. ARISTOTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V.	 APPROBADO ING. JESUS RICARGO GAMEZ LEÓN SUPERVISOR	 Vo.Bo. ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	 APPROBADO ING. LINO EDDGALLEROS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
--	---	--	--



 DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN

 AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN				GENERADORES	
					HOJA	1
					DE	3

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓							CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16 ✓		
								CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V. ✓		
GENERADORES ESTIMACION No. 3 (TRES) ✓							FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2016 ✓			
CALCULO: ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ											
No.	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACIÓN TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO CANTIDAD	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
1.4	TERRACERIAS										% de avance de esta estimación
1.4.2	NIVELACION DE TERRACERIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL EN CALLES, INCLUYE: MATERIALES, CAL, MADERA, EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA Y CONSERVACION DE NIVELES EN TODAS LAS ETAPAS DE CONSTRUCCION. NOTA: EL TRAZO LO DARA LA PARTE CONTRATANTE.				M2	1,040.93	10.70		2.00	✓ 4,455.18	20%
1.4.4	CORTE DE CAJA DE TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.				M2	1,040.93	10.70		2.00	✓ 3,341.39	15%
1.4.5	CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION A 1 KM MEDIDO EN BANCO.				M3	1,040.93	10.70	0.50	2.00	✓ 3,341.39	30%
1.4.6	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL (SUBRASANTE) EN 30 CM. ESP. INCLUYE: ESCARIFICACION, HOMOGENEIZACION DE MATERIAL, NIVELACION DE TERRENO.				M2	1,040.93	10.70		2.00	✓ 13,385.53	80%
1.4.7	FORMACION DE SUBASE DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL BALASTRE CRIBADO, COMPACTADO AL 90% DEL P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COMPACTADO, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				M3	1,040.93	10.70	0.20	2.00	✓ 445.52	10%
1.4.8	FORMACION DE BASE DE 20 CM. DE ESPESOR CON BALASTRE CRIBADO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. INCLUYE: MEZCLADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTACION.				M3	1,040.93	10.70	0.20	2.00	✓ 1,113.79	25%

REALIZO:

ING. ARISTOTELES SAQUELARES RODRIGUEZ
COCI HOMES, S.A. DE C.V.


 DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

VoBo:

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Ahome

Por la fuerza de su gente

GENERADORES

HOJA2

DE3

OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-073-16

CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.


FECHA:

30 DE NOVIEMBRE DE 2016


CALCULÓ: ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN							RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
1.4	TERRACERIAS									% de avance de esta estimación
1.4.9	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1 A RAZON DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA BASE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				M2	1,040.93	10.70		2.00	✓ 11,137.95 50%

REALIZÓ:



ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ
COCI HOMES, S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN
SUPERVISOR



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Ahome

Por la fuerza de su gente

GENERADORES

HOJA2

DE3

OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-073-16

CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.


FECHA:

30 DE NOVIEMBRE DE 2016


CALCULÓ: ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN							RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
1.5	TRAZO DE L									
1.5.1	TRAZO DE L									
1.5.2	NIVELACION ESTABLECIMIENTO DE MATERIALES OBRA.									
1.5.3	GUARNICION DE PALOMA KG/CM2, T.M. EN VACIADO ALBAÑILERIA									
1.5.5	PAVIMENTO T.M.A. 38 MM EN VACIADO ALBAÑILERIA									
1.5.6	JUNTA DE D MANO DE NECESARIO PLANOS Y									
1.5.8	SUMINISTRO Y COMO MAXIMO CON VARILLA AHOGADA EN PARA CHASIS Y MANO DE O TODO EL ES CONCEPTO T DE CONSTRU.									

REALIZÓ:



ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ
COCI HOMES, S.A. DE C.V.





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y
ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE,
TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓


HOJA DE BITACORA No.

UBICACIÓN: BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO
FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL
VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: COCI HOMES, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	01/11/16 ✓	Se continuo con corte de terreno natural, retiro de material producto de excavaciones, Simultaneamente se continuo con trabajos de suministro de material calidad bore y subbase 





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y
ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE,
TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓


HOJA DE BITACORA No.

UBICACIÓN: BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO
FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL
VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: COCI HOMES, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	7/11/16 ✓	Se realizan trabajos de metoconformado y compactacion de subbase en un tramo en otro se trabaja en base
		
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y
ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE,
TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No.

UBICACIÓN: BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO
FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL
VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: COCI HOMES, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	13 / 11 / 16	Se terminan los trabajos de corte de terreno natural con motocortadora, se continúan con los trabajos de relleno en la zona anterior, donde finalmente se retira el material producto de excavaciones y la corte 



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y
ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE,
TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No.

UBICACIÓN: BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO
FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL
VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: COCI HOMES, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	19/11/16 ✓	Se registra riego de emulsion asfáltico FM-1 a 4.5 l/m ² y Arenas, en otro tramo se continúo con colado de guarniciones tipo L
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y
ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE,
TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No.

UBICACIÓN: BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO
FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL
VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: COCI HOMES, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
25/11/16 ✓		Se realizan trabajos de solado de guarnición tipo "Y" y colada de pavimento a base de concreto $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ esto en el lado norte del tramo, en el lado sur se continúa con trabajos de terrazas. 



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y
ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE,
TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No.

UBICACIÓN: BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO
FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL
VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: COCI HOMES, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
		30/11/16 ✓ Se continua con los trabajos descritos en la Nota Anterior, el día de hoy se presenta la Estimación Número 3 de la obra 

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016

Del 01 de Noviembre de 2016 al 30 de Noviembre de 2016

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA




DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V. ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16 ✓
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016 ✓




DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
SECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016




DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

Ahome

CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016




[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016




DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
SECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V. ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016

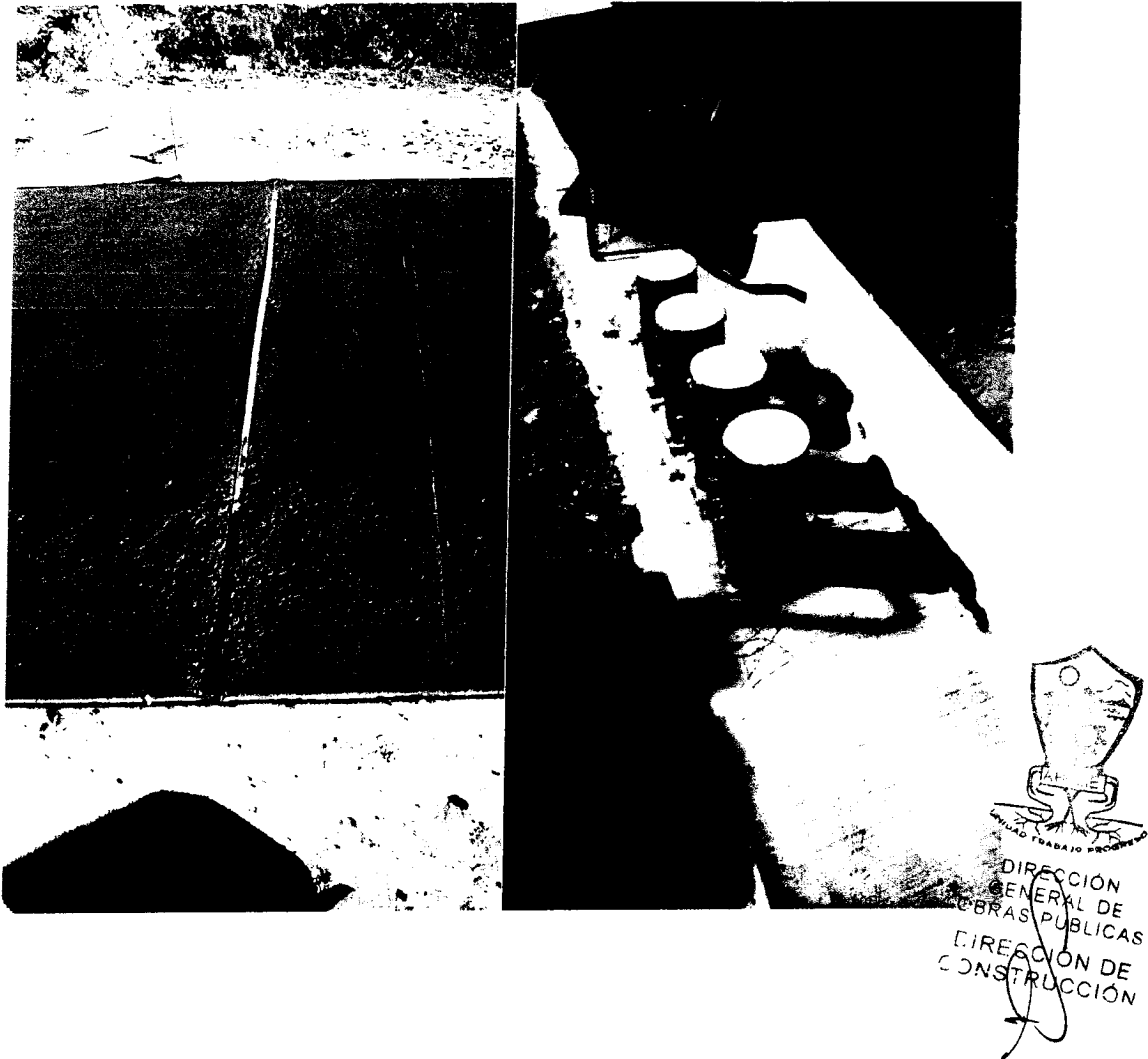

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA




CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016



[Handwritten signature]

CONTRATISTA:	
COCI HOMES, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAGE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO ERACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NÚMERO DE CONTRATO:	
CONT-DGOP-DC-073-16	
FECHA:	
31 DE OCTUBRE DE 2016	




DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016




DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA




CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016




DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016




DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016




DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA





CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016

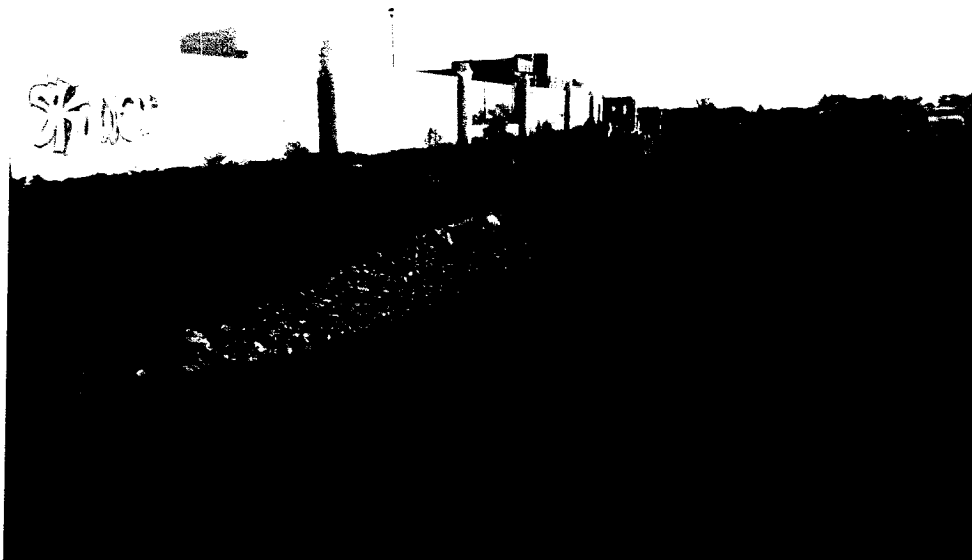


DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016




DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2016



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Coci Homes, S.A. de C.V.

R.F.C. CHO-031218-69A
Serapio Rendón No. 315 Pte. Col. Centro
Tel. 01 (668) 816 7611 Los Mochis, Sinaloa.

C. Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya
Director General de Obras Públicas.
P r e s e n t e . -

Por medio de la presente, manifiesto "bajo protesta de decir verdad" lo siguiente: ✓

1).- Haber presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, correspondientes a los últimos ejercicios fiscales, así como también hemos presentado las declaraciones que contienen los pagos provisionales correspondientes a los 5 últimos ejercicios fiscales.

2).- Que no tengo adeudos fiscales firmes a mi cargo por impuestos federales.

Comunico que no se incurrió durante el año 2015, en los causales de revocación a que hace referencia el artículo No. 66, Fracción de III, del Código Fiscal de la Federación, además comunico a usted estar al corriente con la declaración anual, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior al presente.

Como prueba de lo anterior, anexo opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (positiva), de conformidad a lo establecido en el Artículo No. 32-D, del mismo código.

Sin más por el momento quedo a su apreciable consideración.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a los 15 días de Diciembre de 2016. ✓

Atentamente


C. Aristóteles Saquelares Rodríguez
Representante legal
COCI HOMES, S.A. DE C.V.



FECHA: 14 de diciembre de 2016

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 16NB5070608
Clave de R.F.C.: CHO03121869A
Nombre, Denominación o Razón social: COCI HOMES SA DE CV

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 14 de diciembre de 2016, a las 18:05 horas


NOTAS:

- La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016
- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día siguiente en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016.
- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 salarios mínimos del área geográfica del contribuyente elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.30. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y a través del Portal del SAT.


DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS FEDERALES
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN

Cadena Original:

||CHO03121869A|16NB5070608|14-12-2016|P||000001000007000112188||

Sello Digital:

ZeF5TR+ZoANsv5qdZV09wU1UPsNBa9qf0zXiA1kbP9TAuupxafKIiCYE3O8OSn91NxCKjs6ILaeFRUfT9Yhj/RpfRB
hQlqK5yorg58my2veS+WRyPTGmDs2jPoCOZWu0QQBWxa1KPK819uLv7pZT7kSp/L29e/Bcxjab4+Q5gg=





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

CERTIFICADO DE NO ADEUDO

FOLIO: 11613

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DANDO UNA MINUCIOSA BÚSQUEDA EN LOS

ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA HACEMOS CONSTAR QUE EL C: _____
COCI HOMES, SA DE CV ✓

NO TIENE NINGÚN ADEUDO ANTE ESTE MUNICIPIO DE AHOME DE ACUERDO A LO QUE
ESTABLECE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL ARTÍCULO 4, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, POR CONCEPTO DE:
MULTAS MUNICIPALES Y FEDERALES, IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS Y PERMISOS.

14

DICIEMBRE /


SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS _____ DÍAS DEL MES DE _____

DEL AÑO 20 _____ PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME PERTINENTE.

TRAMITE EXCLUSIVO ANTE OBRAS PUBLICAS


CONTRATISTA

ATENTAMENTE



C. DANIEL GPE. GARCÍA LEÓN
DIRECTOR DE INGRESOS


GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME
TESORERÍA MUNICIPAL




DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO.
EL ABC DE UN ANTICIPO Y/O ESTIMACIÓN 2016

CONTRATISTA COCI HOMES S.A. DE C.V. (PARA REVISIÓN)
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA CONT-DGOP-DC-073-16 08-08-2016
ANTICIPO Y/O ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES)
FECHA Y HORA DE RECIBO 16-12-2016 11:21 A.M.

(1) DOCUMENTO ANEXO (2) NO VIENE (3) INCOMPLETO (4) NO APLICA (5) ERROR

(A) DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

- (4) 1.-PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA
- (2) 2.-OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN
- (4) 3.-OFICIO DE ASIGNACIÓN DE OBRA
- (4) 4.-OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA
- (4) 5.-OFICIO DE AUTORIZACIÓN CONTRATO
- (4) 6.-OFICIO DE RESOLUCIÓN FUNDADA
- (4) 7.-CONTRATO
- (4) 8.-FIANZAS, ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, EN SU CASO.
- (4) 9.-JUSTIFICACIÓN Y CONVENIO AMPLIATORIO, EN SU CASO.
- (4) 10.- FIANZA POR EL CONVENIO AMPLIATORIO.



(B) DOCUMENTACIÓN ESTIMACIÓN DE LA OBRA

- (1) 1.-NÚMEROS GENERADORES
- (4) 2.-ESTIMACIÓN
- (1) 3.-HOJA DE RESUMEN
- (1) 4.-RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES
- (1) 5.-ESTADO DE CUENTA
- (4) 6.-FINIQUITO DE LA OBRA, EN SU CASO.
- (1) 7.-FACTURA ORIGINAL CON SU VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL.
- (1) 8.-BITÁCORA DE OBRA.
- (1) 9.- ALBÚM FOTOGRÁFICO DEL PROCESO DE LA OBRA.
- (4) 10.-ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.
- (4) 11.-ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN A LA PARTE OPERATIVA Ó A LOS BENEFICIARIOS, CUANDO EL CASO LO AMERITE.

(C) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

- (4) 1.-OFICIO DE ENVÍO
- (4) 2.-CARTA DE RENUNCIA AL ANTICIPO, EN SU CASO.
- (4) 3.-OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERV. DE OBRAS PÚBLICAS.
- (4) 4.-OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, CON EL NÚMERO DE SU CÉDULA PROFESIONAL, CUANDO SEAN OBRAS FEDERALES.
- (4) 5.-CARTA DE INICIO DE LA OBRA
- (4) 6.-CARTA DE TÉRMINO DE LA OBRA, EN SU CASO.
- (4) 7.-OFICIO DE AVISO DE INICIO DE LA OBRA A CONTRALORÍA MUNICIPAL.
- (4) 8.-OFICIO DE TÉRMINO DE OBRA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, EN SU CASO.
- (1) 9.-CARTA DE NO ADEUDO FISCAL Y OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.
- (1) 10.-CERTIFICADO DE NO ADEUDO AL BURÓ MUNICIPAL
- (4) 11.- CUANDO SE RECIBA ANTICIPO, COPIA DE LA FICHA DEL DEPÓSITO; ESTADO DE CUENTA O TRANSFERENCIA BANCARIA, PARA VERIFICAR LA FECHA DEL MISMO.
- (4) 12.-TERMINADO LO ANTERIOR SE PROCEDE AL SELLO. (DIR. GRAL. O. PÚBLICAS)
- (4) 13.-COMPLEMENTAR LAS FIRMAS (DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) DEL ANTICIPO Y/O ESTIMACIÓN.
- (4) 14.-PRESENTAR A GESTIÓN Y SEGUIMIENTO EN ORIGINAL CON TRES COPIAS. DIR. DE CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTRALORÍA MPAL.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HID SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCAN EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC TERESA A BLVD. PIONEROS DE VALLE. LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.

CONT-DGOP-DC-073-16
COCI HOMES, S.A. DE C.V.

CASO 2-C. ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)				
REQUISITOS				
FACTURA BORRADOR ✓✓				
Verificación fiscal ✓				
CARTA DE NO ADEUDO FISCAL ✓				
CARTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POSITIVA ✓				
ESTIMACIÓN ✓	RECIBO ✓	HOJAS NORMALES ✓	RESUMEN ✓	ESTADO DE CUENTA ✓
NUMEROS GENERADORES				
✓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN ✓				
✓ CONSTANCIA DE NO ADEUDO AL BURO MUNICIPAL				
✓ REPORTE FOTOGRÁFICO				
✓ HOJAS DE BITACORA				
