

Sección de: D.G.O.P.

Oficio No.: S/N

Expediente:

Asunto: El que se indica

Lic Elliot Ascarrega Beltrán Tesorero Municipal, Municipio de Ahome. Presente. -

Anexo al presente envío para su revisión y pago, estimación no. 4 (Cuatro) factura, carta de no adeudo fiscal, carta de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva, números generadores, oficio de autorización de inversión, constancia de no adeudo al buro municipal, reporte fotográfico, hojas de bitácora, de la siguiente obra:

Importe Total Estimado: \$5,903,062.14

Importe Estimado a Pagar: \$3,826,812.70

No. de contrato	Obra	Contratista
CONT-DGOP- DC-073-16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración quedo de Ud. muy.

A t e n t a m e n t e "AHOME, TRABAJAMOS CONTIGO" Los Mochis, Sin., 01 de Pebrero de 2017

C. Ing. Josué Jacinto Sánchez Ruelas Director General de Obras Públicas DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE

C.c.p' C. Lic. Pavel Roberto Castro Felix.-Director de Contraloría Municipal. CONSTRUCCIÓN

C.c.p' C. Lic. Anselmo Acosta Bojórquez.-Director de Egresos.

C.c.p' C. Daniel Kim Ortega.-Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.

C.c.p' Archivo



TELEFONOS: CONMUTADOR: (668) 816 40 00 OFICINA: (668) 816 40 22 FAX (668) 816 50 06

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SIN. R.F.C. MAH-170101-3C0





Sección de: D.G.O.P.

Oficio No.: S/N

Expediente:

Asunto: El que se indica

Lic. Elliot Ascarrega Beltrán Tesorero Municipal, Municipio de Ahome. Presente. -

Anexo al presente envío para su revisión y pago, estimación no. 4 (Cuatro) factura, carta de no adeudo fiscal, carta de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva, números generadores, oficio de autorización de inversión, constancia de no adeudo al buro municipal, reporte fotográfico, hojas de bitácora, de la siguiente obra:

Importe Total Estimado: \$5,903,062.14

Importe Estimado a Pagar: \$3,826,812.70

No. de contrato	Obra	Con	tratista
CONT-DGOP-	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON-	COCI	HOMES,
DC-073-16	CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA	S.A. DE	C.V.
	POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y		
	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION		
	BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC,		
	SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE,		
	LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración quedo de Ud. muy.

Atentamente "AHOME, TRABAJAMOS CONTIGO" Los Mochis, Sin., 01 de Febrero de 2017

C. Ing. Ricardo Maldonado Islas Director de Construcción

C.c.p' C. Lic. Pavel Roberto Castro Felix.-Director de Contraloría Municipal.

C.c.p' C. Lic. Anselmo Acosta Bojórquez.-Director de Egresos.

C.c.p' C. Daniel Kim Ortega.-Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.


C.c.p' Archivo

DIRECCIÓN GENERA
DE OBRAS PUBLICA
DE OBRAS PUBLICA
DEPTO DE GESTIÓN Y SEGUINIENT.

111 P. I.

111 P

CONMUTADOR: (668) 816 40 00 OFICINA: (668) 816 40 22 FAX (668) 816 50 06







Municipio de Ahome

C. Lic. Arturo Duarte García Presidente Municipal Presente:

Núm.	Obra	Inversión (Importe Neto)	Origen del Recurso
1	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, servicios de agua potable, drenaje pluvial y alcantarillado en prolongación Boulevard Rio Fuerte, tramo Fracc. Santa Teresa a Blvd. Pioneros del Valle, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	0	✓Gasto Directo

Y tomando en cuenta el presupuesto de la misma, hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para su ejecución.

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración al respecto, quedo de Ud. muy

Atentamente
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE",
Los Mochis, Sin., a 28 de Julio 2016.

Lic. Juan Machna Feb. A Communicipal Transporter Municipal Tesoreria MUNIC DE AHOME

DIRECCION

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

C.C.P. C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO.- Director General de Obras Públicas.- Pte.-C.C.P. ARCHIVO.-Ofinver



02

Cuenta: No Identificado

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CALLE:

RFC:

COLONIA:

LOCALIDAD:

Método de Pago:

Número de Cuenta:

COCI HOMES, S.A. DE C.V. SERAPIO RENDON #315 Los Mochis, Sinaloa. Tel: 668 816 76 11

R.F.C. CHO-031218-69A

FACTURA

SERIE: FA

FOLIO: 000074

FECHA: 01/Feb/2017

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

01/02/2017 10:34:21

CLIENTE: 00005

NOMBRE: MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N
BIENESTAR

C.P.: 8

No. INTERIOR:

81280

LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME

MAH1701013C0 ESTADO: Sinaloa PAIS: México

Expedida en:

LOS MOCHIS, SINALOA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Régimen Fiscal: Personas Morales del Régimen General

35 PAGO DE ESTIMACION NO. 4 CUATRO

RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD

RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD.

PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO

DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO NO. CONT-DGOP-DC-073-16

AMORTIZACION DE ANTICIPO: 2,066,071.75

0.2% SEGUN CONVENIO CMIC. 0.2% \$10,177.69

SUMA DE DEDUCCIONES \$2,076,249.44

IMPORTE A RECIBIR \$3,826,812.70

Pieza

1.00 3,307,750.3 3,307,750.34

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

IMPORTE CON LETRA: Son: (Tres Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Novecientos Noventa Pesos 39/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gzekrWmVdM4w9n+Ozs8D7KhbTY88zKwmYKNSfULZ69SrhegVWyarW5Pf5jmt/Ua6PtJh1Q/Xo8FOu+j diqZVtyrv0CcDhfJ/JbprUwjrsw+3pGjEriE0EAE2LEHAp07LFw7/kbGEngUez6Zv9s3gzizlsqiQEz PO2ZSZg3xTd9s=

TOTAL

TOTAL

IVA

SUBTOTAL

3,836,990.39

3,307,750.34

529,240.05

POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE INMOBILIARIA COCI, S.A. DE C.V., EN

Los Mochis, Sin.

EL 01 de Febrero

de 2017

LA CANTIDAD DE \$ 3,836,990.39

(Son: (Tres Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Novecientos Noventa Pesos 39/100 M.N.)
ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y SU PAGO EXTEMPORANEO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS

A RAZON DE 12.00 MENSUAL

2000 200 2000

Folio Fiscal: F3B847A7-8903-485B-BD54-D8A516C8132F

Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T11:34:24

No. de Serie del Certificado del SAT:

000010000003011004

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

Iva 16% Gastos

||1.0|F3B847A7-8903-485B-BD54-D8A516C8132F|2017
-02-01T11:34:24|IrNo8u+8i00U6RhY2WKryCFRWkypch9
FBE4mjAoxWPpaekjsPzpK4yrEFVuGpl2nRpvxrLyaU7dxrG
RD68T3ksKifGkf//M53ww27y9xh/NF4+NwjJHQp7iUsgXXy
u6dtcJ9ZY3uBEbAqmSLixBy6JkZuWwnjdTLZXb4pU0pahCG
xxRXqgv1GJGW/zQysG/KGeBVDnJ0eA+ff8V25+k+/WAQy5Z
Hq1ScEhluAf3tIUT1VxKPA7jZ7FM/1zAVTGPwuuCSIdBPDj
JZJMu1EpsVERSIÓNSdvH3X2K/r/jB2+3x21s4jcXi9d6+iK
ng+g2724foDxw+iZMuPgbggMJhFhA==|00001000000311

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESAUN CFDI.

TIMBRADO POR: SIFEI

NÚMERO DE CERMPICADO:

00001000000404266760







ingreso

gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted pod	drá verificar si el comprobante fu	ue Certificado por el SAT	
Fo	olio Fiscal		×
RI	FC Emisor		
RI	FC Receptor		
Proporcione los dígitos de la ima	gen Verificar CFDI		
RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social de
RFC del Emisor	Nombre o Razon Social dei Emisor	Krc del Receptor	Receptor
CHO03121869A	COCI HOMES, S.A. DE C.V.	MAH1701013C0 /	MUNICIPIO DE AHOME
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
F3B847A7-8903-485B-BD54- D8A516C8132F	2017-02-01T10:34:21	2017-02-01T11:34:24	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	7

Vigente

Imprimir



\$3,836,990.39



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS ES DE TRACTOR DE SU OBRA POR DE SU O DIRECCION DE CONSTRUCCION.

> ESTIMACION No.: 4 (CUATRO)

moo = ==	RAZÓN SOCIAL	4		COCI HO	MES, S.A. DE C.V.	/	
DATOS DEL ONTRATIST A	DOMICILIO:	RENDÓN No. 3	15				
	CIUDAD:	LOS MOCHIS	ESTADO:	SINALOA		TELÉFONO:	816 7611
	No. DE CONTRA	ATO:	FECHA DI	Е	20,000,001	IMPORTE D	EL CONTRATO
		OP-DC-073-16	CONTRATO:		08/08/2016 J		22,212.04
DATOS DEL		Y LOCALIZACIÓN					O 2016
CONTRATO	DRENAJE PLU	VIAL Y ALCANTA	ARILLADÓ EN	PROLONGA	HIDRAULICO, SE CION BOULEVARD HIS, MUNICIPIO D	RIO FUERTE,	TRAMO, FRACO
						BUENO POR	: \$3,826,812.7
		L MUNICIPIO DE A					/
					OCIENTOS DOCE PE		.)
			1		EFERIDA EN EL PE	RIODO	
COMPRENDII		01/12/2016	_	15/12/201	5 √DEL 2016. √		
DE ACUERDO	CON LA SIGUIEN	NTE LIQUIDACIÓN	l:				
				IMPORTE FACTURA		LIQUIDACIO	ÓN DEFINITIVA
IMP	ORTE DE ESTIMA	ACIÓN CON PRECI	OS UNITARIOS	\$3,307,750	35,088,846.6	7 1,	
			I.V.A. 16%:		1 /		
		SUMA	:	\$3,836,990	.39 √ \$5,903,062.1	4 ./	
			DEDUCCIONES		1	- /	
		AMORTIZACIÓN			\$2,066,071.7		
		ENCIÓN 0.20% CON			\$10,177.6		
	RETENC	CION 3.0% INSP. CO	INTROL Y VIG.:		\$0.0	0 1	
						,	
				DEDUCCION			
LUCARY	PERCULA VOLVO	CVIIO CDI	IMPO	ORTE A PAGA	R: \$3,826,812.70		
LUGAR Y	FECHA: LOS MO	OCHIS, SIN., A	IMPO		R: \$3,826,812.70		
LUGAR Y	0	OCHIS, SIN., A	IMPO	ORTE A PAGA	R: \$3,826,812.70 E DE 2016 J	0 1	
LUGAR Y	FECHA: LOS MO	OCHIS, SIN., A	IMPO	ORTE A PAGA	R: \$3,826,812.70	0 1	
LUGAR Y	0	OCHIS, SIN., A	IMPO	ORTE A PAGA	R: \$3,826,812.70 E DE 2016 J	0 1	
LUGAR Y	0	OCHIS, SIN., A	IMPO	ORTE A PAGA	R: \$3,826,812.70 E DE 2016 J	0 1	
(RECIBÍ	OCHIS, SIN., A RES RODRÍGUEZ	IMPO	DE DICIEMBR	R: \$3,826,812.70 E DE 2016 J	0 1	
(ING. ARISTÓĬ	RECIBÍ	RES RODRÍGUEZ	IMPO	DE DICIEMBR	AUTORIZA	S MONTOYA	
(ING. ARISTÓĬ	RECIBÍ TELES SAQUELAI	RES RODRÍGUEZ	IMPO	DE DICIEMBR	AUTORIZA O EDDGARDO RIOS	S MONTOYA	
(ING. ARISTÓŤ CO	RECIBÍ TELES SAQUELAI	RES RODRÍGUEZ	IMPC 15 I	DE DICIEMBR	AUTORIZA O EDDGARDO RIOS	S MONTOYA	
ING. ARISTÓÍ CO IMPORTE A	RECIBÍ TELES SAQUELAI CI HOMES, S.A. D	RES RODRÍGUEZ DE C.V.	IMPC 15 I	DE DICIEMBR	AUTORIZA O EDDGARDO RIOS	S MONTOYA	DIRECCIO
ING. ARISTÓÍ CO IMPORTE A	RECIBÍ TELES SAQUELAI CI HOMES, S.A. D	RES RODRÍGUEZ DE C.V. \$3,836,990.39	IMPC 15 I	DE DICIEMBR	AUTORIZA O EDDGARDO RIOS	S MONTOYA	DIRECCIÓ GENERAL OBRAS PUBLI
ING. ARISTÓÍ CO IMPORTE A	RECIBÍ TELES SAQUELAI CI HOMES, S.A. D	RES RODRÍGUEZ DE C.V. \$3,836,990.39	IMPC 15 I	DE DICIEMBR	AUTORIZA O EDDGARDO RIOS	S MON TOYA RAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN GENERAL L OBRAS PUBLI DIRECCIÓN CONSTRUCC



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO)

PERIODO					FECHA: 15/1	2/2016			
DEL	01 DE DICIEMBRE AL	15 DE DICIEMI		DE	2016				
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CO AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALC				CONT-DGOP-DC-0	73-16 —			
OBRA:	BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SAI VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SIN		D. PIONEROS DEL	CONTRATISTA:	COCI HOMES, S.A. DE C.V.				
No.	PARTIDA	DE ESTIMACIO	ONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES				
1.1	RED DE DRENAJE SANITARIO	\$1.3	54,236.54	\$0.00	35% ANTICIP	0			
1.2	RED DE AGUA POTABLE			\$322,943.47	ESTIMACIONES ANT.:	\$3,502,638.14			
1.3	DRENAJE PLUVIAL		\$0.00	\$46,520.60	ESTA ESTIMACIÓN:	\$2,066,071.75			
1.4	TERRACERIAS	\$4,2	50,118.00	\$2,185,992.77	TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	\$5,568,709.89			
1.5	PAVIMENTOS		22,832.99	\$2,258,473.92					
1.6	PREPARACION SANITARIA PARA FUTURO DESAF		\$0.00	\$274,915.91	.2% SEGUM C.I				
1.7	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD)	\$0.00	\$0.00	ESTIMACIONES ANT.:	\$17,254.38			
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		Minusello de la companya di sa	SHALL BUT THOUSAND STATES	ESTA ESTIMACIÓN:	\$10,177.69			
	\$1'781,096.34 \$284,975.41 \$2'066,071.75	SUBTOTAL DE ESTIMACION :	\$8,627,187.53	\$5,088,846.6	TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	\$27,432.07			
		I.V.A.:16 %	\$1,380,350.01	\$814,215.4	17				
	TOTAL DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	TOTAL:	\$10,007,537.54	\$5,903,062.	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	\$5,596,141.96			
	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN: SON		(CINCO MILLON	ES NOVECIENTOS TRES M	IL SESENTA Y DOS PESOS 14/100 MN)				
	ESTADO CONTABLE				ANTICIPO				
	ESTADO CONTABLE	IMP	PORTE CONTRATADO	/	1. H 2017 T 10. T	DE ANTICIPO			
	IMPORTE DEL CONTRATO:		\$21,222,212.04		ICIPO OTORGADO:	\$7,427,774.21			
	ESTIMADO A LA FECHA:		\$15,910,599.68		TIZADO A LA FECHA:	\$5,568,709.89			
	SALDO DE CONTRATO A ESTIMAR:		\$5,311,612.36		O POR AMORTIZAR:	\$1,859,064.32			
	CONFORME	REVISA		₩y Bo.	AP	RUEBA			
	0)	(A)	1		4.7				
ING. A	RISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ	NG. JESUS RICARGO	GAMEZ LEÓN	ING. ENRIQUE ZARA	TE GAXIOLA ING. LINO EDUGA	RDO RIOS MONTOYA			
	COCI HOMES, S.A. DE C.V.	SUPERVISO	OR	RESPONSABLE DE LA I		AL DE OBRAS PÚBLICAS			

DIRECCIÓN GENERAL DE CBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTADO DE CUENTA

OBRA:	PLUVIAL Y ALCANTARI	VIMENTACION CON CONC LLADO EN PROLONGACIO PIONEROS DEL VALLE, LO	N BOULEVARD RIO	FUERTE, TRAMO	FRACC. SANTA		ORIGEN DEL RECURSO:	FECHA ACTUAL:
IMPORTE DE						CONT. No.: CONT-DGOI		DP-DC-073-16
CONTRATO (NETO)	\$ 21,222,212.04	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	\$ 7,427,774.21	/		PERIODO	DEL CONTRATO :	DIAS CALIFICADOS:
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	AMORT.	DEDUCCIO SUPERVISIÓN	C.M.I.C.	OTRAS	TOTAL	LIQUIDO A
1 (UNO)	DEL: 14/09/201	- S1 399 366 14 /	\$489,778.15	\$0.00	9.20% \$2,412.70	\$0.00	\$492,190.85	\$907,175.29 \(\square\)
2 (DOS)	DEL: 01/10/201 AL: 31/10/201	— \$3 297 402 86 /	\$1,154,091.00	\$0.00	\$5,685.18	\$0.00	\$1,159,776.18	\$2,137,626.68
3 (TRES)	DEL: 01/11/20 AL: 30/11/20	- S5 310 768 54 .	\$1,858,768.99	\$0.00	\$9,156.50	\$0.00	\$1,867,925.49	\$3,442,843.05
4 (CUATRO)	DEL: 01/12/20 AL: 15/12/20	\$5 903 062 14	\$2,066,071.75	\$0.00	\$10,177.69	\$0.00	\$2,076,249.44	\$3,826,812.70
SALDO DE	TOTALE	\$15,910,599.68 \$5,311,612.36		\$0.00	\$27,432.07 ANTICIPO POR			
	CONFORME	REVIS	A		Yo.Bo.	1	APP	RVEBA
ING. ARIS	TÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ	ING. JESUS RICARG	O GAMEZ LEÓN	ING. ENR	RIQUE ZARATE GA	XIOLA	ING. LINO EDDG	RDO RIOS MONTOYA
COCI	HOMES, S.A. DE C.V.	SUPERV	ISOR		BLE DE LA DIREC	CIÓN DE	DIRECTOR GENERA	L DE OBRAS PÚBLICAS





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



CONSTRUCCIÓN

ESTIMACIÓN No.:

4 (CUATRO)

HOJA: DE:

7

ERIODO EL:	: 01 DE DICIEMBRE AL:	01 DE DICIEMBRE AL: 15 DE DICIEMBRE DEI		DEL AÑO:	FECHA 15/12/2016 2016				
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	DEATH IC	of SERVI	CIOS DE ACI	IA POTABLE	CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-	073-16 √
OBRA:	RENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO ANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		AMO FRACC	CONTRATISTA	COCI HOMES, S.A. DE C.V.				
No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.2	RED DE AGUA POTABLE								
1.2.1	TRAZO DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO.	√ M2	1 DE 7	J 447.84	447.84	√ 0.00	√447.84	√ \$12.80	₹ \$5,732.35
1.2.2	NIVELACION EN EL PROCESO DE LOS TRABAJOS.	∫ M	1 DE 7	√ 669.86	669.86	√ 0.00	, 669.86	\$14.12	√ \$9,458.42
1.2.3	EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS A PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO II EN SECO.	/ M3	1 DE 7	J 506.98	506.98	√ 0.00	J 506.98	√\$41.54	√ \$21,059.95
1.2.4	AFINE A FONDO DE CEPA A MANO PARA COLOCACIÓN DE TUBERIA, EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	√ M2	1 DE 7	J 447.84	447.84	√ 0.00	J 447.84	\$27.96	\$12,521.61
1.2.5	CAMA CON ARENA FINA PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HUMEDAD, COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO.	√ _{M3}	1 DE 7	√ 44.78	44.78	0.00	√ 44.78	\$582.16	\$26,069.12
1.2.6	ACOSTILLADO CON ARENA FINA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HUMEDAD, COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO.	/ _{M3}	1 DE 7	J _{185.25}	185.25	0.00	√ _{185.25}	\$582.16	\$107,845.14
	CONFORME REVISA	7				10		APRUEBA	,
ING.	ARISTOTELES SAQUELARES A NG. JEŞUS RICARGO	GAMEZ	LEÓN	INC. EN	RIQUE ZARA	TE GAXIOLA	ING. LI	NO EIDOARDO I	UOS MONTOYA
	RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V. DIRECCIÓN SUPERVISO GENERAL DE					DIRECCIÓN DE		P GENERAL DE	

DIRECCIÓN DE

PAR PUBLICAS



Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: 4

4 (CUATRO)

HOJA: DE: 7

EL:	01 DE DICIEMBRE AL :		15 DE	DICIEMBR	<u> </u>	DELAÑO:	2016			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HII DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, N	N BOULE	VARD RIO	FUERTE, TE	FUERTE, TRAMO FRACC		CONT-DGOP-DC-073-16 COCI HOMES, S.A. DE C.V.			
No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1.2	RED DE AGUA POTABLE									
1.2.7	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO EN CAPAS DE 0.20 MT. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y ACARREOS.	МЗ	2 DE 7	267.40	267.40	0.00	267.40	\$125.74	\$33,622.88	
1.2.8	CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE OBRA Á 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO D CORTE MEDIDO EN BANCO.	МЗ	2 DE 7	239.58	239.58	0.00	239.58 ,/	\$49.74 ~	\$11,916.71	
1.2.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 3" HIDRAULICA RD-32.5 INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL, PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO D OBRA.	м	2 DE 7	28.56	28.56	0.00	28.56	\$92.49	\$2,641.51	
1.2.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4° HIDRAULICA RD-41 INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL, PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	М	2 DE 7	182.10	182.10	0.00	182.10	\$114.09 <i>)</i>	\$20,775.79	
1.2.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" HIDRAULICA RD-41 INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL, PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	м-	2 DE 7	459.20	459.20	0.00	459.20	\$155.27 J	\$71,299.98	
						SUBTOTA	AL RED DE AG	SUA POTABLE	\$322,943	
	CONFORME	1			, Bo.	67	(APRUEBA		
	ARISTOTELES SAQUELARES ING. JESUS RICARGO RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V. AHOMES SUPERVIS		LEÓN	_		ATE GAXIOLA DIRECCIÓN DE		OR GENERAL DE O	1	

DIRECCIÓN GENERAL DE CBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.:

4 (CUATRO)

HOJA: DE:

3

FECHA ~15/12/2016 PERIODO: 01 DE DICIEMBRE 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO: 2016 DEL: AL:

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HID DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, M	BOULE	VARD RIC	FUERTE; TE	AMO FRACC.	CONTRATISTA	COCI HOMES, S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.3	DRENAJE PLUVIAL			- 1					
1.3.1	TRAZO DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO.	√M2	3 DE 7	20.31	20.31	√ 0.00	√20.31	√ \$12.80	\$259.97√
1.3.2	NIVELACION EN EL PROCESO DE LOS TRABAJOS.	√M	3 DE 7	J 15.62	15.62	√ 0.00	↓ 15.62	√ \$14.12	\$220.55
1.3.3	EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS A PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO II EN SECO.	√ M3	3 DE 7	. 42.34	42.34	√0.00	J 42.34	J \$41.54	\$1,758.80
1.3.4	AFINE A FONDO DE CEPA A MANO PARA COLOCACIÓN DE TUBERIA, EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	J M2	3 DE 7	√ 20.31	20.31	√0.00	J20.31	√ \$27.96	\$567.87√
1.3.5	CAMA CON GRAVON PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HUMEDAD, COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO.	√ M3	3 DE 7	√ 2.03	2.03	√0.00	∫ 2.03	√\$627.34	\$1,273.50
1.3.6	CAMA CON GRAVON PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HUMEDAD, COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO.	J M3	3 DE 7	J 9.80	9.80	√0.00	J 9.80	√ \$627.34	\$6,147.93
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 60 CM. (24") D DIAMETRO POLIETILENO ALTA DENSIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	』 ML	3 DE 7	√ 15.62	15.62	∫ 0.00	√ _{15.62}	\$ 2,323.43	\$36,291.98
						SUBTO	TAL DRENAJE	E PLUVIAI	√√ \$46,520

ING. ARISTOTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V.

G. JESUS RICARGO GAMEZ LEÓN

SUPERVISOR

INO. ENRIQUE ZARATE GAMOLA

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

GENERAL DE CBRAS PUBLICAS CIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



CONSTRUCCIÓN

ESTIMACIÓN No.: 4 (CUATRO)

HOJA: DE: 4

ERIODO		V			- (nn. 150	FECHA	₹ 15/12	2/2016	
EL:	01 DE DICIEMBRE AL:		15 DE	DICIEMBR	<u>C</u> -4	DEL AÑO:	<u>2016</u> √			
			/			CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-0	73-16 🔻	
	DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION	STRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLÉ, NAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. CONTRATISTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		VIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUI				- (COCI HOMES, S.A. 1	DE C.V. ✓
No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1.4	TERRACERIAS				7					
1.4.2	NIVELACION DE TERRACERIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL EN CALLES, INCLUYE: MATERIALES, CAL, MADERA, EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA Y CONSERVACION DE NIVELES EN TODAS LAS ETAPAS DE CONSTRUCCION. NOTA: EL TRAZO LO DARA LA PARTE CONTRATANTE.	√M2	4 DE 7	J _{22,275.89}	√ _{22,275.89}	√11,137.95	√ _{11,137.94}	J \$13.87	√\$154,483.23	
1.4.7	FORMACION DE SUBASE DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL BALASTRE CRIBADO, COMPACTADO AL 90% DEL P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COMPACTADO, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	√ M2	4 DE 7	√4,455.17	√ 4,455.17	√ 2,227.59	√2,227.58	√ \$374.53	√\$834,295.54	
1.4.8	FORMACION DE BASE DE 20 CM. DE ESPESOR CON BALASTRE CRIBADO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD.INCLUYE: MEZCLADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTACION.	√M2	4 DE 7	J _{4,455.17}	J _{4,455.17}	∫ _{2,227.59}	√2,227.58	√ \$395.70	J \$881,453.41	
1.4.9	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA FM-1 A 1.5 LT/M2 INCLUYE: ARENEO.	√M2	4 DE 7	$J_{22,275.89}$	J22,275.89	J _{11,137.95}	J _{11,137.94}	√ _{\$28.35}	J _{\$315,760.60}	
					3) · · ·	SUB	TOTAL TERRA	ACERIAS /	√ \$2,185,992.7	
	ARISTOTELES SAQUELARES ING. JESUS RICARGO RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V. SUPERVIS		LEÓN			TE GAMOLA DIRECCIÓN DE		NO EDID SARDO R	IOS MONTOYA	

DIRECCIÓN GENERAL DE CBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE ONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.: 4 (CUATRO)

HOJA: DE:

5 7

PERIODO:					FECHA	15/12/2016	
DEL:	01 DE DICIEMBRE	AL:	15 DE DICIEMBRE J	DEL AÑO:	2016 🗸		

		/	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-073-16						
OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HII DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, M	CONTRATISTA	COCI HOMES, S.A. DE C.V.							
No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1.5	PAVIMENTOS			,						
1.5.1	TRAZO DE LA RED CON EQUIPO TOPOGRAFICO	√M2	5 DE 7	√18,430.18	√18,430.18	√ 6,450.56	11,979.62	√ \$12.80	\$153,339.14	
1.5.2	NIVELACION DE TERRACERIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL EN CALLES, INCLUYE: MATERIALES, CAL, MADERA, EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA.	√M2	5 DE 7	√21,344.85	√ _{21,344.85}	√ 7,470.70	√13,874.15	√ \$13.87	J \$192,434.46	
1.5.3	GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L Ó PECHO DE PALOMA TRAMO RECTO DE 70 CM. DE ANCHO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EN VACIADO, TENDIDO, VIBRADO, ACARREOS AGUA PARA ALBAÑILERIA, CURADO Y HERRAMIENTAS.	√ML	5 DE 7	J _{3,323.79}	J _{1,828.09}	√1,163.33	∫ 664.76	√ \$325.89	J \$216,638.64	
1.5.4	GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L Ó PECHO DE PALOMA TRAMO CURVO DE 70 CM. DE ANCHO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EN VACIADO, TENDIDO, VIBRADO, ACARREOS AGUA PARA ALBAÑILERIA, CURADO Y HERRAMIENTAS.	J_{PZA}	5 DE 7	√ _{646,25}	∫ 323.13	√0.00	J 323.13	√ \$399.85	√\$129,203.53	
1.5.5	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 300 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., e=15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN YACIADO, TENDIDO, VIBRADO, ACARREOS, AGUA PARA ALBAÑILERIA, CURADO Y HERRAMIENTAS.	Jм2	5 DE 7	$\int_{18,430.18}$	J _{10,136.60}	J 6,450.56	√3,686.04	J\$366.#3	√ \$1,351,781.45	
	CONFORME REVISA	-			₹6.Bo.			APRUEBA		

ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ

COCI HOMES, S.A. DE C.V.

ING. JESUS RICÁRGO GAMEZ LEÓN

ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA

ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.:

4 (CUATRO)

HOJA: DE:

6

r									
PERIODO DEL:	01 DE DICIEMBRE AL:		15 DE	DICIEMBRI	· J	DEL AÑO:	FECHA 2016	J 15/12	/2016
DEL.	OI DE DICIEMBRE AL.	-	15 DI	DICIEMBRI	2.	DEL ANO:	2010 0		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	DRAULIC	SERVIC	CIOS DE AGI	UA POTABLE.	CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-0	73-16 ✓
OBRA:	DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, M	N BOULE	VARD RIC	FUERTE, TF	RAMO FRACC.	CONTRATISTA		COCI HOMES, S.A. I	DE C.V. /
No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.5	PAVIMENTOS								
1.5.6	JUNTA DE DILATACION DE 1.5" DE PVC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	\int_{M}	6 DE 7	√6,218.80	J _{3,420.34}	√ 2,176.58	√ _{1,243.76}	√ \$27.89	√\$34,688.47°
1.5.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A CADA 50 M. COMO MAXIMO, HECHO A BASE DE PASAJUNTA DE 60 CM. DE LONGITUD CON VARILLA LISA DE 5/8" @ 30 CM. DE LA CUAL LA MITAD QUEDARA AHOGADA EN LA LOSA Y LA OTRA MITAD SE ARTICULARA CON GRASA PARA CHASIS Y FORRO DE POLIDUCTO NARANJA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HOJA DE CARTON ASFALTADO DE 1=3 MM, EN TODO EL ESPESOR DE LA LOSA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	√ _M	6 DE 7	J _{483.80}	√ 266.09	√ 169.33	J96.76	√\$184.32	√ \$17,834.80
1.5.9	RENIVELACION DE POZO DE VISITA COMUN EN UNA PROF. APROX. DE 90 CM. INCLUYE: ENRASE DE MURO ENJARRADO PULIDO, BROCAL, DE FOFO TIPO PESADO 160 KG, ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO PROTECCION PROVISIONAL CON MADERA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS (EN BOULEVARES).	√PZA	6 DE 7	√ 24.00	24.00	√0.00	J _{24.00}	√\$6,773.06 Λ	\$162,553.44
					9	SUE	STOTAL PAVIN	MENTOS	J J \$2,258,473.92
	CONFORME	B		>	V&Bo.	(1		АРРЕВА	
ING	ARISTOTELES SAQUELARES AND LING. JESUS RICARGO	GAMEZ I	LEÓN	ING. E	KIQUE ZARA	TE GAXIOLA	ING. LI	INO EDDGARDO R	PS MONTOYA
	RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V. SUPERVIS	OR		RESPONS	SABLE DE LA	DIRECCIÓN DE	DIRECTO	OR GENERAL DE O	T BRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CERAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE

CONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.: 4 (CUATRO)

HOJA:

DE:

7

PERIODO: **FECHA** J 15/12/2016 01 DE DICIEMBRE J 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO: DEL: AL: 2016 CONT-DGOP-DC-073-16 CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. OBRA: CONTRATISTA ∠ COCI HOMES, S.A. DE C.V. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. / **ESTA** PRECIO HOJA **ESTIMADO** HASTA ESTIM. CONCEPTO UNIDAD IMPORTE No ESTIMACIÓN UNITARIO GENER. **PROYECTO** A LA FECHA ANTERIOR PREPARACION SANITARIA PARA FUTURO DESARROLLO 1.6 PREPARACION SANITARIA PARA FUTURO DESARROLLO A BASE DE 1 POZO DE VISITA DE 2.50 DE ALTURA PROMEDIO 12 M. DE TUBO SANITARIO DE 20 CM. DE DIAMETRO S.M 20, 7 DE 7 √7.00 7.00 ✓ 0.00 / 7.00 √\$34,885.64 √\$244,199.48 1.6.1 PZA RENIVELACION DE BROCAL DE FOFO TIPO PESADO DE 160 KG, TAPON ESPIGA DE 20 CM. DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL. EQUIPO Y MANO DE OBRA. PREPARACION SANITARIA PARA FUTURO DESARROLLO A BASE DE 1 POZO DE VISITA DE 2.50 DE ALTURA PROMEDIO, RENIVELACION DE BROCAL DE FOFO TIPO PESADO DE 160 KG, PZA √\$24,585.03 \$24,585.03 /1.00 1.6.2 7 DE 7 /1.001.00 / 0.00 TAPON ESPIGA DE 20 CM, DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. PREPARACION SANITARIA PARA FUTURO DESARROLLO A PZA J 5.00 √ 0.00 / 5.00 \$1,226.28 \$6,131.40 1.6.3 BASE DE TAPON ESPIGA DE 20 CM. DIAMETRO INCLUYE: 7 DE 7 5.00 MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SUBTOTAL PREPARACION SANITARIA PARA FUTURO DESARROLLO \$274,915.91 SUBTOTAL NL \$5.088,846.67 IVA Jr) 1 \$814,215.47 TOTAL 10 (\$5,903,062.14 CONFORME AHRUEBA REVISA o.Bo. ING. ARISTOTELES SAQUELARES ING. LINO EDDCARDO RIOS MONTOYA MAHOME ING. JESUS RICARGO GAMEZ LEÓN ING/ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RODRÍGUEZ RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS COCI HOMES, S.A. DE C.V. SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN

> GENERAL DE CORAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN





GENERADORES HOJA DE 8

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y CONTRATO. CONT-DGOP-DC-073-16 √ ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC, SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE OBRA: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. COCI HOMES, S.A. DE C.V.√ CONTRATISTA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 ♥ GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) FECHA: CALCULÓ: ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ RESULTADO LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES Y/O EJE TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PZA CANTIDAD CROQUIS No. CONCEPTO TRAMO RED DE AGUA POTABLE 1.2 % de avance de esta estimación 1.2.1 TRAZO DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. M2~ 669.86 0.67 447.84 100% NIVELACION EN EL PROCESO DE LOS TRABAJOS. 669.86 -100% 1.2.2 M M 6 " Ø DEL CRUCERO 32 AL 33 27.07 M 6 " Ø **DEL CRUCERO 33 AL 34** 194.00 M DEL CRUCERO 34 AL 35 139.14 6 " Ø M 98.99 6 " Ø DEL CRUCERO 35 AL 73 DEL CRUCERO 35 AL 36 M 45.19 4 " Ø DEL CRUCERO 73 AL 74 M 136.91 4 " Ø M 3 " Ø DEL CRUCERO 74 AL 75 6.94 DEL CRUCERO 74 AL 80 M 21.62 3 " Ø EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO M3~ 506.98 100% 123 TIPO II EN SECO. DEL CRUCERO 32 AL 33 МЗ 27.07 0.70 1.15 6 " Ø 21.79 6 " Ø 156.17 DEL CRUCERO 33 AL 34 M3 194.00 0.70 1.15 МЗ 139.14 0.70 1.15 6 " Ø 112.01 DEL CRUCERO 34 AL 35 1.15 79.69 DEL CRUCERO 35 AL 73 M3 98.99 0.70 6 " Ø DEL CRUCERO 35 AL 36 МЗ 45.19 0.60 1.10 4 " Ø 29.83 4 " Ø 90.36 DEL CRUCERO 73 AL 74 М3 136.91 0.60 1.10 1.00 3"0 4.16 DEL CRUCERO 74 AL 75 M3 6.94 0.60 DEL CRUCERO 74 AL 80 МЗ 21.62 0.60 1.00 3 " Ø 12.97 AFINE A FONDO DE CEPA A MANO PARA COLOCACIÓN DE TUBERIA, EN MATERIAL TIPO II: INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO 447.84~ 100% 1.2.4 M2_ DE OBRA DEL CRUCERO 32 AL 33 M2 27.07 0.70 6 " Ø 18,95 M2 0.70 6 " Ø 135.80 DEL CRUCERO 33 AL 34 194.00 DEL CRUCERO 34 AL 35 M2 139.14 0.70 6 " Ø 97.40 DEL CRUCERO 35 AL 73 M2 98.99 0.70 6 " Ø 69.29 M2 0.60 4 " Ø 27.11 DEL CRUCERO 35 AL 36 45.19 DEL CRUCERO 73 AL 74 M2 136.91 0.60 4"0 82.15 M2 0.60 DEL CRUCERO 74 AL 75 3 " Ø 4.16 6.94 DEL CRUCERO 74 AL 80 M₂ 21.62 0.60 3 " Ø 12.97

REALIZO:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN GENERAL DE CBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ CONSTRUCCIÓN

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR





GENERADORES
HOJA 2
DE 8

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16 ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE. OBRA: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATISTA COCI HOMES, S.A. DE C.V. 15 DE DICIEMBRE DE 2016 J GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) FECHA: CALCULÓ: ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ LOCALIZACIÓN RESULTADO OBSERVACIONES Y/O CROQUIS No. CONCEPTO EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PZA CANTIDAD RED DE AGUA POTABLE 1.2 % de avance de esta estimación CAMA CON ARENA FINA PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA J 44.78 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 100% 1.2.5 M3 1,040.93 10.70 0.20 2.00 HUMEDAD, COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO. **DEL CRUCERO 32 AL 33** МЗ 27.07 0.70 0.10 6 " Ø 1.89 DEL CRUCERO 33 AL 34 0.70 6 " Ø 13.58 M3 194.00 0.10 9.74 DEL CRUCERO 34 AL 35 МЗ 139.14 0.70 0.10 6 " Ø DEL CRUCERO 35 AL 73 МЗ 98.99 0.70 0.10 6 " Ø 6.93 4 " Ø 2.71 DEL CRUCERO 35 AL 36 M3* 45.19 0.60 0.10 DEL CRUCERO 73 AL 74 M3 136.91 0.60 0.10 4 " Ø 8.21 0.60 3 " Ø 0.42 DEL CRUCERO 74 AL 75 M3 6.94 0.10 DEL CRUCERO 74 AL 80 МЗ 21.62 0.60 0.10 3 " Ø 1.30 100% ACOSTILLADO CON ARENA FINA. INCLUYE: MATERIALES, MANO J 185.25 M3~ **M3** 0.2973 6 " Ø 8.05 DEL CRUCERO 32 AL 33 27.07 DEL CRUCERO 33 AL 34 **M3** 194.00 0.2973 6 " Ø 57.68 МЗ 139.14 0.2973 6 " Ø 41.37 DEL CRUCERO 34 AL 35 DEL CRUCERO 35 AL 73 **M3** 98.99 0.2973 6 " Ø 29.43 МЗ 4 " Ø DEL CRUCERO 35 AL 36 45.19 0.2329 10.52 МЗ 0.2329 31.88 DEL CRUCERO 73 AL 74 136.91 4"0 МЗ 0.2212 3 " Ø 1.53 DEL CRUCERO 74 AL 75 6.94 DEL CRUCERO 74 AL 80 M3 21.62 0.2212 3 " Ø 4.78 RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE 1.2.7 IMPACTO EN CAPAS DE 0.20 MT. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: M3 -267.40 100% INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA. MANO DE OBRA. HERAMIENTA Y ACARREOS. DEL CRUCERO 32 AL 33 M3 27.07 0.70 0.60 6 " Ø 11.37 МЗ 194.00 0.60 6"Ø 81.48 DEL CRUCERO 33 AL 34 0.70 58.44 DEL CRUCERO 34 AL 35 МЗ 139.14 0.70 0.60 6 " Ø DEL CRUCERO 35 AL 73 МЗ 0.70 0.60 6 " Ø 41.58 98.99 DEL CRUCERO 35 AL 36 МЗ 45.19 0.60 0.60 4 " Ø 16.27 МЗ 4 " Ø DEL CRUCERO 73 AL 74 136.91 0.60 49.29 0.60 DEL CRUCERO 74 AL 75 M3 0.52 3 " Ø 2.18 6.94 0.60 DEL CRUCERO 74 AL 80 МЗ 0.60 0.52 3 " Ø 6.79 21.62

REALIZO:

DIRECCIÓN GENERAL DE CBRAS PUBLICAS

ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEDIRECCIÓN DE COCI HOMES, S.A. DE C.V.

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR





GENERADORES
HOJA 3
DE 8

				CONT-DGOP-DC-073-16 COCI HOMES, S.A. DE C.V.							
GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO)							FECHA:		15 DE DICIEMBRE DE 2016		
ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ											
		LOCALIZACIÓN							BESUITADO	OBSERVACIONES Y	
CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD	CROQUIS	
RED DE AGUA POTABLE										% de avance de es	
CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE OBRA A 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MEDIDO EN BANCO.				мз	506.98		-267.40		239.58 🗸	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 3"			Т	M	/	T-			28.56	100%	
		DEL CRUCERO 74 AL 75		M	6.94			3 " Ø	6,94_		
	_	522 011002110 1111200	_		21.02			- U	21.02		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4"				M					182.10 √	100%	
		DEL CRUCERO 35 AL 36 DEL CRUCERO 73 AL 74		M	45.19 136.91			4"Ø 4"Ø	45.19 136.91		
HIDRAULICA RD-41 INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL,				M-/	/				459.20	100%	
		DEL CRUCERO 32 AL 33			27.07			6"Ø	27.07		
	_	DEL CRUCERO 33 AL 34	-		194.00	-				4	
	-	DEL CRUCERO 34 AL 35 DEL CRUCERO 35 AL 73	-	-	139.14 98.99	-	-	6"Ø	139.14 98.99	1	
	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAM LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ CONCEPTO RED DE AGUA POTABLE CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE OBRA A 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MEDIDO EN BANCO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 3" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 4" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 6" HIDRAULICA RD-41 INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL, PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FR LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ CONCEPTO EJE RED DE AGUA POTABLE CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE OBRA A 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MEDIDO EN BANCO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 3" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 4" HIDRAULICA RD-41 INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL, PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLA LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ CONCEPTO RED DE AGUA POTABLE CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE OBRA A 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MEDIDO EN BANCO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 3" DEL CRUCERO 74 AL 75 DEL CRUCERO 74 AL 80 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 4" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 6" HIDRAULICA RD-41 INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL, PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. DEL CRUCERO 32 AL 33 DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 33 AL 34	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIOI LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ LOCALIZACIÓN EJE TRAMO TIPO RED DE AGUA POTABLE CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE OBRA A 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MEDIDO EN BANCO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 3" DEL CRUCERO 74 AL 75 DEL CRUCERO 74 AL 80 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 4" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 4" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 6" HIDRAULICA RD-41 INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL, PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. DEL CRUCERO 32 AL 33 DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 33 AL 34	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DI LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ CONCEPTO RED DE AGUA POTABLE CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE OBRA A 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MEDIDO EN BANCO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 3" DEL CRUCERO 74 AL 75 DEL CRUCERO 74 AL 80 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" HIDRAULICA RO-41 INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL, PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. DEL CRUCERO 32 AL 33 DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 33 AL 35	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ CONCEPTO RED DE AGUA POTABLE CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE OBRA A 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MEDIDO EN BANCO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 3" DEL CRUCERO 74 AL 75 DEL CRUCERO 74 AL 80 M 45.19 DEL CRUCERO 73 AL 74 M 136.91 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" HIDRAULICA RD-41 INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL, PRUEDA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 34 AL 35 DEL CRUCERO 35 AL 36 M 194.00 DEL CRUCERO 34 AL 35 DEL CRUCERO 35 AL 36 DEL CRUCERO 36 AL 35 DEL CRUCERO 37 AL 35 DEL CRUCERO 36 AL 35 DEL CRUCERO 37 AL 3	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, CONTRA GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ CONCEPTO EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO RED DE AGUA POTABLE CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE OBRA A 1 12R KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MEDIDO EN BANCO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 3" DEL CRUCERO 74 AL 75 DEL CRUCERO 74 AL 80 M 45.19 DEL CRUCERO 73 AL 74 M 136.91 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" HIDRAULICA RD-41 INCLUYE: MOYIMIENTO DE MATERIAL, PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. DEL CRUCERO 33 AL 33 DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 33 AL 35 DEL CRUCERO 34 AL 35 DEL CRUCERO 35 AL 36 DEL CRUCERO 35 AL 35 D	CONTRATISTA GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTO CONCEPTO EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO RED DE AGUA POTABLE CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE OBRA A 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MEDIDO EN BANCO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" DEL CRUCERO 74 AL 75 DEL CRUCERO 74 AL 60 M 45.19 DEL CRUCERO 73 AL 74 M 136.91 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" HIDRAULICA RD-41 INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL, PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 33 AL 35 DEL CRUCERO 33 AL 36 DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 34 AL 35 DEL CRUCERO 35 AL 36 DEL CRUCERO 34 AL 35 DEL CRUCERO 35 AL 36 DEL CRUCERO 36 AL 35 DEL CRUC	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, CONTRATISTA CONTRATISTA GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTO EJE LOCALIZACIÓN EJE TRAMO TIPO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO FZA RED DE AGUA POTABLE CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE OBRA A 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MEDIDO EN BANCO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 3" DEL CRUCERO 74 AL 75 DEL CRUCERO 74 AL 80 M 21.62 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 4" DEL CRUCERO 75 AL 74 M 136.91 A " Ø SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 6" HIDRAULICA RD-41 INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL, PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. DEL CRUCERO 33 AL 34 DEL CRUCERO 34 AL 35 DEL CRUCERO 35 AL 36 DEL CRUCERO 34 AL 35 DEL CRUCERO 35 AL 36 DEL CRUCERO 35 AL 35 DEL CRUCERO 35 AL 36	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, CONTRATISTA COCTHOMES, S. CONTRATISTA COCTHOMES, S. COCHER, S. COCHER, S. COCHER, S. COCHER, S. COCHER, S. COCHER,	



DIRECCIÓN GENERAL DE C BRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REALIZO:

ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V.

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR





GENERADORES HOJA DE

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, S							TO:		CONT-DGOP-D	C-073-16 🗸		
OBRA:	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRA VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		CONTRATISTA		COCI HOMES, S.A. DE C.V.								
	GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO)							FECHA:	15 DE DICIEMBRE DE 2016 «				
CALCULÓ:	ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ												
	<u></u>		LOCALIZACIÓN							RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O		
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD	CROQUIS		
1.3	DRENAJE PLUVIAL										% de avance de esta estimación		
1.3.1	TRAZO DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO.				_/M2	15.62	1.30			20.31	100%		
1.3.2	NIVELACION EN EL PROCESO DE LOS TRABAJOS.				JM	15.62			60 CM Ø	15.62	100%		
1.3.3	EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS A PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO II EN SECO.				_ /мз	15.62	1.30	2.09	60 CM Ø	42.34	100%		
1.3.4	AFINE A FONDO DE CEPA A MANO PARA COLOCACIÓN DE TUBERIA, EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	1 1			/ _{M2}	15.62	1.30		60 CM Ø	20.31	100%		
1.3.5	CAMA CON GRAVON PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HUMEDAD COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO.				√ _{M3}	15.62	1.30	0.10	60 CM Ø	2.03 ✓	100%		
1.3.6	CAMA CON GRAVON PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HUMEDAD COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO.	1 1			Мз	15.62	1.30	0.63	60 CM Ø	9.80 🗸	100%		
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 60 CM. (24") E DIAMETRO POLIETILENO ALTA DENSIDAD, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				/ _{ML}	15.62		2.60	60 CM Ø	15.62 🗸	100%		



REALIZO:

DIRECCIÓN DE ONSTRUCCIÓN

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON

ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR





GENERADORES
HOJA 5
DE 8

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, S							TO:		CONT-DGOP-D	C-073-16	
BRA:	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRA VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							ПЅТА	COCI HOMES, S.A. DE C.V.			
	GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO)	-						FECHA:	15 DE DICIEMBRE DE 2016			
ALCULÓ	: ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ											
			LOCALIZACIÓN							RESULTADO	OBSERVACIONES Y/C	
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD	CROQUIS	
1.4	TERRACERIAS										% de avance de esta estimación	
1.4.2	NIVELACION DE TERRACERIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL EN CALLES, INCLUYE: MATERIALES, CAL, MADERA, EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA Y CONSERVACION DE NIVELES EN TODAS LAS ETAPAS DE CONSTRUCCION. NOTA: EL TRAZO LO DARA LA PARTE CONTRATANTE.				М2 •	1,040.93	10.70		2.00	11,137.94	50% 🗸	
1.4.7	FORMACION DE SUBASE DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL BALASTRE CRIBADO, COMPACTADO AL 90% DEL P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COMPACTADO, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				M2	/1,040.93	10.70	0.20	2.00	2,227.58	50% -	
1.4.8	FORMACION DE BASE DE 20 CM. DE ESPESOR CON BALASTRE CRIBADO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD.INCLUYE: MEZCLADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTACION.	1 1			M2	1,040.93	10.70	0.20	2.00	2,227.58	50%	
1.4.9	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1 A RAZON DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE:BARRIDO DE LA BASE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				M2 .	1,040.93	10.70		2.00	11,137.94	50%	

DIRECCIÓN GENERAL DE CBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REALIZO:

ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V. ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR

MANDAMENTO

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



GENERADORES HOJA DE

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, S ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRA						CONTRA	ro:		CONT-DGOP-DO	C-073-16 \square
RA:	VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	ANIO I	RACC. SANTA TERESA	A DL	D. FION		CONTRA	TISTA	3	COCI HOMES, S.	A. DE C.V.
	GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO)							FECHA:		15 DE DICI	EMBRE DE 2016
LCULÓ:	ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ										
		-	LOCALIZACIÓN				11111111			RESULTADO	OBSERVACIONES Y
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD	CROQUIS
1.5	PAVIMENTOS				/						% de avance de e estimación
1.5.1	TRAZO DE LA RED CON EQUIPO TOPOGRAFICO.				√ M2	861.22	10.70		2.00	11,979.62 🗸	65%
1.5.2	NIVELACION DE TERRACERIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL EN CALLES, INCLUYE: MATERIALES, CAL, MADERA, EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA.				J M2	997.42	10.70		2.00	13,874.15	65%
1.5.3	GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L Ó PECHO DE PALOMA TRAMO RECTO DE 70 CM. DE ANCHO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EN VACIADO, TENDIDO, VIBRADO, ACARREOS AGUA PARA ALBAÑILERIA, CURADO Y HERRAMIENTAS.				JML	1,661.90	1.00		2.00	664.76 √	20%
1.5.4	GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L Ó PECHO DE PALOMA TRAMO CURVO DE 70 CM. DE ANCHO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EN VACIADO, TENDIDO, VIBRADO, ACARREOS AGUA PARA ALBAÑILERIA, CURADO Y HERRAMIENTAS.				$\sqrt{_{PZA}}$				646.25	323.13	50%
1.5.5	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 300 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., e=15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN VACIADO, TENDIDO, VIBRADO, ACARREOS, AGUA PARA ALBAÑILERIA, CURADO Y HERRAMIENTAS.	4	Tramo PTE de C. Rivera de los Alamos a Pioneros		√M2	310.64	9.50		1.00	2,951.04	20%
			Tramo de C. Aralia a C. Rivera de los Alamos		/M2	50.00	8.10		2.00	405.00	
			Tramo PTE de C. Abedul a C. Aralia		J _{M2}	50.00	6,60		2.00	330.00	
	El .	_							SUMA	3,686,04	
											1
1.5.6	JUNTA DE DILATACION DE 1.5" DE PVC INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	0			√ _M	3,109.40	1.00		2.00	1,243.76 🗸	20%

REALIZO:

ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ

COCI HOMES, S.A. DE C.V.



ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON

SUPERVISOR





GENERADORES
HOJA 7
DE 8

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL								CONT-DGOP-DC-073-16 ✓				
BRA:	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAM LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	[CONTRATISTA		COCI HOMES, S.A. DE C.V.			
	GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO)							FECHA:		15 DE DIC	CIEMBRE DE 2016		
ALCULÓ	: ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ												
			LOCALIZACIÓN							RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O		
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD	CROQUIS		
1.5	PAVIMENTOS										% de avance de esta estimación		
1.5.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A CADA 50 M. COMO MAXIMO, HECHO A BASE DE PASAJUNTA DE 60 CM. DE LONGITUD CON VARILLA LISA DE 5/8" @ 30 CM. DE LA CUAL LA MITAD QUEDARA AHOGADA EN LA LOSA Y LA OTRA MITAD SE ARTICULARA CON GRASA PARA CHASIS Y FORRO DE POLIDUCTO NARANJA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HOJA DE CARTON ASFALTADO DE 1=3 MM, EN TODO EL ESPESOR DE LA LOSA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.				√M	241.90	1.00		2.00	96.76	20%		
1.5.9	RENIVELACION DE POZO DE VISITA COMÚN EN UNA PROF. ÁPROX. DE 90 CM. INCLUYE: ENRASE DE MURO ENJARRADO PULIDO, BROCAL, DE FOFO TIPO PESADO 160 KG, ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO PROTECCION PROVISIONAL CON MADERA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS (EN BOULEVARES).				√pza					24.00 🗸	100%		
			SANITARIO		PZA	/			20.00	20.00			
			PLUVIAL		PZA /				4.00	4.00	1		



REALIZO:

ING. ARISTÓTELES SAQUELARES RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V.

VoBo:

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR





GENERADORES
HOJA 8
DE 8

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,	SERVIC	CIOS DE AGUA POTABLE	, DR	ENAJE P	LUVIAL Y	CONTRA	TO:		CONT-DGOP-I	OC-073-16
OBRA:	ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE, TRAM LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	O FRAC	C. SANTA TERESA A BLVD	NEROS DI		CONTRATISTA		COCI HOMES, S.A. DE C.V.			
	GENERADORES ESTIMACION No. 4 (CUATRO)							FECHA:		15 DE DIO	CIEMBRE DE 2016
CALCULÓ:	ING. HERNAN CASTRO RODRIGUEZ										
			LOCALIZACIÓN							RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD	CROQUIS
1.6	PREPARACION SANITARIA PARA FUTURO DESARROLLO										% de avance de esta estimación
1.6.1	PREPARACION SANITARIA PARA FUTURO DESARROLLO A BASE DE 1 POZO DE VISITA DE 2.50 DE ALTURA PROMEDIO 12 M. DE TUBO SANITARIO DE 20 CM. DE DIAMETRO S.M 20, RENIVELACION DE BROCAL DE FOFO TIPO PESADO DE 160 KG, TAPON ESPIGA DE 20 CM. DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				PZA ←	/			7.00	∱ 7.00	100%
1.6.2	PREPARACION SANITARIA PARA FUTURO DESARROLLO A BASE DE 1 POZO DE VISITA DE 2.50 DE ALTURA PROMEDIO, RENIVELACION DE BROCAL DE FOFO TIPO PESADO DE 160 KG, TAPON ESPIGA DE 20 CM. DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				PZA .				1.00	1.00	100%
1.6.3	PREPARACION SANITARIA PARA FUTURO DESARROLLO A BASE DE TAPON ESPIGA DE 20 CM. DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				PZA				5.00	J 5.00	100%



REALIZO:

ING. ARISTÓTEVES SAQUELARES RODRÍGUEZ COCI HOMES, S.A. DE C.V. ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR





CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUÁ POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONT-DGOP-DC-073-16


NÚMERO DE CONTRATO:

15 DE DICIEMBRE DE 2016 √

FECHA:

Del 01 de Diciembre de 2016 al 15 de Diciembre de 2016 J

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA

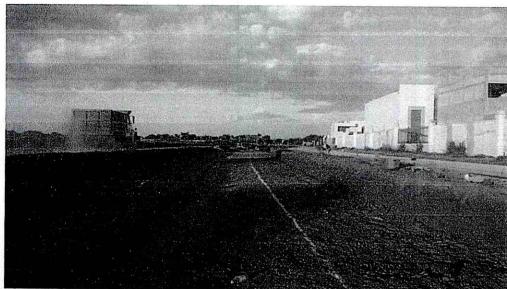







1





CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.√

NOMBRE DE LA OBRA:


CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONT-DGOP-DC-073-16

NÚMERO DE CONTRATO:

FECHA:

15 DE DICIEMBRE DE 2016√



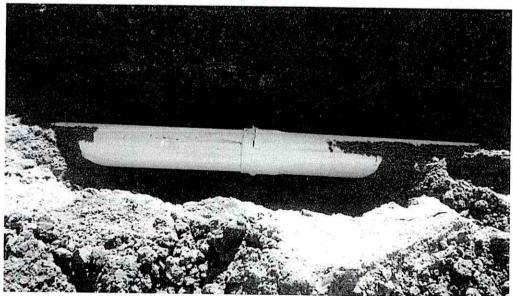











CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V. /


NOMBRE DE LA OBRA:


CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NÚMERO DE CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16 √

15 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA:









DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.


NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS/DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NÚMERO DE CONTRATO:

FECHA:

CONT-DGOP-DC-073-16 J 15 DE DICIEMBRE DE 2016 J

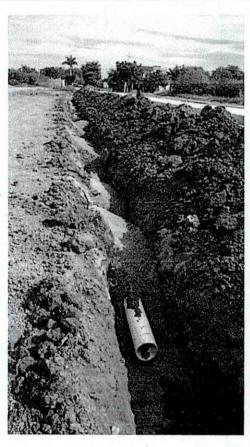











CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.√

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONT-DGOP-DC-073-16

NÚMERO DE CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073

15 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

FECHA:







DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NÚMERO DE CONTRATO:

FECHA:

CONT-DGOP-DC-073-16 15 DE DICIEMBRE DE 2016 J











CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA:


NÚMERO DE CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONT-DGOP-DC-073-16

15 DE DICIEMBRE DE 2016 /

FECHA:



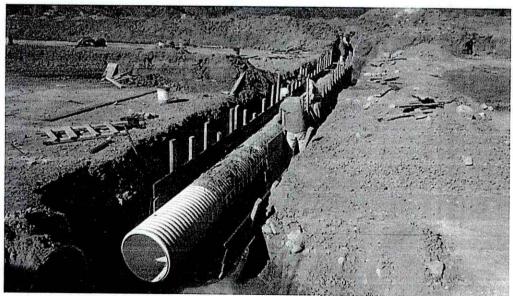







DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.VV

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONT-DGOP-DC-073-16

NÚMERO DE CONTRATO:

FECHA:

15 DE DICIEMBRE DE 2016





DIRECCIÓN CENERAL DE C JRAS PUBLICAS LIRECCIÓN DE UNSTRUCCION





CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.


NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

NÚMERO DE CONTRATO:

FECHA:

CONT-DGOP-DC-073-16 15 DE DICIEMBRE DE 2016

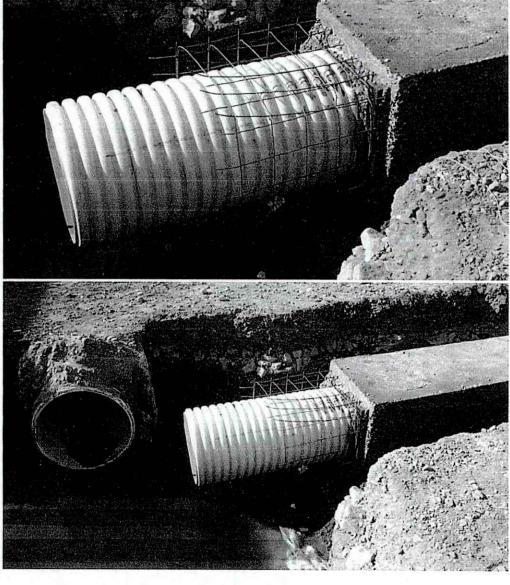



DIRECCIÓN CENERAL DE C GRAS PUBLICAS CIRECCIÓN DE ONSTRUCCIÓN











CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.


NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO, DE AHOME, SINALOA:

NÚMERO DE CONTRATO:

FECHA:

CONT-DGOP-DC-073-16 J 15 DE DICIEMBRE DE 2016

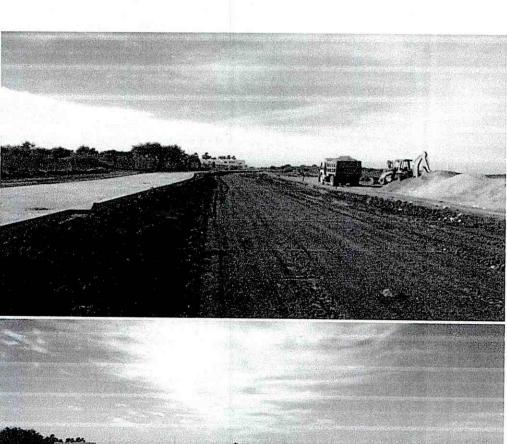













CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.


NOMBRE DE LA OBRA:

NÚMERO DE CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONT-DGOP-DC-073-16

15 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

FECHA:

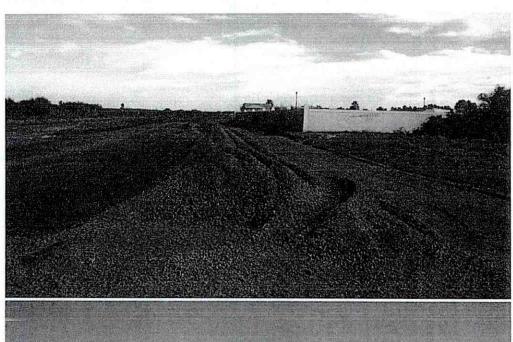





VISTRUCCIÓN











CONTRATISTA:


COCI HOMES, S.A. DE C.V.


NOMBRE DE LA OBRA:


CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD, RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONT-DGOP-DC-073-16

NÚMERO DE CONTRATO:

FECHA:



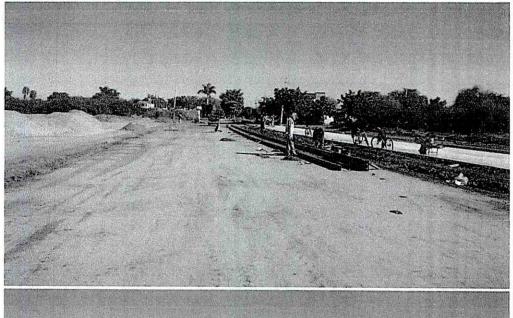

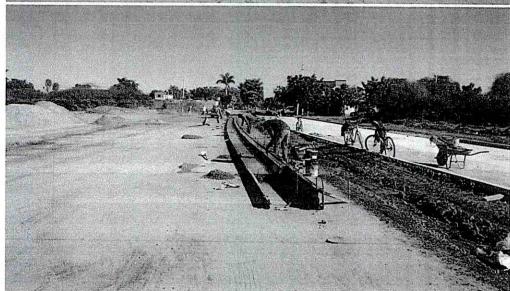











CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V. J

NOMBRE DE LA OBRA:


CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONERÓS DEL VALLE,

LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOAY
CONT-DGOP-DC-073-16 /

NÚMERO DE CONTRATO:

FECHA:

15 DE DICIEMBRE DE 2016√

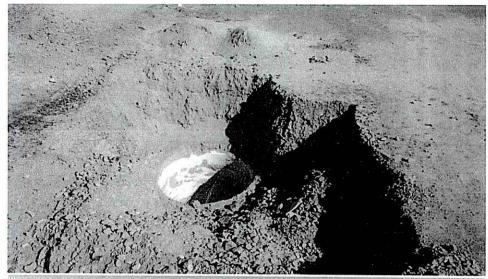











CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.


NOMBRE DE LA OBRA:

NÚMERO DE CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONT-DGOP-DC-073-16 /

FECHA:

15 DE DICIEMBRE DE 2016

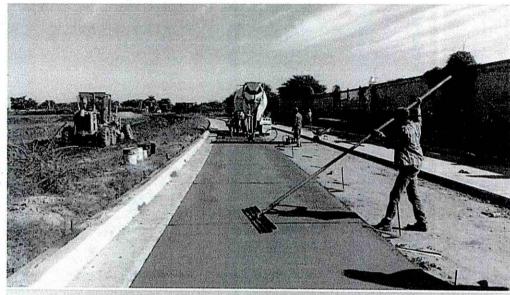





DIRECCIÓN CENERAL DE CBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN







CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.


NOMBRE DE LA OBRA:


CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO, DE AHOME, SINALOA.

LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOM CONT-DGOP-DC-073-16 J 15 DE DICIEMBRE DE 2016 J

NÚMERO DE CONTRATO:

FECHA:

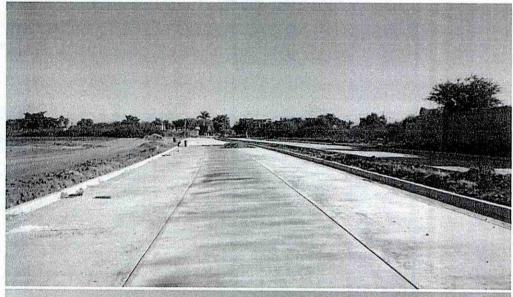

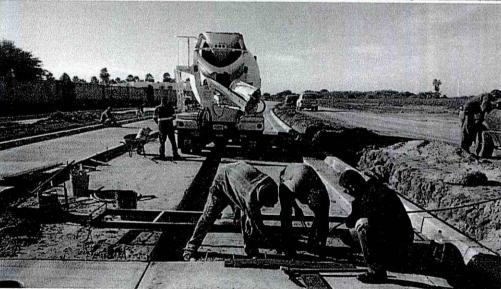









CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA:


CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NÚMERO DE CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-073-16 √ 15 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA:



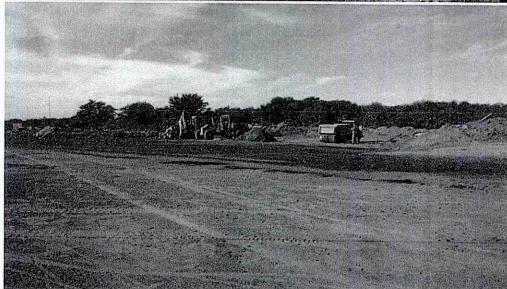









CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.


NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NÚMERO DE CONTRATO:

FECHA:

CONT-DGOP-DC-073-16 15 DE DICIEMBRE DE 2016

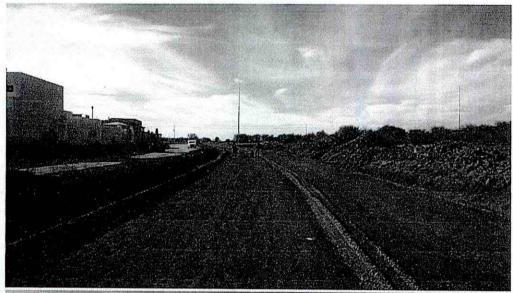











CONTRATISTA:

COCI HOMES, S.A. DE C.V.J


NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONERÓS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NÚMERO DE CONTRATO:

FECHA:

15 DE DICIEMBRE DE 2016 /

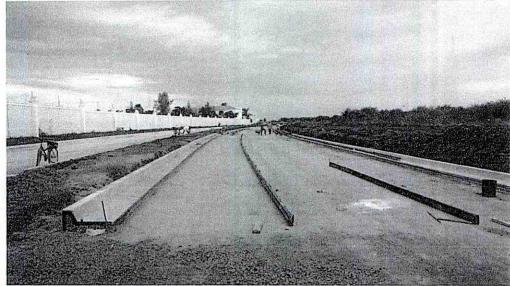











Gobierno Municipal Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y
ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE,
TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No.

018

UBICACIÓN: BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATISTA: COCI HOMES, S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16 ✓ No. DE **FECHA NOTAS Y CROQUIS** NOTA TIPO DE NOTA rena NERAL DE AS PUBLICAS DIRECCIÓN DE TRUCCIÓN perol ecomen runn



Gobierno Municipal Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y
ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE,
TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No.

UBICACIÓN: BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

SINALOA V

CONTRATISTA: COCI HOMES, S.A. DE C.V. √ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16 No. DE **FECHA NOTAS Y CROQUIS** NOTA TIPO DE NOTA DUVS con SUBOSC Framo 1900 en SUV GENERAL DE BE NOIS NATRUCCIÓN



Gobierno Municipal

Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y
ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE,
TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 020

CONSTRUCC

UBICACIÓN: BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16

NO. DE FECHA

NOTA TIPO DE NOTA

TIPO DE NOTA

TODO 12 / 16 Sc termina completamente el ques

de subare, se contro de contro de la parce,

Trabas as a contro de cont



Gobierno Municipal Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y
ALCANTARILLADO EN PROLONGACION BOULEVARD RIO FUERTE,
TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No.

UBICACIÓN: BOULEVARD RIO FUERTE, TRAMO FRACC. SANTA TERESA A BLVD. PIONEROS DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATISTA: COCI HOMES, S.A. DE C.V. J

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-073-16

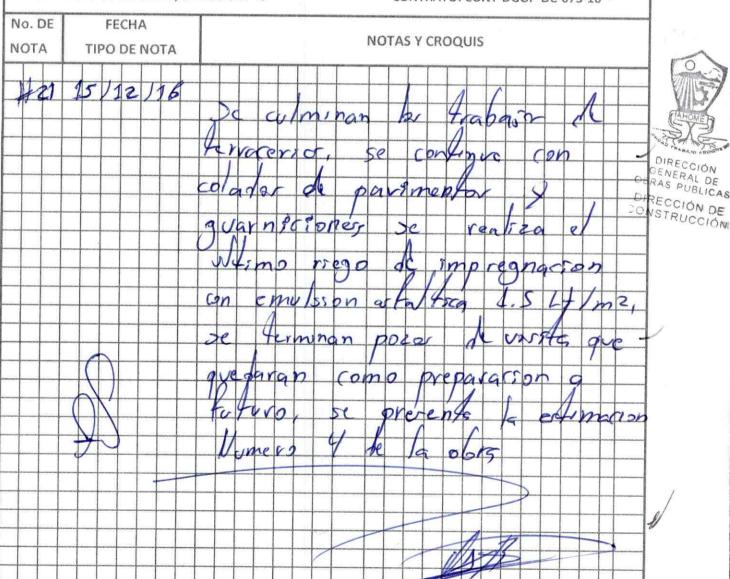



Coci Homes, S.A. de C.V.

* R.F.C. CHO-031218-69A Serapio Rendón No. 315 Pte. Col. Centro Tel. 01 (668) 816 7611 Los Mochis, Sinaloa.

C. Ing. Ricardo Maldonado Islas Director General de Obras Públicas. Presente.-

Por medio de la presente, manifiesto "bajo protesta de decir verdad" lo siguiente:

- 1).- Haber presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, correspondientes a los últimos ejercicios fiscales, asi como también hemos presentado las declaraciones que contienen los pagos provisionales correspondientes a los 5 últimos ejercicios fiscales.
- 2).- Que no tengo adeudos fiscales firmes a mi cargo por impuestos federales.

Comunico que no se incurrió durante el año 2016, en los causales de revocación a que hace referencia el articulo No. 66, Fracción de III, del Código Fiscal de la Federación, además comunico a usted estar al corriente con la declaración anual, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior al presente.

Como prueba de lo anterior, anexo opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (positiva), de conformidad a lo establecido en el Articulo No. 32-D, del mismo código.

Sin más por el momento quedo a su apreciable consideración.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a los 01 días de Febrero de 2017.

Atentamente

C. Aristóteles Saquelares Rodríguez Representante legal COCI HOMES, S.A. DE C.V. DIRECCIÓN DE PASTRUCCIÓN





FECHA: oi de febrero de 2017

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

17NA1568804

Clave de R.F.C.:

CHO03121869A

Nombre, Denominación o Razón social: COCI HOMES SA DE CV

GENERAL : OBRAS PUBL

DIRECCIÓN

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día o1 de febrero de 2017, a las 11:39 horas

NOTAS:

- La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.
- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.-Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales. obligaciones fiscales
- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMA¿S elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

8

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del

Cadena Original:

||CH003121869A|17NA1568804|01-02-2017|P||000001000007000112188||

Sello Digital:

Gk2mIZGvw6H89F402AHAFsufPX59bczpCQ8Fh79flCrW74hs8wGYeaaO4t7ph9WUrhAyMXGIDucF6254nne3FAgwCD 4FulaKRbGepaK5hE/gmK3DwL1FZVuMVnIBsL908GRWyCQvUjS/P49ZgZXrgkWgegxtYtmLx1xJ202ZZ1A=





CERTIFICADO DE NO ADEUDO

FOLIO: 11876

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE	E LA PRESENTE Y DANDO UNA MIN	UCIOSA BÚSQUEDA EN LOS
COCI HOMES, SA DE CV	NCIA HACEMOS CONSTAR QUE EL C:_	
NO TIENE NINGÚN ADEUDO	O ANTE ESTE MUNICIPIO DE AHON	ME DE ACUERDO A LO QUE
ESTABLECE LA LEY DE HACIEN	NDA MUNICIPAL ARTÍCULO 4, ASÍ CO	DMO EL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL	L ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SIN	NALOA, POR CONCEPTO DE:
MULTAS MUNICIPALES Y FEDER	RALES, IMPUESTO PREDIAL, SERVICIO	OS Y PERMISOS.
SE EXTIENDE LA PRESENTE A L	LOSDÍAS DEL MES DE	ENERO
DEL AÑO 20PARA LOS	FINES QUE EL INTERESADO ESTIME F	PERTINENTE. OBRAS PUE
TRAMITE EXCLUSIVO ANTI	E OBRAS PUBLICAS	MSTRUC
CONTRATISTA		GOBIERNO MUNICIPAL
	ATENTAMENTE	AHOME
\cap	10 P	TESORERÍA MUNICIPAL

C. DANIEL GPE. GARCÍA LEÓN DIRECTOR DE INGRESOS

