



Sección de: D.G.O.P.

Oficio No.: S/N

Expediente:

Asunto: El que se indica

Lic. Elliot Ascarrega Beltrán
Tesorero Municipal,
Municipio de Ahome.
Presente. -

Anexo al presente envío para su revisión y pago, estimación no. 1 Uno de la obra (Cuarta del contrato) factura, carta de no adeudo fiscal, carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, números generadores, oficio de autorización de inversión, constancia de no adeudo al buro municipal, oficio de aviso de inicio, reporte fotográfico, hojas de bitácora, asignación superintendente, asignación de supervisor y oficio de aviso de inicio enviado a contraloría, la siguiente obra:

Importe Total Estimado: \$ 878,590.43

Importe Estimado a Pagar: \$ 611,226.27

No. de contrato	Obra	Contratista
PROGREG/DGO P-DC-01- AH/2016	-Construcción De Conjunto Deportivo "El Estero". Ubicado En Juan José Ríos (El Estero). Municipio De Ahome, Sinaloa. Pavimento Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Servicios De La Calle Timoteo Félix, De Eligio Armenta A Simón Soto Y Construcción De Banquetas Oriente Y Poniente De Crescencio Vázquez A Simón Soto. Construcción De Parque Lineal Mochicahui Ubicado En Dren Mochicahui De José María Morelos A Benito Juárez, En Los Mochis, Municipio De Ahome, Sinaloa. - Rehabilitación De Conjunto De Parques Vecinales En El Fraccionamiento El Parque, Los Mochis, Municipio De Ahome, Sinaloa.	Maribel Cristina Moreno López

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración quedo de Ud. muy.

Atentamente
"AHOME, TRABAJAMOS CONTIGO"
Los Mochis, Sin., 13 de Marzo de 2017

C. Ing. Josué Jacinto Sánchez Ruelas
Director General de Obras Públicas



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C.c.p' C. Lic. Pavel Roberto Castro Félix. -Director de Contraloría Municipal
C.c.p' C. Lic. Anselmo Acosta Bojórquez. -Director de Egresos.
C.c.p' C. Daniel Kim Ortega. -Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento

ARCHIVO



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC
COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SIN.
R.F.C. MAH-170101-3C0

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

TELÉFONOS
CONMUTADOR (668) 816 40 00
OFICINA: (668) 816 40 22
FAX (668) 816 50 06



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

Municipio de Ahome

C. Lic. Arturo Duarte García
Presidente Municipal
Presente:

Por medio del presente y ante la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios de la siguiente obra:


Núm.	Obra	Inversión (Importe Neto)	Origen del Recurso
1.-	Construcción de conjunto "Estero" ubicado en Juan José Ríos (El Estero) Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 6' 014,804.23	Recursos Federales del Programa Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Programas regionales 2016) Ejercicio fiscal 2016.

Y tomando en cuenta el presupuesto de la misma, hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para su ejecución.

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración al respecto, quedo de Ud. muy

Atentamente
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
Los Mochis, Sin., a 01 de Octubre de 2016.

C. Lic. Juan Tachna Félix
Tesorero Municipal



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C.C.P. C. Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya - Director General de Obras Públicas - Pte.
C.C.P. Archivo -
Ofinver



MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

AV. PARQUE NOROESTE, OTE 540 Colonia: EL PARQUE

LOS MOCHIS AHOME SINALOA, MEXICO. C.P. 81259

RFC: MOLM820221DU2 CURP: MOLM820221MSLRPR01

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TEL.: (668) 190 28 90 EMAIL: maribelmoreno82@outlook.com

Factura

7

Folio fiscal

BBD00EE0-B558-4DA5-95DC-883E980A6CE2

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000403442064

No. Certificado Emisor

00001000000404363875

Fecha de Certificación

13/03/2017 01:45:14 p.m.

Lugar y Fecha de Elaboración

LOS MOCHIS, SINALOA

13/03/2017 11:51:48 a.m.

Cliente:

MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N Colonia: BIENESTAR

LOS MOCHIS AHOME SINALOA, MEXICO. C.P. 81280

RFC: MAH1701013C0

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio U.	Importe
	PAGO DE ESTIMACION N° 1 (UNO) DE LA OBRA (CUARTA DEL CONTRATO) RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	NA	1.000	757,405.54	757,405.54
	CONTRATO N° PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016	NA			
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NA	1.000	-227,221.66	-227,221.66
	\$ 227,221.66	NA			
	AMORTIZACION DE ANTICIPO \$ 263,577.13				
	0.5 % CONTROL Y VIGILANCIA \$ 3,787.03				
	SUMA DEDUCCIONES \$ 267,364.16				
	IMPORTE A RECIBIR \$ 611,226.27				

Subtotal: 530,183.88

Ret. IVA: 0.00

Ret. ISR: 0.00

IEPS: 0.00

IVA: 84,829.42

Total: 615,013.30

Condiciones de pago: Crédito

Método de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Núm. Cta. Pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN

T.C.: 1.00

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

(SON: SEISCIENTOS QUINCE MIL TRECE PESOS 30/100 M.N.)

Observaciones

Sello digital del CFDI

10d11R1VXnk2SITs8F+9sR9ZZD6nV/116wCi207mHgyHDow7cbCykQUQOufqEigM+87J+b2KdGVRplsWuYwRiOitzyFK6B+SdJpZzVpkaD90XaRcuLMAWIL440877F32xpFVL+2HGIDRencugfDGBN5XJl9d8Br6JuYv3oHhEKJ0IRerfsYcHVdnyFqedw40JuBaef1PcEodPqTs8MwXjV2oVpca8Mln4ZV8QH0b5QU1wVozJqMAwTyAZL32U/CwmlEJaRuN1Y890pIYtfs+YR6yv59HNEquE15e4ZK1FdwXYx4p1OaYJmB8aiA==

Sello digital del SAT

uNP3WhtbzpD3FjCY7zUuUgLyAuQW2MQhGeDC0e8E38VnikQ5GFp01ZGkNskns4QJ00S1XZX7G+7wzHD58eAx59J8mEa7DmCepRWenXARcuLMAWIL440877F32xpFVL+2HGIDRencugfDGBN5XJl9d8Br6JuYv3oHhEKJ0IRerfsYcHVdnyFqedw40JuBaef1PcEodPqTs8MwXjV2oVpca8Mln4ZV8QH0b5QU1wVozJqMAwTyAZL32U/CwmlEJaRuN1Y890pIYtfs+YR6yv59HNEquE15e4ZK1FdwXYx4p1OaYJmB8aiA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.0BBD00EE0-B558-4DA5-95DC-883E980A6CE22017-03-13T13:45:14J10d11R1VXnk2SITs8F+9sR9ZZD6nV/116wCi207mHgyHDow7cbCykQUQOufqEigM+87J+b2KdGVRplsWuYwRiOitzyFK6B+SdJpZzVpkaD90XaRcuLMAWIL440877F32xpFVL+2HGIDRencugfDGBN5XJl9d8Br6JuYv3oHhEKJ0IRerfsYcHVdnyFqedw40JuBaef1PcEodPqTs8MwXjV2oVpca8Mln4ZV8QH0b5QU1wVozJqMAwTyAZL32U/CwmlEJaRuN1Y890pIYtfs+YR6yv59HNEquE15e4ZK1FdwXYx4p1OaYJmB8aiA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI - Página 1 de 1



MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

AV. PARQUE NOROESTE, OTE 540 Colonia: EL PARQUE

LOS MOCHIS AHOME SINALOA, MEXICO. C.P. 81259

RFC: MOLM820221DU2 CURP: MOLM820221MSLRPR01

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TEL.: (668) 190 28 90 EMAIL: maribelmorano82@outlook.com

Factura
7
Folio fiscal
BBD00EE0-B558-4DA5-95DC-883E980A6CE2
No de Serie del Certificado del SAT
00001000000403442064
No. Certificado Emisor
00001000000404363875
Fecha de Certificación
13/03/2017 01:45:14 p.m.
Lugar y Fecha de Elaboración
LOS MOCHIS, SINALOA
13/03/2017 11:51:48 a.m.

Cliente:

MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N Colonia: BIENESTAR

LOS MOCHIS AHOME SINALOA, MEXICO. C.P. 81280

RFC: MAH1701013C0

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio U.	Importe
	PAGO DE ESTIMACION N° 1 (UNO) DE LA OBRA (CUARTA DEL CONTRATO) RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	NA	1.000	757,405.54	757,405.54
	CONTRATO N° PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016	NA			
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NA	1.000	-227,221.66	-227,221.66
	\$ 227,221.66	NA			
	AMORTIZACION DE ANTICIPO \$ 263,577.13				
	0.5 % CONTROL Y VIGILANCIA \$ 3,787.03				
	SUMA DEDUCCIONES \$ 267,364.16				
	IMPORTE A RECIBIR \$ 611,226.27				

Subtotal: 530,183.88

Ret. IVA: 0.00

Condiciones de pago: Crédito

Método de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Núm. Cta. Pago: NO IDENTIFICADO

Ret. ISR: 0.00

Moneda: MXN

T.C.: 1.00

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

IEPS: 0.00

IVA: 84,829.42

(SON: SEISCIENTOS QUINCE MIL TRECE PESOS 30/100 M.N.)

Total: 615,013.30

Observaciones

Sello digital del CFDI

T0d1fR1VXnk2SIt6F+9sR5ZZD6nV/16wC107mHgyHDow7cbCykQUQOduPqEiqmb87U+b2KrfGVRplsWuYwRi0tzyFK6B4+sdjIRZeVpzkM6/90Xe9IyUmiCOB6/gPLa1VKKn9Pkc9vOSGM0oCFataKoxNGm84xT8NoIDXTcOMxRjgbXz8JvMzfuwLHv1gsFdhj015VhoJlmGmQLBzJxv1CcXNP5aXBkvNZvZTGSBktQoHfHvpTzLNDWm6TJlrRw++VbQ1tM0SNRgQRdxjSuUCVsoKCukTPzP0t5Tn46FxBUBDanceQJ/A3TbnaHts8o4YxGfVxA==

Sello digital del SAT

uNP3lhbZzpD3FjGY7zUUGlmYbAuQW2MqHGeDC0e8E38VnkQ8GFp0TvZGkNaks4QJ0DS1XZ7G+7wzHD59eAx59JBmEa7DmCepRWeNX4Rou4aMWTLC4Qq67F32xplFVLa+2HGIDRncuguD/3BvN5IXJ1j06Bnv6JuYy3oHhEKJ0IRerisYchIVDnyFqedwH40pJuBaef1PcEodPqTs8MwXqV2oVpqj8Mln4ZV8/QH0b5QIU1wVozJqMAwTyAZL3ZU/CwmiEjfaRuNLU/890oplYlq/s+VR8y59ihNEquEi5e4zK1FdwXYy4p1OaYJnm89aIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BBD00EE0-B558-4DA5-95DC-883E980A6CE2|2017-03-13T13:45:14|T0d1fR1VXnk2SIt6F+9sR5ZZD6nV/16wC107mHgyHDow7cbCykQUQOduPqEiqmb87U+b2KrfGVRplsWuYwRi0tzyFK6B4+sdjIRZeVpzkM6/90Xe9IyUmiCOB6/gPLa1VKKn9Pkc9vOSGM0oCFataKoxNGm84xT8NoIDXTcOMxRjgbXz8JvMzfuwLHv1gsFdhj015VhoJlmGmQLBzJxv1CcXNP5aXBkvNZvZTGSBktQoHfHvpTzLNDWm6TJlrRw++VbQ1tM0SNRgQRdxjSuUCVsoKCukTPzP0t5Tn46FxBUBDanceQJ/A3TbnaHts8o4YxGfVxA==|00001000000403442064|



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

MOLM820221DU2

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

MAH1701013C0

MUNICIPIO DE AHOME

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

BBD00EE0-B558-4DA5-95DC-
883E980A6CE2

2017-03-13T12:51:48

2017-03-13T13:45:14

IAD121214B34

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$615,013.30

ingreso

Vigente

Imprimir



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN.

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.:

1 (UNO) DE LA OBRA (CUARTA DEL
CONTRATO) ✓

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRA- TISTA	RAZÓN SOCIAL:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
	DOMICILIO:	PARQUE NOROESTE # 540 OTE. FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, SINALOA.
	CIUDAD:	LOS MOCHIS ESTADO: SINALOA TELÉFONO: (668) 1253433

DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE	IMPORTE DEL CONTRATO	
	PROGREG/DGOP-DC-01- AH/2016 ✓	CONTRATO:		21 DE OCTUBRE DEL 2016 ✓
				✓\$14,027,325.64 IVA INCLUIDO
				IMPORTE DE LA OBRA ✓\$5,938,715.77 IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:		AÑO 2016 ✓	
	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. ✓ CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARIA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓			

BUENO POR: ✓ \$611,226.27

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:			
SON: (SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 27/100 M.N.) ✓			
EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO			
COMPRENDIDO DEL 22 DE OCTUBRE ✓ AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ✓			
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN:			
	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$530,183.88 ✓	\$757,405.54 ✓	
I.V.A. 16%:	\$84,829.42 ✓	\$121,184.89 ✓	
SUMA:	\$615,013.30 ✓	\$878,590.43 ✓	
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (30%):		\$263,577.13 ✓	
RETENCIÓN 0.20% CONV. C.M.I.C. DE:			
RETENCIÓN 0.5% INSP. CONTROL Y VIG:		\$3,787.03 ✓	
TOTAL DE DEDUCCIONES:		\$267,364.16 ✓	
IMPORTE A PAGAR:		\$611,226.27 ✓	
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 15 DE NOVIEMBRE ✓ DE 2016 ✓			



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

RECIBÍ	AUTORIZA
C. MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ	ING. LINO EDDGARDO RÍOS MONTOLYA
CONTRATISTA	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

IMPORTE A FACTURAR	\$615,013.30 ✓
IMPORTE A PAGAR	\$611,226.27 ✓



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTADO DE CUENTA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS FEDERALES CON CARGO A PROGRAMAS REGIONALES EN EL RENGLÓN DE DESARROLLO REGIONAL DEL ANEXO 20 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EJERCICIO FISCAL 2016, OTORGADOS MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 22/06/2016, ENTRE GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECTRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO DE AHOME POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30/06/2016	FECHA ACTUAL: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016
-------	--	--	---

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	\$	✓ 14,027,325.64	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	\$	✓ 4,208,197.69	CONT. No.:		PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016	
						PERIODO DEL CONTRATO : 22 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ✓		DIAS CALENDARIO: 71 ✓	
IMPORTE DE LA OBRA (NETO)	\$	✓ 5,938,715.77	TOTAL ANTICIPO DE LA OBRA (NETO):	\$	✓ 1,781,614.73				
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	CMIC 0.2%	0.5% INS. Y VIG 0.50%	OTRAS (%)		
1 UNO DE LA OBRA (PRIMERA DEL CONTRATO)	DEL:	22-oct-16	✓ \$2,271,568.09	✓ \$681,470.43		✓ \$9,791.24		✓ \$691,261.67	✓ \$1,580,306.42
	AL:	20-dic-16							
2 DOS DE LA OBRA (SEGUNDA DEL CONTRATO)	DEL:	21-dic-16	✓ \$523,162.53	✓ \$156,948.76		✓ \$2,255.01		✓ \$159,203.77	✓ \$363,958.76
	AL:	26-dic-16							
1 UNO DE LA OBRA (TERCERA DEL CONTRATO)	DEL:	22-oct-16	✓ \$459,107.98	✓ \$137,732.39		✓ \$1,978.91		✓ \$139,711.30	✓ \$319,396.68
	AL:	22-nov-16							
1 UNO DE LA OBRA (CUARTA DEL CONTRATO)	DEL:	22-oct-16	✓ \$878,590.43	✓ \$263,577.13		✓ \$3,787.03		✓ \$267,364.16	✓ \$611,226.27
	AL:	15-nov-16							
TOTALES:			✓ \$4,132,429.03	✓ \$1,239,728.71	\$0.00	✓ \$17,812.19	✓ \$0.00	✓ \$1,257,540.90	✓ \$2,874,888.13
SALDO DE LA OBRA (POR ESTIMAR):			✓ \$5,060,125.34		ANTICIPO POR AMORTIZAR DE LA OBRA:		✓ \$1,518,037.60		
SALDO DE CONTRATO (POR ESTIMAR):			✓ \$9,894,896.61		ANTICIPO POR AMORTIZAR DEL CONTRATO:		✓ \$2,968,488.98		

CONFORME	REVISAR	V.Bo.	APRUEBA
MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ	ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN	ING. ENRIQUE ZÁRATE GAXIOLA	ING. LINO EDDGARDO RÍOS MONTOYA
CONTRATISTA	SUPERVISOR	RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



RESUMEN DE
ESTIMACIÓN

PERIODO		FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016				
DEL	22 DE OCTUBRE	AL	15 DE NOVIEMBRE			
		DE	2016			
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016		
			CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ		
No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES		
	EST. UNO DE LA OBRA (PRIMERA EST. DEL CONTRATO)	\$1,958,248.35	\$757,405.54	30% ANTICIPO		
	EST. DOS DE LA OBRA (SEGUNDA EST. DEL CONTRATO)	\$451,002.18		ESTIMACIONES ANT.:	\$976,151.58	
	EST. UNO DE LA OBRA (TERCERA EST. DEL CONTRATO)	\$395,782.74		ESTA ESTIMACIÓN:	\$263,577.13	
	EST. UNO DE LA OBRA (CUARTA EST. DEL CONTRATO)			TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	\$1,239,728.71	
				0.5% CONTROL Y VIGILANCIA		
			ESTIMACIONES ANT.:	\$14,025.16		
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$227,221.66	SUBTOTAL	\$2,805,033.27	ESTA ESTIMACIÓN:	\$3,787.03
	IVA	\$36,355.47	I.V.A.:16 %	\$448,805.33	TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	\$17,812.19
	TOTAL DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$263,577.13	TOTAL:	\$3,253,838.60	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	\$1,257,540.90
	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN: SON		(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 43/100 M.N.)			

ESTADO CONTABLE			ANTICIPO		
	IMPORTE DE LA OBRA	IMPORTE DEL CONTRATO		IMPORTE DE LA OBRA	IMPORTE DEL CONTRATO
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$0.00	\$14,027,325.64	ANTICIPO DEL CONTRATO:		\$4,208,197.69
IMPORTE DE LA OBRA:	\$5,938,715.77	\$0.00	ANTICIPO DE LA OBRA:	\$1,781,614.73	
ESTIMADO A LA FECHA	\$878,590.43	\$4,132,429.03	AMORTIZADO A LA FECHA:	\$263,577.13	\$1,239,728.71
SALDO (POR ESTIMAR):	\$5,060,125.34	\$9,894,896.61	SALDO POR AMORTIZAR:	\$1,518,037.60	\$2,968,468.98

CONFORME	REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
C. MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ	ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN	ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA	ING. LINO EDDGARDO RÍOS MONTÓYA
CONTRATISTA	SUPERVISOR	RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.1 (UNO) DE LA
OBRA (CUARTA DEL
CONTRATO) ✓

HOJA: 1

DE: 2

PERIODO:

DEL: 22 DE OCTUBRE ✓

AL:

15 DE NOVIEMBRE ✓

DEL AÑO:

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ✓

2016 ✓



No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓									
CONTRATO:						PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓			
CONTRATISTA:						MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓			
I	CAMPO DEPORTIVO EN JUAN JOSÉ RÍOS ✓								
I.1	PRELIMINARES ✓								
I.1.2	DESMONTAJE DE PORTERÍAS DE ACERO EN CAMPO DE FÚTBOL SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. ✓	PZA	1 DE 2	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	✓ \$425.45	✓ \$850.90
I.1.3	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS TERRENO PLANO, INCLUYE: TOPÓGRAFO Y CADENERO, OPERADOR ✓	M2	1 DE 2	✓ 9,765.96	9,765.96	✓ 0.00	✓ 9,765.96	✓ \$7.07	✓ \$69,045.34
	TOTAL DE PRELIMINARES								✓✓ \$69,896.24
I.3	CAMPO DE FÚTBOL ✓								
I.3.1	CAMPO DEPORTIVO ✓								
I.3.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ✓	M2	1 DE 2	✓ 5,067.65	5,067.65	✓ 0.00	✓ 5,067.65	✓ \$4.17	✓ \$21,132.10
I.3.1.2	TRATADO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EQUIPO AL 95%, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ✓	M2	1 DE 2	✓ 5,067.65	5,067.65	✓ 0.00	✓ 5,067.65	✓ \$24.10	✓ \$122,130.37
I.3.1.3	DENTELLÓN DE 15X30 CM CON 4 VARILLAS DE 3/8" , ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. F'c= 200 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS. ✓	ML	2 DE 2	✓ 263.00	263.00	✓ 0.00	✓ 263.00	✓ \$266.91	✓ \$70,197.33
CONFORME <i>Maribel Moreno</i> C. MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ CONTRATISTA REVISAR <i>Francisco Ordóñez Guillén</i> ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN SUPERVISOR Vo.Bo. <i>Ing. Enrique Zarate Gaxiola</i> ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN APRUEBA <i>Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya</i> ING. LINO EDDGARDO RÍOS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS									

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

 AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		ESTIMACIÓN No.1 (UNO) DE LA OBRA (CUARTA DEL CONTRATO) ✓	
			HOJA:	2
			DE:	2

PERIODO :	DEL: 22 DE OCTUBRE ✓	AL: 15 DE NOVIEMBRE ✓	DEL AÑO: 2016 ✓	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ✓
-----------	----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------------

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓						CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓		
							CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓		
No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
I.3.1.4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE BASE AL 95% MIN. DEL P.V.M.S. Y 30 CM DE ESPESOR, INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA PESADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	✓ M3	2 DE 2	✓ 1,520.00	1,520.00	✓ 0.00	✓ 1,520.00	✓ \$310.39	✓ \$471,792.80	
I.3.1.5	BARRIDO DE SUPERFICIE CON BARREDORA MARCA RC RB-48	✓ HA	2 DE 2	✓ 0.51	0.51	✓ 0.00	✓ 0.51	✓ \$4,424.91	✓ \$2,256.70	
	TOTAL DE CAMPO DEPORTIVO								✓ \$687,509.30	
	TOTAL DE CAMPO DE FÚTBOL								✓ \$687,509.30	
	TOTAL DE CAMPO DEPORTIVO EN JUAN JOSÉ RÍOS ✓								✓ \$757,405.54	
	I.V.A. (16%):								✓ \$121,184.89	
	TOTAL DE ESTIMACIÓN:								✓ \$878,590.43	

CONFORME	REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
 C. MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ CONTRATISTA	 ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN SUPERVISOR	 ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN	 ING. LINO EDDGARDO RÍOS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de tu gente

GENERADORES

HOJA	1
DE	2

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.✓ PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO.✓ CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.✓ REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
		CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓
CALCULÓ: ARQ. J.L.G.A.		FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ✓

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO						CANTIDAD	
I	CAMPO DEPORTIVO EN JUAN JOSÉ RÍOS ✓										
I.1	PRELIMINARES										
I.1.2	DESMONTAJE DE PORTERÍAS DE ACERO EN CAMPO DE FÚTBOL SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	A-B	1-2		✓ PZA				2.00	2.00 ✓	
I.1.3	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS TERRENO PLANO, INCLUYE: TOPÓGRAFO Y CADENERO, OPERADOR	A-B	1-2		✓ M2	150.0000	65.1064			9,765.96 ✓	
I.3	CAMPO DE FÚTBOL										
I.3.1	CAMPO DEPORTIVO										
I.3.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	A-B	1-2		✓ M2	96.0000	52.7880			5,067.65 ✓	
I.3.1.2	TRATADO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EQUIPO AL 95%, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	A-B	1-2		✓ M2	96.0000	52.7880			5,067.65 ✓	

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ
CONTRATISTA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

GENERADORES

HOJA 2

DE 2

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. ✓ CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓	
		CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓	
CALCULÓ: ARQ. J.L.G.A.			FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ✓

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO						CANTIDAD	
I.3.1.3	DENTELLÓN DE 15X30 CM CON 4 VARILLAS DE 3/8" , ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	A-B	1-2		✓ ML	263.00				263.00	✓
I.3.1.4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE BASE AL 95% MIN. DEL P.V.M.S. Y 30 CM DE ESPESOR, INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA PESADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	A-B	1-2		✓ M3	96.0000	52.7777	0.3000		1,520.00	✓
I.3.1.5	BARRIDO DE SUPERFICIE CON BARREDORA MARCA RC RB-48	A-B	1-2		✓ HA	96.0000	52.7880			0.51	✓
						10,000.00					

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN
SUPERVISOR DE OBRA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ
CONTRATISTA



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente
Administración Municipal 2016 - 2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA. ✓ PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. ✓ CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA. ✓ REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016 ✓

SITUACION ANTERIOR: ✓

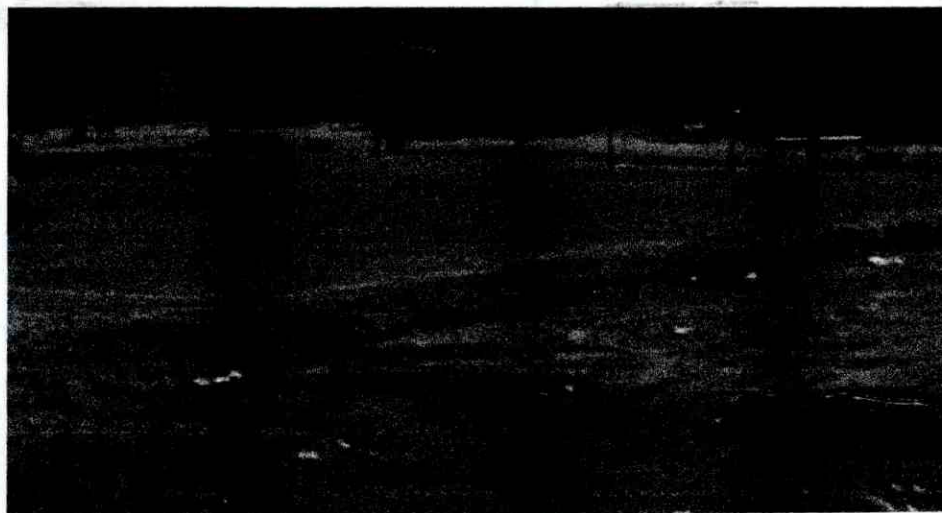

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Maribel
Moreno.



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ




MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA, SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016 ✓

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

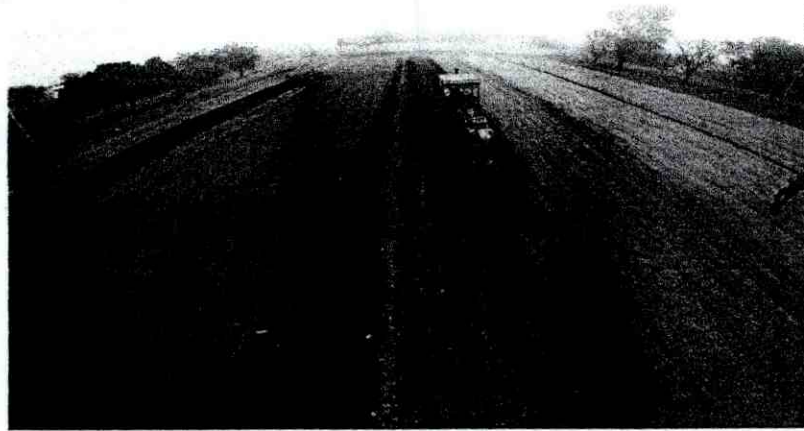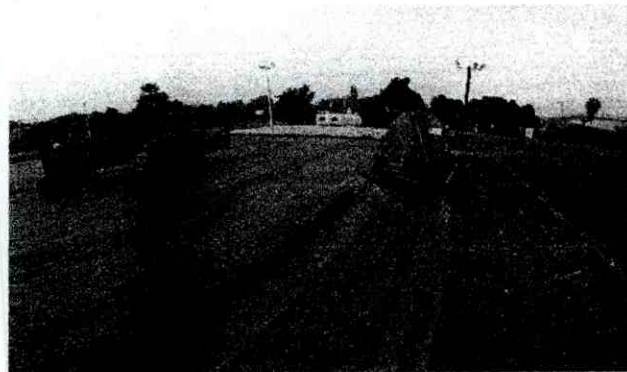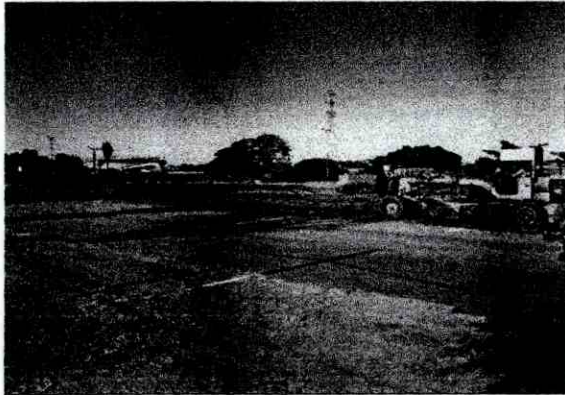

Mar
Ma



AYUNTAMIENTO
DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente
Administración Municipal 2014 - 2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMÓTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016 ✓

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

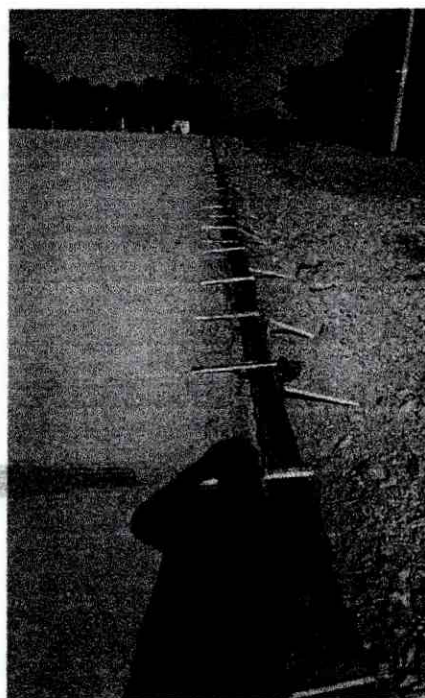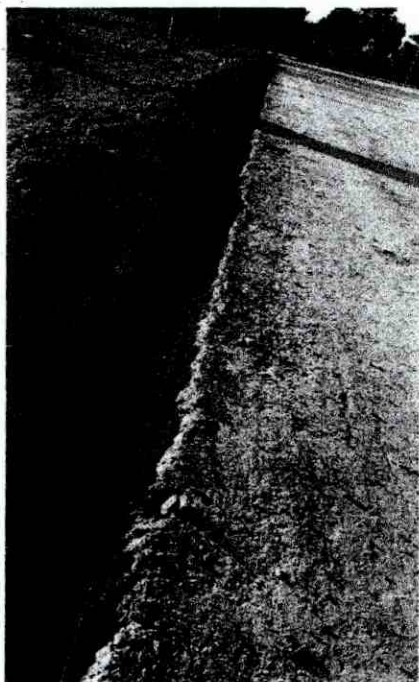

2
AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION

Maribel
Moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME


MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente
Administración Municipal 2014 - 2016

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016 ✓

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

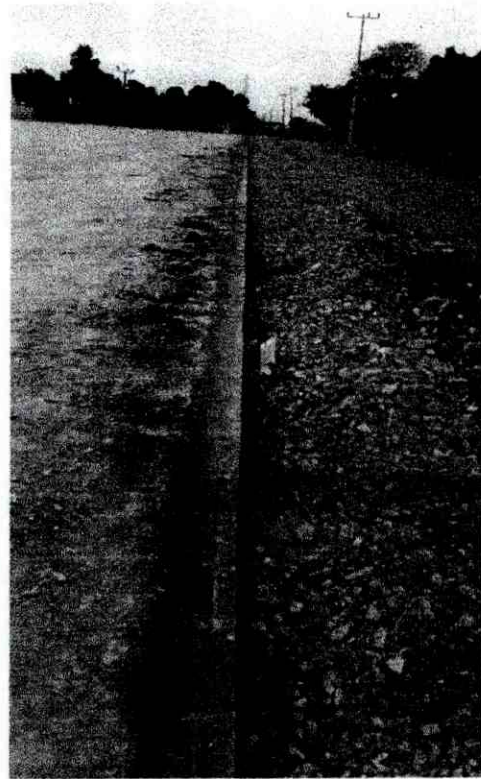

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Maribel Moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA		HOJA PORTADA	
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
UBICACIÓN:	JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
No. CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016	PROGRAMA	
MONTO :	\$ 14,027,325.64	SUBPROGRAMA	
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA 22/OCT/2016		REAL: 22/OCT/2016
FECHA DE TERMINO:	PROGRAMADA 31/DIC/2016		REAL: / /2016
DATOS DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ			
DOMICILIO: PARQUE NOROESTE # 540 OTE. FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, SINALOA.			
TELÉFONOS: (668) 125 3433			
TIPO DE TRABAJO:			
REPRESENTANTE: ARQ. JOSÉ LEONARDO GASTÉLUM AYALA			
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:			
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME	
1.- ARQ. JOSÉ LEONARDO GASTÉLUM AYALA RESIDENTE		ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN SUPERVISOR DE OBRA	
2.-			
3.-			
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:			



Maribel Moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

1

UBICACIÓN:

JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

CONTRATISTA:

MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ

CONTRATO:

PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA ✓


NOTAS Y CROQUIS

01

22/OCT/2016
(APERTURA)

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA DE LA OBRA DENOMINADA: " CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO EL ESTERO UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA". ✓

SE LLEVO' A CABO REUNION EN EL SITIO DE LA OBRA CON EL RESIDENTE O SUPERINTENDENTE DESIGNADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA PARA ESTA OBRA, CON EL FIN DE ACORDAR Y DEFINIR LOS ASUNTO DE LA OBRA, PLANTEAR, RESOLVER Y ACORDAR LAS DUDAS O DETALLES TÉCNICOS REQUERIDOS PARA INICIAR LA OBRA.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Maribel Moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No.	2
UBICACIÓN:		JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ	CONTRATO:	PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
02	24/OCT/2016 (INDICACIONES) (TRABAJOS)	SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENTE: SE ACORDÓ LAS DIMENSIONES DEL ÁREA A TRABAJAR (TERRADERÍAS Y BASE) QUE SERÁN DE: 96.00 x 54.00 M. SE ACORDÓ DEJAR PENDIENTES (CAJAS) HACIA LAS PORTERÍAS, DEJANDO PORTERÍAS EN SENTIDO TRANSVERSAL (SENTIDO CORTO) CON PENDIENTE MÍNIMO DE -1% HACIA CADA LADO, ESTO SIGNIFICA UN DESNIVEL DE 48 CM. SE INDICÓ LA REDUCCIÓN DE NIVELES DE TERRENO NATURAL (NTN) PARA PROVOCAR CON LOS MISMOS TERRADEROS LAS COMPENSACIONES (CORTES O RE-LLENOS) NECESARIOS. SE REDUZIERON TRABAJOS DE DESMONTAJE O DES-MANTENIMIENTO DE PORTERÍAS EXISTENTES	

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Maribel Moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

3

UBICACIÓN:

JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATISTA:

MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ

CONTRATO:

PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE
NOTA



FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

03

24/OCT/2016
(CROQUIS)

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENTE:

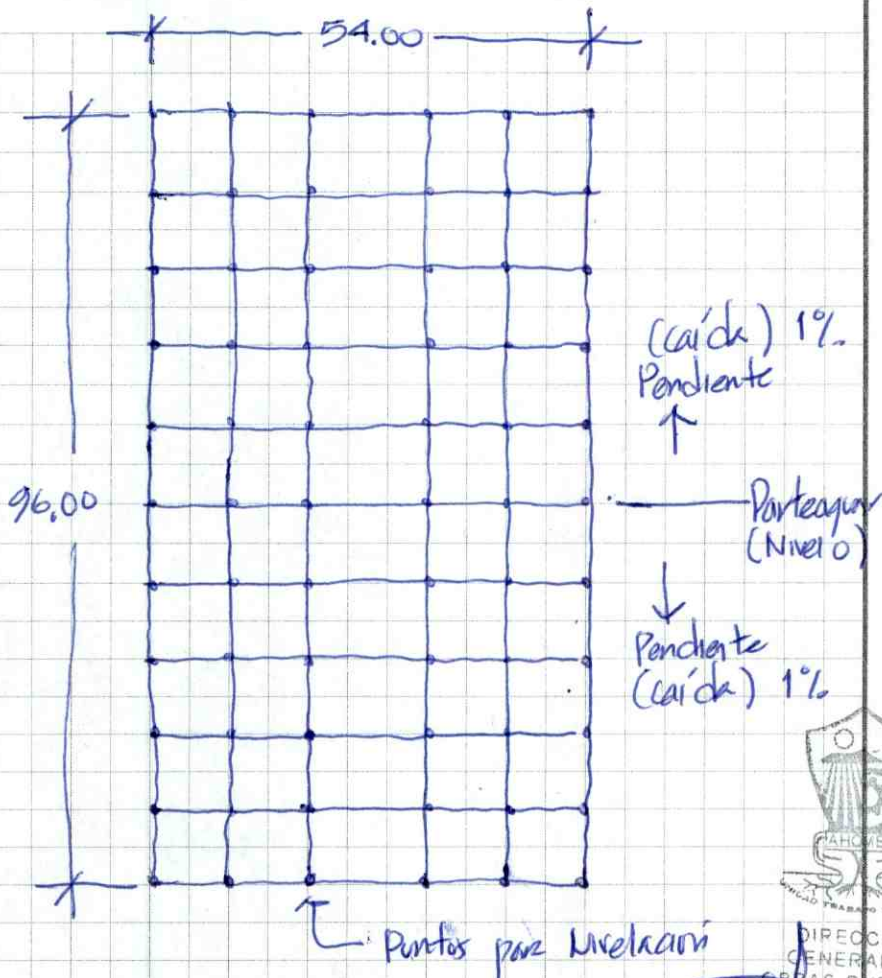

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Maribel
Moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

4

UBICACIÓN:

JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATISTA:

MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ

CONTRATO:

PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA


NOTAS Y CROQUIS

04

24/OCT/2016

(CROQUIS)

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENTE:

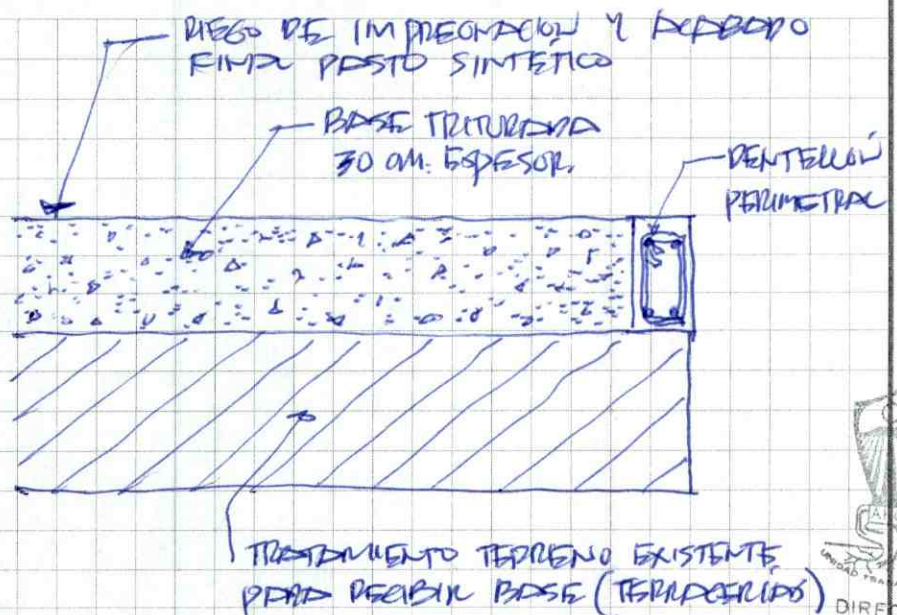

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


Maribel Moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No.	5
UBICACIÓN:		JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ	CONTRATO:	PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
05	25/OCT/2016 (TRABAJOS)	SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENTE: SE EFECTUÓ TRAZO DEL ÁREA A TRATAR CON TERRA CERUJA LA CUAL SERÁ LA MISMA QUE RECIBIRÁ LA BASE COMPLETADA DE MATERIAL DE BANCO. SE REDUJO NIVELACIÓN DEL ÁREA A TRATAR RESPECTANDO EL PLANO RESPECTIVO (PROYECTO DE NIVELES) COLANDO ESTACOS DE MADERA A CADA 10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS. CONSIDERANDO QUE EL TERRENO FUE RELLENADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, SE INDICÓ REDUZIR DE MANERA MUY CUIDADOSA EL PROCEDIMIENTO DE ESCALIFICACIÓN A CUANTO MENOS 30 CM. DE PROFUNDIDAD. 	



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Maribel
Moreno




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓		HOJA DE BITACORA No.	6
UBICACIÓN:		JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓	
CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓	CONTRATO:	PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
06	27/OCT/2016 (TRABAJOS)	SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENTE: SE REDUJO TRATAMIENTO AL TERRENO NATURAL (EXISTENTE) CON MAQUINARIA PESADA, EFECTUANDO CORTES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MOTOCORFORMADORA. SE REDUJO LA DEBIDA INCORPORACIÓN DE HUMEDAD CON CAMION PIPA DE 10,000 LT. DE CAPACIDAD, EFECTUANDO UN RIEGO UNIFORME, EVITANDO ENCHALCAMIENTO, BUSCANDO EL NIVEL DE HUMEDAD OPTIMA QUE PERMITIRA OBTENER EL MAYOR GRADO DE COMPACTACIÓN. SE REDUJO COMPACTACIÓN INICIAL CON PASO DE CAMION PIPA CARGADO AL 100% Y COMPACTADO FINAL CON VIBRO-COMPACTADOR DE RODILLO LISO. EL AREA EN PROCESO DE TRATAMIENTO CON LOS TRABAJOS ANTERIORES FUE LA FRONTE LONGITUDINAL (MEDIA CAUCHA) DEL LADO SUR (LADO DEL POBLADO) 



Maribel
Moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

7

UBICACIÓN:

JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

CONTRATISTA:

MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓

CONTRATO:

PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA ✓

NOTAS Y CROQUIS


07

29/ OCT/ 2016
(TRABAJOS)

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENTE:

SE CONTINUÓ TRATAMIENTO AL TERRENO EXISTENTE CON MAQUINARIA PESADA (MOTOCONFORMADORA) EFECTUANDO CORTES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, CON LA DEBIDA INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, BUSCANDO EL NIVEL DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA OBTENER EL MAYOR GRADO DE COMPACTACIÓN.

EL ÁREA EN PROCESO DE TRATAMIENTO Y QUE CON ESTA FECHA SE CONSIDERAN TERMINADOS LOS TRABAJOS DESCRITOS ANTERIORMENTE FUE UN FRONTE LONGITUDINAL (MEDIDA CANCELADA) DEL LADO SUR (LADO DEL POBLADO).



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Maribel Moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 8
UBICACIÓN: JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
CONTRATISTA: MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ	CONTRATO: PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016	
No. DE NOTA	FECHA	NOTAS Y CROQUIS
08	31/OCT/2016 (TRABAJOS)	SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENDES: SE REALIZÓ TRATAMIENTO AL TERRENO EXISTENTE CON MAQUINARIA PESADA (MOTOCOMPACTADORA), EFECTUANDO CORTES Y MOVIMIENTO DE TERRACERIAS. SE APLICÓ LA DEBIDA INCORPORACIÓN DE HUMEDAD CON CAMIÓN PIPA DE 10,000 LT. DE CAPACIDAD, EFECTUANDO UN RIEGO UNIFORME, EVITANDO ENCHARCAMIENTOS, BUSCANDO EL NIVEL DE HUMEDAD ÓPTIMA QUE PERMITIRÁ OBTENER EL MAYOR GRADO DE COMPACTACIÓN. SE LLEVÓ A CABO COMPACTACIÓN INICIAL CON PASO DE CAMIÓN PIPA CARGADO AL 100%. Y COMPACTACIÓN FINAL CON VIBRO-COMPACTADOR DE RODILLO LISO. EL ÁREA EN TRATAMIENTO CON LOS TRABAJOS ANTERIORES, YA QUE EN ESTA FECHA SE CONSIDERAN TERMINADOS FUE UN FRONTE LONGITUDINAL (MEDIO CARRILLO) DEL CARRO NORTE (CARRO DE LA CARRETERA MEX-15).



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Maribel Moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

9

UBICACIÓN:

JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATISTA:

MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ

CONTRATO:

PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

09

01/NOV/2016
(TRABAJOS)

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENTERES:

SE INICIÓ CON EL SUMINISTRO DE MATERIA DE BANCO PARA LA BASE DE LA CANCHA DE FUTBOL, CONSISTENTE EN BAYASTRE TRITURADO DE CERO, SUMINISTRÁNDOSE EN CAMIONES DE VOLTEO, TIRÁNDOSE DE MANERA ORDENADA EN "CHORIZOS" LONGITUDINALES CON EL ESPACIAMIENTO ENTRE CADA "TRINCHA" CALCULADA PARA UN ESPESOR DE 15 CM. A MOMENTO DE DESPARRAMARSE (EXTENDERSE)

SE RESPETÓ EL ORDEN DE TRATAMIENTO DE TERRECIERAS IGUAL PARA ESTA FASE CONSISTENTE EN LA BASE, INICIANDO EN LA FRONTERA LONGITUDINAL (MEDIO CANCHA) DEL LADO SUR (LADO DEL PUEBLO)



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Maribel
Moreno.



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No.	10
UBICACIÓN:		JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓	

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓	CONTRATO:	PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
--------------	---------------------------------	-----------	------------------------------

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
010	05/NOV/2016 (TRABAJOS)	SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENDES: SE REDUZO AL 100% LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE (FRANJA LONGITUDINAL SUR) MEDIA CARRETA DEL LADO DEL PUEBLO. SE REDUZIERON TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE LA BASE CON MOTOCONFORMADORA, EFECTUANDO COMPACTACIÓN INICIAL CON CAMION PIPA CARGADO Y/O CAMION DE VOLTEO CARGADO AL 100%. SE REDUZIERON TRABAJOS DE INCORPORACIÓN DE HUMEDAD PROCURANDO UN NIVEL DE HUMEDAD ÓPTIMA QUE ASEGURE EL MÁXIMO GRADO DE COMPACTACIÓN. SE REDUZO COMPACTACIÓN DE LA BASE CON VIBRO-COMPACTADOR DE RODILLO LISO. EN ESTE TIPO DE TRABAJOS LA TOPOGRAFÍA ES PERMANENTE; SE COLOCAN ESTACOS O TROMPOS DE MADERA CUYA CORONA INDICA EL NIVEL BUSCADO. LA MAQUINARIA CON FRECUENCIA MUEVE O ALTERA DICHAS REFERENCIAS SIENDO ESTOS RECOLOCADOS Y RENIVELADOS CUANTAS VECES SEA NECESARIO; AL FINAL SE REDUZA AJUSTE AL 0m.



Maribel Moreno.



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No.	11
UBICACIÓN:		JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
CONTRATISTA:		MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ	
CONTRATO:		PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016	
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
011	10/NOV/2016 (TRABAJOS)	SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENTE: SE REALIZÓ AL 100% LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIA PARA BASE (FILAS LONGITUDINAL NORTE) 1/2 CANTO LOMO CARRETERA MEX-15. SE REALIZARON TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE LA BASE CON MOTOCONFORMADORA, EFECTUANDO COMPACTACIÓN INCLAL CON CAMIÓN PIPA CARGADO AL 100%. Y/O CAMIÓN DE VOLTEO CON CARGA AL 100%. SE REALIZARON TRABAJOS DE INCORPORACIÓN DE HUMEDAD PROCURANDO UN NIVEL DE HUMEDAD ÓPTIMO PARA ASI OBTENER EL MÁXIMO GRADO DE COMPACTACIÓN. SE REALIZÓ COMPACTACIÓN DE LA BASE CON VIBRO-COMPACTADOR DE RODILLO LISO.	



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Maribel
Moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓		HOJA DE BITACORA No.	12
UBICACIÓN:		JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓	
CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓	CONTRATO:	PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
012	11/NOV/2016 (TRABAJOS)	SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENTE: SE INICIARON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE CEPTOS PARA DUELO DE DENTELLÓN PERIMETRAL QUE SERVIRÁ DE CONTENCIÓN A LA BASE; AL MISMO TIEMPO SE REALIZAN TRABAJOS DE HABILITADO Y PUNTO DE REPOSO DE REPARO PARA EL DENTELLÓN, ASI COMO SE HABILITADO DE CUMBRA Y CUMBRADO. DENTELLÓN PERIMETRAL SECCION 15x30 CM. PUNTO 4 VARIAS DE 3/8" DE DIAMETRO, ESTACAS DE ALAMBRO DE 1/4" A CADA 25 CM.



Maribel
Moreno.



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

13

UBICACIÓN:

JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATISTA:

MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ

CONTRATO:

PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS


013

15/NOV/2016
(TRABAJOS)

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENTE:



Dentellon 15x30
4 φ 3/8" Est.
1/4" @ 25 cm



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CON ESTA FECHA SE TERMINAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO SECCION 15 X 30 CM. CONCRETO FIC= 200 KG/CM² ARMADO CON 4 VARIAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ARMADURA DE 1/4" @ CADA 25 CM

SE DEJARÁ BARRIDO DE SUPERFICIE CON BARRENDON MIECENCA.

Maribel Moreno



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Los Mochis, Sinaloa; a 01 de Febrero de 2017.

ARQ. JOSE LEONARDO GASTELUM AYALA
LOS MOCHIS, SINALOA

Anexo a la presente envío a usted los resultados obtenidos de las pruebas de compactación y estudio de los materiales que intervienen en el proceso constructivo de la obra: " CONJUNTO DEPORTIVO " EL ESTERO", desarrollado en Juan José Ríos, Municipio de Ahome. Sinaloa.

Sin más de momento, quedo de usted muy

ATENTAMENTE

INC. JOSE RAMON BEYES PORTILLO.
CED. PROF. 1018899
GERENTE GENERAL.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

c.c.p. Archivo.



SOCIO No. 130

R.E.C. SCC-990310-5R3 IMSS - IN°ONAVIT E46-30521-10

Tel./Fax: (668) 811.30.03 Tel. (668) 811.46.50

Ej. Matacahui # 357 Nte. • Fracc. Villa Huites • e-mail: sucanosa@prodigy.net.mx / sucanosa@live.com.mx • Los Mochis, Sin.



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

PORCENTAJE DE

COMPACTACION EN EL CAMPO

METODO DE PRUEBA: NMX-C-416 ONNCCE

OBRA	CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO" ✓			ORDENADO POR	MUNICIPIO DE AHOME					
				CONSTRUCTORA	GASTELUM AYALA JOSE LEONARDO					
LOCALIZACION	JUAN JOSE RIOS, AHOME, SINALOA			FECHA DE ELAB:	01-feb-17					
					HOJA # 001					
ENSAYE No	LOCALIZACION	PROF. DEL SONDEO EN CMS	FECHA DE SONDEO	MASA VOL. HUMEDA	HUMEDAD DEL LUGAR	MASA VOL. SECA	MASA VOL. SECA MAXIMA	HUMEDAD OPTIMA	% DE COMPACT	OBSERVACIONES
1	AREA DE PLATAFORMA PARA	20.0	02-dic-16	1905	15.1	1656	1750	15.0	94.6	SATISFACTORIO
2	CANCHA DE FUTBOL CON	20.0	02-dic-16	1927	15.2	1673	1750	15.0	95.6	SATISFACTORIO
3	PASTO SINTETICO	19.0	02-dic-16	1939	15.4	1680	1750	15.0	96.0	SATISFACTORIO
4	TRATAMIENTO TERRENO NATURAL	21.0	05-dic-16	1941	15.3	1684	1750	15.0	96.2	SATISFACTORIO
5		20.0	05-dic-16	1924	15.1	1671	1750	15.0	95.5	SATISFACTORIO
6		19.0	05-dic-16	1914	15.1	1663	1750	15.0	95.0	SATISFACTORIO
7		20.0	07-dic-16	1921	15.2	1668	1750	15.0	95.3	SATISFACTORIO
8		19.0	07-dic-16	1906	14.9	1659	1750	15.0	94.8	SATISFACTORIO
9		21.0	07-dic-16	1929	15.3	1673	1750	15.0	95.6	SATISFACTORIO
10		20.0	08-dic-16	1939	15.4	1680	1750	15.0	96.0	SATISFACTORIO
11		21.0	08-dic-16	1916	15.0	1666	1750	15.0	95.2	SATISFACTORIO
12		20.0	08-dic-16	1901	14.8	1656	1750	15.0	94.6	SATISFACTORIO
13		19.0	08-dic-16	1905	15.2	1654	1750	15.0	94.5	SATISFACTORIO
14		20.0	22-dic-16	1939	15.4	1680	1750	15.0	96.0	SATISFACTORIO
15		19.0	22-dic-16	1925	15.2	1671	1750	15.0	95.5	SATISFACTORIO
16		20.0	22-dic-16	1914	15.0	1664	1750	15.0	95.1	SATISFACTORIO
LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.										
OBSERVACIONES										
COMPACTACION ESPECIFICADA		TERRENO NATURAL								
COMPACTACION OBTENIDA		90.00%								
		95.34%								
Vo. Bo.		DIRECCION GENERAL DE CBRAS PUBLICAS		EL GERENTE DEL LABORATORIO				JEFE DE LABORATORIO		
		DIRECCION DE CONSTRUCCION		ING. JOSÉ RAMÓN REYES PORTILLO				ING. JOSE PABLO CASTRO LOPEZ		



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

PORCENTAJE DE
COMPACTACION EN EL CAMPO

METODO DE PRUEBA: NMX-C-416 ONNCCE

OBRA	CONSTRUCCION DE CONJUNTO	ORDENADO POR	MUNICIPIO DE AHOME
	DEPORTIVO " EL ESTERO"	CONSTRUCTORA	GASTELUM AYALA JOSE LEONARDO
LOCALIZACION	JUAN JOSE RIOS, AHOME, SINALOA	FECHA DE ELAB:	01-feb-17

HOJA # 002

ENSAYE No	LOCALIZACION	PROF. DEL SONDEO EN CMS	FECHA DE SONDEO	MASA VOL. HUMEDA	HUMEDAD DEL LUGAR	MASA VOL. SECA	MASA VOL. SECA MAXIMA	HUMEDAD OPTIMA	% DE COMPACT	OBSERVACIONES
1	AREA DE PLATAFORMA PARA	20.0	07-dic-16	1919	15.2	1666	1750	15.0	95.2	SATISFACTORIO
2	CANCHA DE FUTBOL CON	20.0	07-dic-16	1906	14.9	1659	1750	15.0	94.8	SATISFACTORIO
3	PASTO SINTETICO	19.0	12-dic-16	1927	15.3	1671	1750	15.0	95.5	SATISFACTORIO
4	CAPA TERRAPLEN	20.0	12-dic-16	1939	15.4	1680	1750	15.0	96.0	SATISFACTORIO
5		21.0	03-ene-17	1929	15.3	1673	1750	15.0	95.6	SATISFACTORIO
6		20.0	03-ene-17	1919	15.2	1666	1750	15.0	95.2	SATISFACTORIO
LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.										

OBSERVACIONES

COMPACTACION ESPECIFICADA
COMPACTACION OBTENIDA



CAPA TERRAPLEN
90.00%
95.38%



Vo. Bo.

DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION

EL GERENTE DEL LABORATORIO

ING. JOSÉ RAMÓN REYES PORTILLO

JEFE DE LABORATORIO

ING. JOSE PABLO CASTRO LOPEZ



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

PORCENTAJE DE

COMPACTACION EN EL CAMPO

METODO DE PRUEBA: NMX-C-416 ONNCC

OBRA	CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO"			ORDENADO POR	MUNICIPIO DE AHOME					
LOCALIZACION	JUAN JOSE RIOS, AHOME, SINALOA			CONSTRUCTORA	GASTELUM AYALA JOSE LEONARDO					
				FECHA DE ELAB:	01-feb-17					
ENSAYE No	LOCALIZACION	PROF. DEL SONDEO EN CMS	FECHA DE SONDEO	MASA VOL. HUMEDA	HUMEDAD DEL LUGAR	MASA VOL. SECA	MASA VOL. SECA MAXIMA	HUMEDAD OPTIMA	% DE COMPACT	OBSERVACIONES
1	AREA DE PLATAFORMA PARA	15.0	15-dic-16	2421	13.3	2136	2130	13.0	100.3	SATISFACTORIO
2	CANCHA DE FUTBOL CON	14.0	15-dic-16	2414	13.1	2134	2130	13.0	100.2	SATISFACTORIO
3	PASTO SINTETICO	16.0	15-dic-16	2398	12.9	2124	2130	13.0	99.7	SATISFACTORIO
4	1RA. CAPA SUB/BASE	15.0	16-dic-16	2416	13.1	2136	2130	13.0	100.3	SATISFACTORIO
5	MATERIAL:	15.0	16-dic-16	2404	13.0	2128	2130	13.0	99.9	SATISFACTORIO
6	BALASTRE CRIBADO	16.0	16-dic-16	2409	13.1	2130	2130	13.0	100.0	SATISFACTORIO
7		15.0	20-dic-16	2395	12.9	2121	2130	13.0	99.6	SATISFACTORIO
8		14.0	20-dic-16	2404	13.0	2128	2130	13.0	99.9	SATISFACTORIO
9		13.0	20-dic-16	2411	13.1	2132	2130	13.0	100.1	SATISFACTORIO
10		15.0	06-ene-17	2418	13.2	2136	2130	13.0	100.3	SATISFACTORIO
11		14.0	06-ene-17	2402	13.0	2126	2130	13.0	99.8	SATISFACTORIO
12		15.0	06-ene-17	2407	13.0	2130	2130	13.0	100.0	SATISFACTORIO
13		16.0	06-ene-17	2400	12.9	2126	2130	13.0	99.8	SATISFACTORIO
14		14.0	06-ene-17	2400	12.8	2128	2130	13.0	99.9	SATISFACTORIO
15		15.0	06-ene-17	2416	13.2	2134	2130	13.0	100.2	SATISFACTORIO
16		16.0	06-ene-17	2400	13.0	2124	2130	13.0	99.7	SATISFACTORIO
LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.										
OBSERVACIONES										
COMPACTACION ESPECIFICADA				1RA. CAPA SU/BASE				95.00%		
COMPACTACION OBTENIDA								99.98%		
Vo. Bo. DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE CONSTRUCCION				EL GERENTE DEL LABORATORIO				JEFE DE LABORATORIO		
				ING. JOSÉ RAMÓN REYES PORTILLO				ING. JOSE PABLO CASTRO LOPEZ		



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

PORCENTAJE DE

COMPACTACION EN EL CAMPO

METODO DE PRUEBA: NMX-C-416 ONNCE

OBRA		CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO " EL ESTERO"		ORDENADO POR CONSTRUCTORA		MUNICIPIO DE AHOME GASTELUM AYALA JOSE LEONARDO					
LOCALIZACION		JUAN JOSE RIOS, AHOME, SINALOA		FECHA DE ELAB:		01-feb-17					HOJA # 004
ENSAYE No	LOCALIZACION	PROF. DEL SONDEO EN CMS	FECHA DE SONDEO	MASA VOL. HUMEDA	HUMEDAD DEL LUGAR	MASA VOL. SECA	MASA VOL. SECA MAXIMA	HUMEDAD OPTIMA	% DE COMPACT	OBSERVACIONES	
1	AREA DE PLATAFORMA PARA	14.0	06-ene-17	2395	12.8	2124	2130	13.0	99.7	SATISFACTORIO	
2	CANCHA DE FUTBOL CON	13.0	06-ene-17	2414	13.1	2134	2130	13.0	100.2	SATISFACTORIO	
3	PASTO SINTETICO	15.0	06-ene-17	2411	13.2	2130	2130	13.0	100.0	SATISFACTORIO	
4	2DA. CAPA SUB/BASE	14.0	06-ene-17	2397	13.0	2121	2130	13.0	99.6	SATISFACTORIO	
5	MATERIAL:	13.0	06-ene-17	2416	13.2	2134	2130	13.0	100.2	SATISFACTORIO	
6	BALASTRE CRIBADO	13.0	06-ene-17	2409	13.1	2130	2130	13.0	100.0	SATISFACTORIO	
7		14.0	10-ene-17	2400	12.9	2126	2130	13.0	99.8	SATISFACTORIO	
8		15.0	10-ene-17	2428	13.3	2143	2130	13.0	100.6	SATISFACTORIO	
9		13.0	10-ene-17	2411	13.1	2132	2130	13.0	100.1	SATISFACTORIO	
10		13.0	10-ene-17	2404	13.0	2128	2130	13.0	99.9	SATISFACTORIO	
11		14.0	10-ene-17	2421	13.2	2139	2130	13.0	100.4	SATISFACTORIO	
12		13.0	10-ene-17	2400	12.9	2126	2130	13.0	99.8	SATISFACTORIO	
13		12.0	17-ene-17	2409	13.0	2132	2130	13.0	100.1	SATISFACTORIO	
14		14.0	17-ene-17	2402	12.9	2128	2130	13.0	99.9	SATISFACTORIO	
15		15.0	17-ene-17	2409	13.1	2130	2130	13.0	100.0	SATISFACTORIO	
16		14.0	17-ene-17	2416	13.2	2134	2130	13.0	100.2	SATISFACTORIO	
LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.											
OBSERVACIONES											
COMPACTACION ESPECIFICADA		2DA. CAPA SU/BASE									
COMPACTACION OBTENIDA		95.00%									
		100.03%									
Vo. Bo.		EL GERENTE DEL LABORATORIO				JEFE DE LABORATORIO					
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		ING. JOSÉ RAMÓN REYES PORTILLO				ING. JOSE PABLO CASTRO LOPEZ					
DIRECCION DE CONSTRUCCION											



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN
EJ. MATACAHUI #357 NORTE, FRACC. VILLA HUITES, C. P. 81257, LOS MOCHIS, SIN.
TEL./FAX (668) 8-11-30-03


ANALISIS DE MATERIAL PARA SUBBASE

OBRA:	CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO " EL ESTERO"	MUESTRA No.	1	HOJA # 05
LOCALIZACIÓN:	JUAN JOSE RIOS, AHOME, SINALOA	FECHA DE MUESTREO	10-dic-16	
CONSTRUCTORA:	GASTELUM AYALA JOSE LEONARDO	FECHA DE PRUEBA	12-dic-16	
MATERIAL	BALASTRE CRIBADO	FECHA DE ELAB.	01-feb-17	

PRUEBAS	RESULTADOS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
PESO VOLUMÉTRICO SECO SUELTO	1660	kg/m³	N-CMT-4-02-001-11
PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO	2130	kg/m³	
CONTENIDO DE AGUA ÓPTIMO	13.0	%	
LÍMITE LÍQUIDO	28.00	%	30.0 máximo
LÍMITE PLÁSTICO	22.00	%	
ÍNDICE PLÁSTICO	6.00	%	10.0 máximo
C.B.R.	115.00	%	50.0 mínimo
EXPANSIÓN	0.10	%	
GRAVAS	48.00	%	
ARENAS	39.00	%	
FINOS	13.00	%	
EQUIVALENTE DE ARENAS	32.00	%	30.0 mínimo
DESGASTE LOS ANGELES	33.00	%	50 máximo
T. M. A.	2"	Pulg.	2" máximo
CLASIFICACIÓN S.U.C.S.	SM	ARENA LIMOSA; MEZCLA DE ARENA, GRAVA Y LIMO	

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

MALLAS	% QUE PASA	% ESPECIF. DE PROYECTO	
2"	98	85	100
1 1/2"	90	75	100
1"	82	62	100
3/4"	77	54	100
3/8"	60	40	100
No. 4	52	30	100
" 10	45	21	100
" 20	39	13	92
" 40	31	8	75
" 60	23	5	60
" 100	20	3	45
" 200	13	0	25

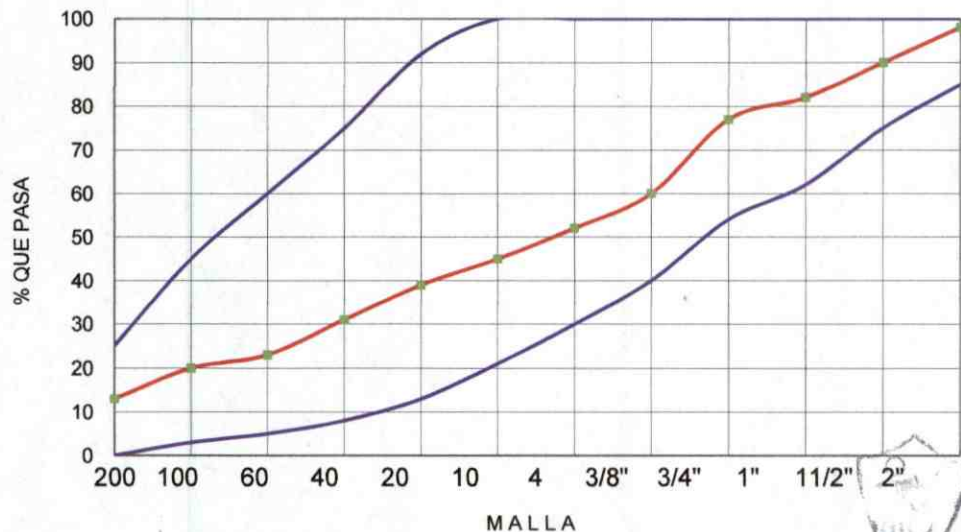

Número de Ejes Equivalentes Acumulados

$$\sum L \leq 10^6$$

BANCO: COBANARO
MATERIAL: BALASTRE CRIBADO
LOCALIZACIÓN: AREA DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL.

OBSERVACIONES: EL MATERIAL ANALIZADO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES PARA SU EMPLEO EN CALIDAD SUB/BASE.

GERENTE GENERAL

LABORATORISTA

ING. JOSÉ RAMÓN REYES PORTILLO

ING. JOSÉ PABLO CASTRO LÓPEZ



Socio #130

SCCN-EM-F03-01

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A EL MATERIAL ARRIBA INDICADO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN




— LONGITUD DE DENTELLON = 300 M L


● NIVELES PENDIENTE DEL 1%

□ BASE TRITURADA




Martín Moreno



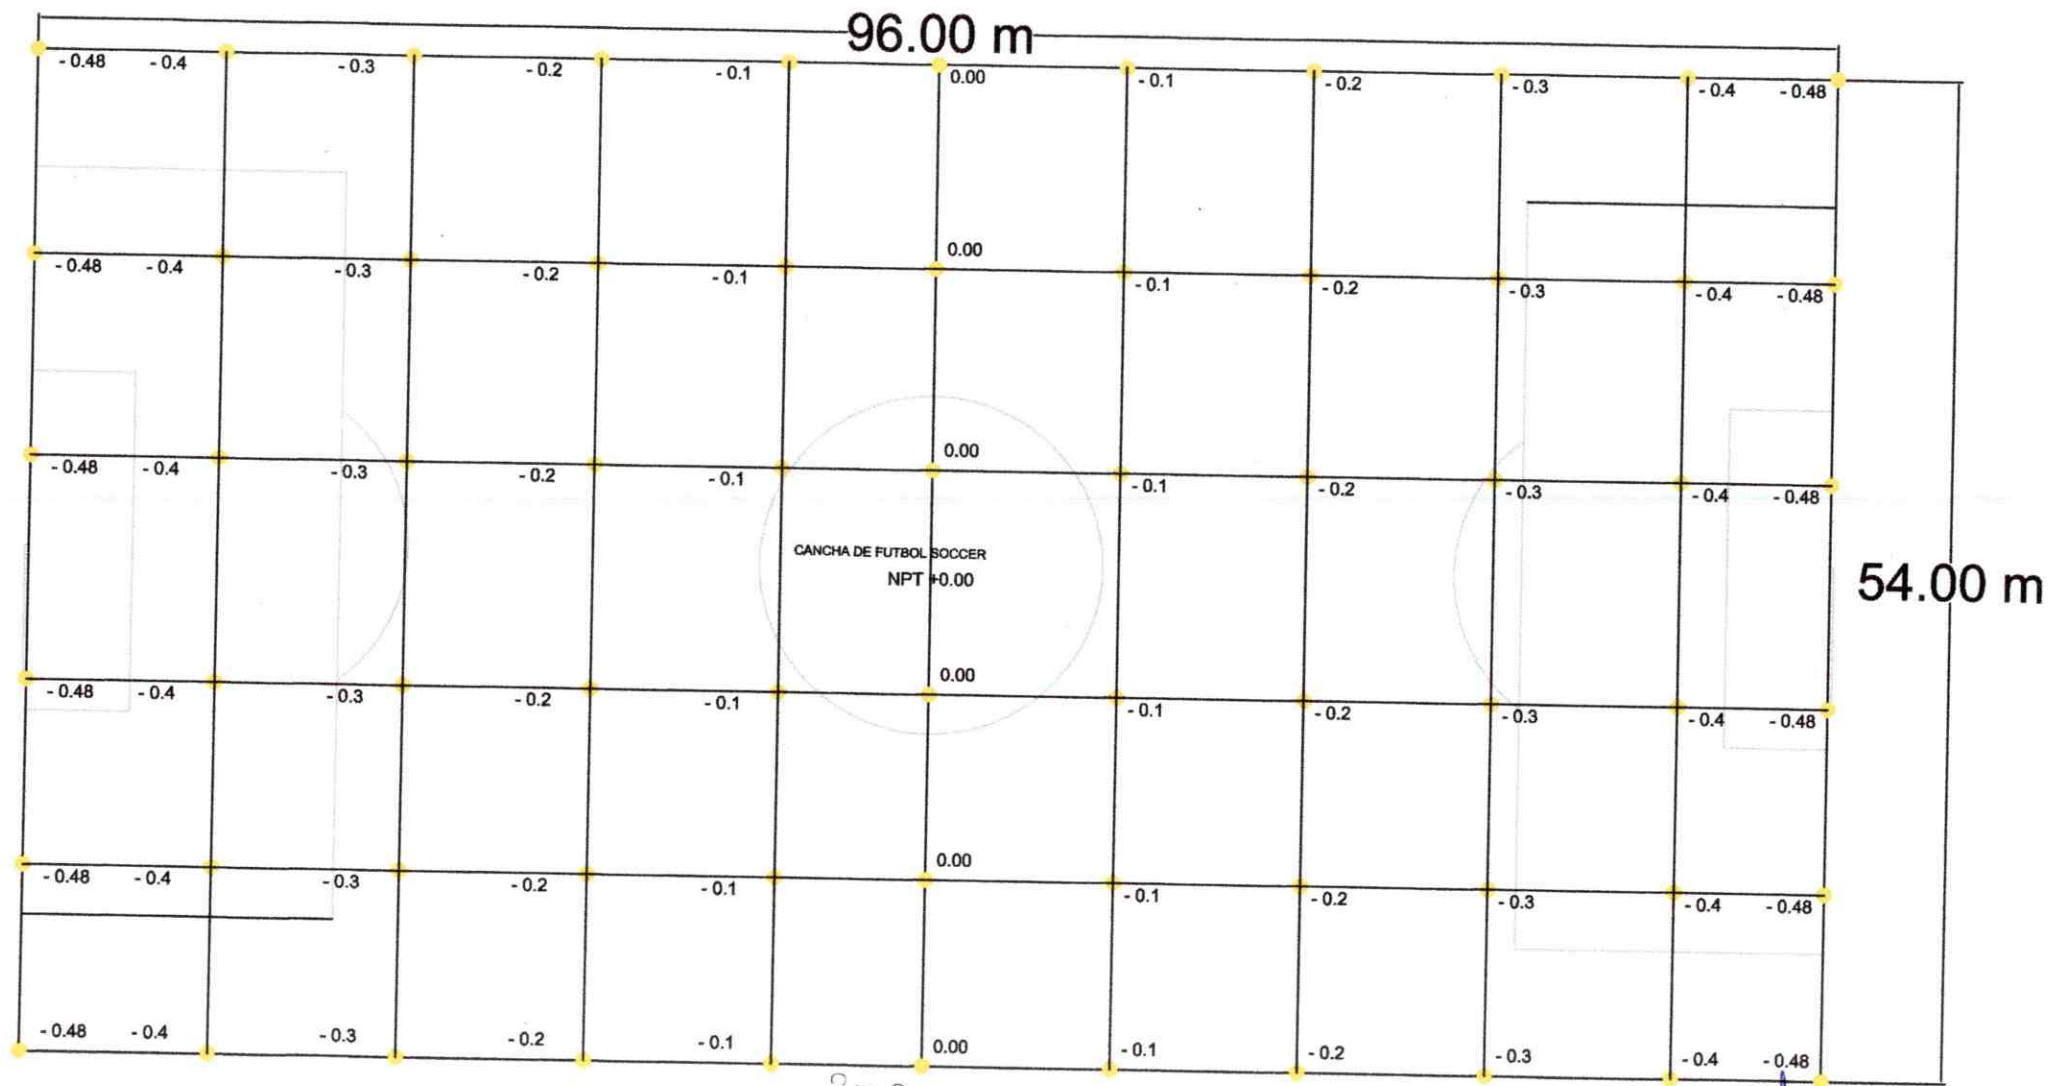

Maribel Moreno.

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



MC CONSTRUCCIONES

Parque Noroeste # 540 Ote. fracc. El Parque

C.P.: 81 259

R.F.C.: MOLM820221DU2



Los Mochis, Sinaloa, a 21 de Octubre de 2016

C. Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya
Director General de Obras Públicas.
Presente.-

Refiriéndome a nuestro contrato número CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO). MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. le comunico nuestra negativa a que se nos retenga el 0.2% (dos al millar) por concepto de capacitación CMIC, en cada una de las estimaciones que estaremos tramitando para cobro, durante el cumplimiento de nuestro contrato.

Sin otro asunto a tratar por el momento, me despido de Usted muy

Atentamente

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
Representante legal



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MC CONSTRUCCIONES

Parque Noroeste # 540 Ote. fracc. El Parque

C.P.: 81 259

R.F.C.: MOLM820221DU2



Los Mochis, Sinaloa, a 21 de Octubre de 2016

C. ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA

Director General de Obras Públicas.


Presente.-

Por medio del presente y de la manera más atenta le informo que estaré como superintendente en la obra CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO). MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA.

Obra Bajo contrato No.: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016, de fecha 21 de Octubre de 2016.

Sin más por el momento, me despido de Usted

Atentamente


MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR
✓ DE OBRA PÚBLICA

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN ✓
SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE AHOME
P R E S E N T E.

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO LE INFORMO A USTED QUE A PARTIR DE LA PRESENTE
FECHA SE LE A ASIGNADO LA SUPERVISIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA:

**CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN
JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.** ✓

CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2016 ✓

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACION ME ES
GRATO QUEDAR A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE
AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE ✓
Los Mochis, Ahome Sinaloa, 21 de Octubre de 2016


ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA ✓
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

C.c.p. Archivo



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MC CONSTRUCCIONES

Parque Noroeste # 540 Ote. fracc. El Parque

C.P.: 81 259

R.F.C.: MOLM820221DU2



Los Mochis, Sinaloa, a 22 de Octubre de 2016

C. Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya ✓
Director General de Obras Públicas.
Presente.-

Reciba un cordial saludo y de la manera más atenta le informo que con fecha 22 de Octubre de 2016, iniciamos con los trabajos relativos a CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO). MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. ✓

Bajo contrato No.: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓

Sin más por el momento, me despido de Usted

Atentamente

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE INICIO DE OBRA

C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS ✓
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ
INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ
RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

No. DE CONTRATO: **PROGREG/DGOP/DC/01-AH/2016** ✓

INICIARON CON FECHA: **22-OCTUBRE-2016** ✓

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN
PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

A T E N T A M E N T E
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE" ✓
LOS MOCHIS, SIN., A 22 DE OCTUBRE DEL 2016.


ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA ✓
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

C.C.P' Archivo.
Ofavinicont



MC CONSTRUCCIONES

Parque Noroeste # 540 Ote. fracc. El Parque

C.P.: 81 259

R.F.C.: MOLM820221DU2



LOS MOCHIS, SIN., A 2 DE MARZO DEL 2017

C. ING JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" LO SIGUIENTE:

1).-HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y EN FORMA LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES A LOS 5 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES; ASI COMO TAMBIEN HEMOS PRESENTADO LAS DECLARACIONES QUE CONTIENEN LOS PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS 5 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES.

2).-QUE NO TENGO ADEUDOS FISCALES FIRMES A MI CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES.

COMUNICO QUE NO SE INCURRIÓ DURANTE EL AÑO 2016 EN LOS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO No. 66, FRACC. DE III, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ADEMAS COMUNICO A USTED ESTAR AL CORRIENTE CON LA DECLARACION ANUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR AL PRESENTE.

COMO PRUEBA DE LO ANTERIOR ANEXO, OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (POSITIVA), DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 32-D, DEL MISMO CODIGO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A USTED A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

ATENTAMENTE

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

✓ FECHA: 03 de marzo de 2017

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 17NA3602067

Clave de R.F.C.: MOLM820221DU2

Nombre, Denominación o Razón social: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓

Estimado contribuyente:



DIRECCIÓN
GENERAL DE
CBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 03 de marzo de 2017, a las 13:14 horas ✓

NOTAS:

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
2. Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
4. La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
5. Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMA;S elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original:

||MOLM820221DU2|17NA3602067|03-03-2017|P||000001000007000112188||

Sello Digital:

x+X+9gg7qpVsgPRHnVLhFqxSekLbPGw1cUd8pgNxx7Pu2TbjmfBepDwsZ30jZVEzc0SIbds7XD+QjQHmdXoD4Fo84R
dQo2S3AZLEqGY84IFWZisEmE02o7Oy3R1bUGFRRu1CjoeaLdj9RFbmVwkCbrqi8VwzqWe2U2QzmbaZ1E=

Maribel Moreno





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

CERTIFICADO DE NO ADEUDO

FOLIO: 12828

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DANDO UNA MINUCIOSA BÚSQUEDA EN LOS
ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA HACEMOS CONSTAR QUE EL C: _____

MORENO LOPEZ MARIBEL CRISTINA ✓

NO TIENE NINGÚN ADEUDO ANTE ESTE MUNICIPIO DE AHOME DE ACUERDO A LO QUE
ESTABLECE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL ARTÍCULO 4, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, POR CONCEPTO DE:
MULTAS MUNICIPALES Y FEDERALES, IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS Y PERMISOS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 03 ✓ DÍAS DEL MES DE MARZO ✓
DEL AÑO 2017 PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME PERTINENTE.

TRAMITE EXCLUSIVO ANTE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA

[Handwritten signature]

ATENTAMENTE

LIC. JOSE LUIS VALENZUELA
ENCARGADO DE DESPACHO

