



Sección de: D.G.O.P.  
 Oficio No.: S/N  
 Expediente:

**“2017, Año del Centenario del Municipio de Ahome”**

**L.C. Elliot Ascarrega Beltrán**  
**Tesorero Municipal,**  
**Municipio de Ahome.**  
 Presente. –



Asunto: **El que se indica**

Anexo al presente envío para su revisión y pago, Estimación no. 3 tres de la obra (Séptima del contrato) factura, verificación fiscal de factura, oficio de autorización de inversión, carta de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, recibo para pago de estimaciones, resumen de estimación, estado de cuenta, hojas de estimación, números generadores, carta de no adeudo fiscal, carta de no adeudo al buró municipal, reporte fotográfico, bitácora de obra y planos o croquis, de la siguiente obra:

Importe Total Estimado: \$ 3, 546,222.23

Importe Estimado a Pagar: \$ 2, 467,070.12

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016	-Construcción De Conjunto Deportivo "El Estero", Ubicado En Juan José Rios (El Estero), Municipio De Ahome, Sinaloa, Pavimento Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Servicios De La Calle Timoteo Feliz, De Eligio Armenta A Simón Soto Y Construcción De Banquetas Oriente Y Poniente De Cresencio Vázquez A Simón Soto, Construcción De Parque Lineal Mochichahui Ubicado En Dren Mochichahui De José Maria Morelos A Benito Juárez, En Los Mochis, Municipio De Ahome, Sinaloa. – y Rehabilitación De Conjunto De Parques Vecinales En El Fraccionamiento El Parque, Los Mochis, Municipio De Ahome, Sinaloa.	Maribel Cristina Moreno López

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración quedo de Ud. muy.

Atentamente  
**“AHOME, TRABAJAMOS CONTIGO”**  
 Los Mochis, Sin., 15 de Agosto de 2017

C. Ing. Josué Jacinto Sánchez Ruelas  
 Director General de Obras Públicas

- C.c.p' C. Lic. Pavel Roberto Castro Félix. -Director de Contraloría Municipal.
- C.c.p' C. Lic. Anselmo Acosta Bojórquez. -Director de Egresos.
- C.c.p' C. Daniel Kim Ortega. -Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.
- C.c.p' Archivo





AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

Municipio de Ahome

C. Lic. Arturo Duarte Garcia  
Presidente Municipal  
Presente:

Por medio del presente y ante la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios de la siguiente obra:

Núm.	Obra	Inversión (Importe Neto)	Origen del Recurso
1.-	Construcción de conjunto "Estero" ubicado en Juan José Ríos (El Estero) Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 6' 014,804.23	Recursos Federales del Programa Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Programas regionales 2016) Ejercicio fiscal 2016.

Y tomando en cuenta el presupuesto de la misma, hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para su ejecución.

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración al respecto, quedo de Ud. muy

Atentamente  
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"  
Los Mochis, Sin., a 01 de Octubre de 2016.

C. Lic. Juan Teodoro Félix  
Tesorero Municipal



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

C.C.P. C. Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya - Director General de Obras Públicas - Pte.  
C.C.P. Archivo -  
Ofinver



**MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ**  
 AV. PARQUE NOROESTE, OTE 540 Colonia: EL PARQUE  
 LOS MOCHIS AHOME SINALOA, MEXICO. C.P. 81259  
 RFC: MOLM820221DU2 CURP: MOLM820221MSLRPR01  
**Régimen Fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 TEL : (668) 190 28 90 EMAIL : maribelmoreno82@outlook.com

<b>Factura</b>
14
<b>Folio fiscal</b>
DDB370BC-5DEA-4786-8164-4822EB71E869
<b>No de Serie del Certificado del SAT</b>
00001000000403442064
<b>No. Certificado Emisor</b>
00001000000404363875
<b>Fecha de Certificación</b>
15/08/2017 11:00:28 a. m.
<b>Lugar y Fecha de Elaboración</b>
AHOME, SINALOA 15/08/2017 09:25:22 a. m.

**Cliente:**  
**MUNICIPIO DE AHOME**  
 DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N Colonia: BIENESTAR  
 LOS MOCHIS AHOME SINALOA, MEXICO. C.P. 81280  
 RFC: MAH1701013C0

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio U.	Importe
	PAGO DE ESTIMACION N° 3 TRES DE LA OBRA ( SEPTIMA DEL CONTRATO) RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DEL CONJUNTO DEPORTIVO " EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS ( EL ESTERO)", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE BANQUETA ORIENTE A PONIENTE DE CRESCENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES, EN FRACCIOMNAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO No. PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016	NA	1.000	3,057,088.13	3,057,088.13
	AMORTIZACION DE ANTICIPO	NA	1.000	-917,126.44	-917,126.44
	AMORTIZACION DE ANTICIPO \$1,063,866.67	NA			
	0.5% CONTROL DE VIGILANCIA \$15,285.44	NA			
	SUMA DE DEDUCCIONES \$1,079,152.11	NA			
	IMPORTE A RECIBIR \$2,467,070.12	NA			

**Subtotal: 2,139,961.69**

**Condiciones de pago:** Crédito **Método de pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos **Núm. Cta. Pago:** NO IDENTIFICADO  
**Moneda:** MXN **T.C.:** 1.00 **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición **"EFECTOS FISCALES AL PAGO"**

**IVA: 342,393.87**  
**Total: 2,482,355.56**

(SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)

*Manibela Moreno*

**Observaciones**



**Sello digital del CFDI**  
 JH5H fcknR1uCRcNsvAge7a5v187D2BvWVKZTYv4j1EeO8zTymQJ6Lp4yghH8u0u3T78o7ysT1uG1PuFZebwB7Wg2U9MypB3IAWytjXVp960IPb04EhFux9ngisGZ+x8D0nkRENK2EKKVtLxTr6PZVBNK5smEdJgDp10M02qZJ9N2b09K51D1Lm  
 xqWPMROJzBnCQWALP1xmrcA2b04JvnmNEG2AcRym4BkgQAs213qCbSLTzrM6bc9Wbyy95VSLhFW14ca+IF0lpy0ADTulpuG10FFDOLhMos2bnKpMWA\*\*

**Sello digital del SAT**  
 0VvkwQCRC5Dg9Gh84+J4mRnjf4k0v4c31CZNgv1W8Fm0cD11u1YngN8ouKk2Foy12W1D9D1S6GLAXNJ2zEhEgQMDtdCIBLs1Bna7Crd8Kwmy2zB0XqzhZDF1wllSgVA9py74KJN+EOBme+WQRZROGeChdeVnIKXsKqM4gr2ber1Bm79M4YL  
 z1x5G0ggVYXhetaXnhBVD0z+DF-c2W218m44NR1nckLH5pD9h4768D3y66CORLAn2x4uzmKJ3PpGDRYv5lR0U93v1MKA7wvz3dM11P+1P1PwEhstvw2RfIge\*\*

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 11.0(DDB370BC-SDEA-4786-8164-4822EB71E869)2017-08-  
 15T11:00:28JQ+H5HcknR1uCRcNsvAge7a5v187D2BvWVKZTYv4j1EeO8zTymQJ6Lp4yghH8u0u3T78o7ysT1uG1PuFZebwB7Wg2U9MypB3IAWytjXVp960IPb04EhFux9ngisGZ+x8D0nkRENK2EKKVtLxTr6PZVBNK5smEdJgDp10M02qZJ9N2b09K51D1Lm  
 b0K51D1LmWPMROJzBnCQWALP1xmrcA2b04JvnmNEG2AcRym4BkgQAs213qCbSLTzrM6bc9Wbyy95VSLhFW14ca+IF0lpy0ADTulpuG10FFDOLhMos2bnKpMWA\*\*+j00001000000403442064j

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SHCP



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen\*:

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

**RFC del emisor**

MOLM820221DU2

**Nombre o razón social del emisor**

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

**RFC del receptor**

MAH1701013C0

**Nombre o razón social del receptor**

MUNICIPIO DE AHOME

**Folio fiscal**

DDB370BC-5DEA-4786-8164-4822EB71E869

**Fecha de expedición**

2017-08-15T10:25:22

**Fecha certificación SAT**

2017-08-15T11:00:28

**PAC que certificó**

IAD121214B34

**Total del CFDI**

\$2,482,355.56

**Efecto del comprobante**

ingreso

**Estado CFDI**

Vigente



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME**  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS  
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN.



ESTIMACIÓN No.:

3 TRES DE LA OBRA (SÉPTIMA DEL  
CONTRATO)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRA- TISTA	RAZÓN SOCIAL:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ		
	DOMICILIO:	PARQUE NOROESTE # 540 OTE. FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, SINALOA.		
	CIUDAD:	LOS MOCHIS	ESTADO:	SINALOA

DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	21 DE OCTUBRE DEL 2016	IMPORTE DEL CONTRATO	
	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016			\$14,027,325.64	-IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:			IMPORTE DE LA OBRA	
	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			\$5,938,715.77	IVA INCLUIDO
				AÑO 2016	

BUENO POR: \$2,467,070.12

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:			
SON: ( DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS 12/100 M.N.)			
EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO			
COMPRENDIDO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016			
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN:			
	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$2,139,961.69	\$3,057,088.13	
I.V.A. 16%:	\$342,393.87	\$489,134.10	
SUMA:	\$2,482,355.56	\$3,546,222.23	
<b>DEDUCCIONES</b>			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (30%):		\$1,063,866.67	
RETENCIÓN 0.20% CONV. C.M.I.C. DE:			
RETENCIÓN 0.5% INSP. CONTROL Y VIG.:		\$15,285.44	
TOTAL DE DEDUCCIONES:		\$1,079,152.11	
<b>IMPORTE A PAGAR:</b>		<b>\$2,467,070.12</b>	
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A		20 DE DICIEMBRE	DE 2016

RECIBI <i>Maribel Moreno</i>	AUTORIZA 
C. MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ CONTRATISTA	ING. LINO EDDGARDO RÍOS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

IMPORTE A FACTURAR	\$2,482,355.56
IMPORTE A PAGAR	\$2,467,070.12



AYUNTAMIENTO DE AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME**  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTADO DE CUENTA

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

**ORIGEN DEL RECURSO:** RECURSOS FEDERALES CON CARGO A PROGRAMAS REGIONALES EN EL RENGLÓN DE DESARROLLO REGIONAL DEL ANEXO 20 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EJERCICIO FISCAL 2016, OTORGADOS MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 22/06/2016, ENTRE GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO DE AHOME POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30/06/2016.

**FECHA ACTUAL:**  
**20 DE DICIEMBRE DEL 2016**

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	\$ 14,027,325.64	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	\$ 4,208,197.69	CONTRATO No.:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
IMPORTE DE LA OBRA (NETO)	\$ 5,938,715.77	TOTAL ANTICIPO DE LA OBRA (NETO):	\$ 1,781,614.73	PERIODO DEL CONTRATO :	DIAS CALENDARIO:

				22 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	71
--	--	--	--	---	----

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
			AMORT. DE ANTICIPO	CMIC 0.2%	0.5% INS. Y VIG 0.50%	OTRAS (%)		
1 UNO DE LA OBRA (PRIMERA DEL CONTRATO)	DEL: 22-oct-16							
	AL: 20-dic-16	\$2,271,568.09	\$681,470.43	\$0.00	\$9,791.24	\$691,261.67	\$1,580,306.42	
2 DOS DE LA OBRA (SEGUNDA DEL CONTRATO)	DEL: 21-dic-16							
	AL: 26-dic-16	\$523,162.53	\$156,948.76	\$0.00	\$2,255.01	\$159,203.77	\$363,958.76	
1 UNO DE LA OBRA (TERCERA DEL CONTRATO)	DEL: 22-oct-16							
	AL: 22-nov-16	\$459,107.98	\$137,732.39	\$0.00	\$1,978.91	\$139,711.30	\$319,396.68	
1 UNO DE LA OBRA (CUARTA DEL CONTRATO)	DEL: 22-oct-16							
	AL: 15-nov-16	\$878,590.43	\$263,577.13	\$0.00	\$3,787.03	\$267,364.16	\$611,226.27	
2 DOS DE LA OBRA (QUINTA DEL CONTRATO)	DEL: 23-nov-16							
	AL: 30-nov-16	\$628,196.78	\$188,459.03	\$0.00	\$2,707.74	\$191,166.77	\$437,030.01	
2 DOS DE LA OBRA (SEXTA DEL CONTRATO)	DEL: 16-nov-16							
	AL: 10-dic-16	\$1,075,941.69	\$322,782.51	\$0.00	\$4,637.68	\$327,420.19	\$748,521.50	
3 TRES DE LA OBRA (SÉPTIMA DEL CONTRATO)	DEL: 11-dic-16							
	AL: 20-dic-16	\$3,546,222.23	\$1,063,866.67	\$0.00	\$15,285.44	\$1,079,152.11	\$2,467,070.12	
TOTALES:		\$9,382,789.73	\$2,814,836.92	\$0.00	\$40,443.05	\$2,855,279.97	\$6,527,509.76	
SALDO DE LA OBRA (POR ESTIMAR):			\$437,961.42	ANTICIPO POR AMORTIZAR DE LA OBRA:		\$131,888.42		
SALDO DE CONTRATO (POR ESTIMAR):			\$4,644,535.91	ANTICIPO POR AMORTIZAR DEL CONTRATO:		\$1,393,360.77		

<p>CONFORME</p> <p><i>Maribel Cristina Moreno López</i></p> <p>MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ</p> <p>CONTRATISTA</p>	<p>REVISÓ</p> <p><i>Arq. Francisco Ordóñez Guillén</i></p> <p>ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN</p> <p>SUPERVISOR</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p><i>Ing. Enrique Zárate Gaxiola</i></p> <p>ING. ENRIQUE ZÁRATE GAXIOLA</p> <p>RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN</p>	<p>APRUEBA</p> <p><i>Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya</i></p> <p>ING. LINO EDDGARDO RÍOS MONTOYA</p> <p>DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</p>
---	--	---	---



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PERIODO DEL **11 DE DICIEMBRE** AL **20 DE DICIEMBRE** DE **2016** FECHA: **20 DE DICIEMBRE DE 2016**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

CONTRATO: **PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**

CONTRATISTA: **MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ**

No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES
1	EST. 1 UNO DE LA OBRA (PRIMERA DEL CONTRATO)	\$1,958,248.35	\$3,057,088.13	30% ANTICIPO
2	EST. 2 DE LA OBRA (SEGUNDA DEL CONTRATO)	\$451,002.18		
3	EST. 1 UNO DE LA OBRA (TERCERA DEL CONTRATO)	\$395,782.74		
4	EST. 1 UNO DE LA OBRA (CUARTA DEL CONTRATO)	\$757,405.54		
5	EST. 2 DE LA OBRA (QUINTA DEL CONTRATO)	\$541,548.95		
6	EST. 2 DE LA OBRA (SEXTA DEL CONTRATO)	\$927,535.94		
7	EST. 3 DE LA OBRA (SÉPTIMA DEL CONTRATO)			
IMPORTE DE LA OBRA:		\$5,938,715.77		ESTIMACIONES ANT.: \$1,750,970.25
		ANTICIPO DE LA OBRA	\$1,781,614.73	
ESTIMADO A LA FECHA		\$5,500,754.35		ESTA ESTIMACIÓN: \$1,063,866.67
		AMORTIZADO	\$1,650,226.31	
SALDO (POR ESTIMAR):		\$437,961.42		TOTAL RETENIDO A LA FECHA: \$2,814,836.92
		POR AMORTIZAR	\$131,388.42	0.5% CONTROL Y VIGILANCIA
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		\$917,126.44	SUBTOTAL	ESTIMACIONES ANT.: \$25,157.61
IVA		\$146,740.23	I.V.A.:16 %	ESTA ESTIMACIÓN: \$15,285.44
TOTAL DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		\$1,063,866.67	TOTAL:	TOTAL RETENIDO A LA FECHA: \$40,443.05
			\$5,836,567.50	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA: \$2,855,279.97

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN: SON ( TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 23/100 M.N.)

ESTADO CONTABLE		ANTICIPO	
	IMPORTE DEL CONTRATO		IMPORTE DEL CONTRATO
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$14,027,325.64	ANTICIPO DEL CONTRATO:	\$4,208,197.69
ESTIMADO A LA FECHA	\$9,382,789.73	AMORTIZADO A LA FECHA:	\$2,814,836.92
SALDO (POR ESTIMAR):	\$4,644,535.91	SALDO POR AMORTIZAR:	\$1,393,360.77

CONFORME *Manuel* REVISÓ Vo.Bo. APRUEBA

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA ING. LUIS EDUARDO RÍOS MONTROYA



CONTRATISTA SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

 <p>AYUNTAMIENTO DE AHOME</p>	<p><b>MUNICIPIO DE AHOME</b> DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN</p>	 <p><b>Ahome</b> Es la fuerza de su gente</p>	<p>ESTIMACION No.3 TRES DE LA OBRA (SÉPTIMA DEL CONTRATO)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>HOJA:</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>DE:</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	HOJA:	1	DE:	1
HOJA:	1						
DE:	1						

PERIODO:	DEL: <b>11 DE DICIEMBRE</b>	AL: <b>20 DE DICIEMBRE</b>	DEL AÑO:	FECHA: <b>20 DE DICIEMBRE DEL 2016</b> 2016
----------	-----------------------------	----------------------------	----------	--

<p>OBRA: <b>CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.</b> PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.</p>	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
	CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I	CAMPO DEPORTIVO EN JUAN JOSÉ RÍOS								
I.3	CAMPO DE FÚTBOL								
I.3.1	CAMPO DEPORTIVO								
I.3.1.10	SUMINISTRO DE PASTO SINTÉTICO MARCA PRO FIBRATADO O CALIDAD SIMILAR DE 50MM Y 850 GR, INCLUYE: IMPORTACIÓN, FLETES, DESPERDICIO, CORTES, PINTURA EN LÍNEA DE JUEGO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M2	1 DE 1	5,067.65	5,203.20	0.00	5,203.20	\$587.54	\$ 3,057,088.13
TOTAL DE CAMPO DEPORTIVO: \$ 3,057,088.13 TOTAL DE CAMPO DE FÚTBOL: \$ 3,057,088.13 TOTAL DE CAMPO DEPORTIVO EN JUAN JOSÉ RÍOS: \$ 3,057,088.13 I.V.A. (16%): \$ 489,134.10 TOTAL DE ESTIMACIÓN: \$ 3,546,222.23									

<p>CONFORME</p> 	<p>REVISÓ</p> 	<p>Vo.Bo.</p> 	<p>APRUEBA</p> 
<p>C. MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ CONTRATISTA</p>	<p>ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN SUPERVISOR</p>	<p>ING. ENRIQUE ZÁRATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN</p>	<p>ING. LINO EDDGARDO RÍOS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</p>



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Es la fuerza de su gente

GENERADORES

HOJA	1
DE	1

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ
CALCULÓ: ARQ. J.L.G.A.		FECHA:	20 DE DICIEMBRE DEL 2016

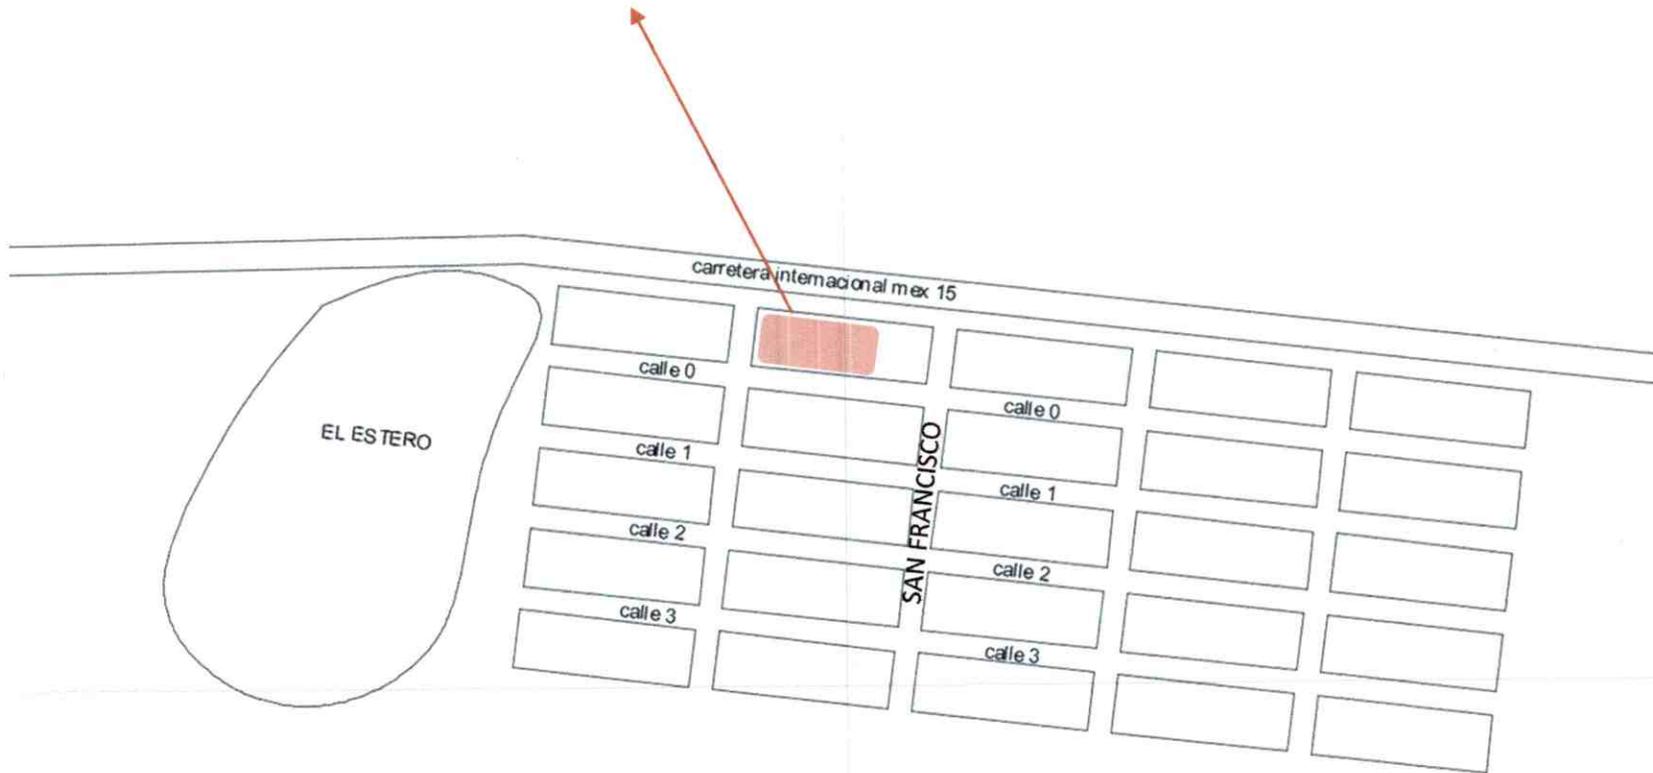
No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO						CANTIDAD	
1	CAMPO DEPORTIVO EN JUAN JOSÉ RÍOS										
1.3	CAMPO DE FÚTBOL										
1.3.1	CAMPO DEPORTIVO										
1.3.1.10	SUMINISTRO DE PASTO SINTÉTICO MARCA PRO FIBRATADO O CALIDAD SIMILAR DE 50MM Y 850 GR, INCLUYE: IMPORTACIÓN, FLETES, DESPERDICIO, CORTES, PINTURA EN LÍNEA DE JUEGO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	A-B	1-2		M2	96.00	54.20			5,203.20	

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN  
SUPERVISOR DE OBRA

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ  
CONTRATISTA

# CROQUIZ

UBICACIÓN DE CANCHA DE FUT BOL





AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

34

UBICACIÓN:


JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATISTA:

MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ

CONTRATO:

PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
034	11/DIC/2016 (TRABAJOS)	<p>SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENDES:</p> <p>SE LEVANTA A CABO EL SUMINISTRO DE PASTO SINTÉTICO QUE SE COLOCARÁ EN LA BASE COMPLETADA CONSTRUIDA PARA CANCHAL DE FUTBOL SOCCER.</p> 

Maribel Moreno López

2



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

35

UBICACIÓN:


JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATISTA:

MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ

CONTRATO:

PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
035	12/12/2016 (TRABAJOS)	<p>SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENDES:</p> <p>SE REALIZÓ TRAZO Y ESCUADRE DEL ÁREA A CUBRIR CON PASTO SINTÉTICO.</p> <p>SE INICIAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRADO DE 50 mm. y 850 gr./m<sup>2</sup>.</p> <p>- UNIÓN ENTRE BORDES DE PASTO MEDIANTE COSIDO MECÁNICO (MÁQUINA DE COSER)</p> 

manifiesta  
manera.



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

36

UBICACIÓN:

JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATISTA:

MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ

CONTRATO:

PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
036	12/11/2016 (CROQUIS)	<p>SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENTE:</p> <p>CONJUNTO DEPORTIVO EL ESTERO J.J. RÍOS</p>

maribel  
moreno



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

37

UBICACIÓN:


JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATISTA:

MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ

CONTRATO:

PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
037	15/ DIC / 2016 (TRABAJOS)	<p>SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENDES:</p> <p>SE CONTINÚAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRILADO DE 50 MM. Y 850 GR./M<sup>2</sup>.</p> <p>- UNIÓN ENTRE BORDES DE PASTO MEDIANTE COSIDO MECÁNICO (MÁQUINA DE COSER DE 4 HILOS)</p> 

maribel  
moreno



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

38

UBICACIÓN:


JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATISTA:

MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ

CONTRATO:

PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
038	19/DIC/2016 (TRABAJOS)	<p>SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENDES:</p> <p>SE CONTINÚAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRILADO DE 50 MM. Y 850 GR/M2.</p> <p>- UNIÓN ENTRE BORDES DE PASTO MEDIANTE COSIDO MECÁNICO (MÁQUINA DE COSER DE 4 HILOS).</p> <p>SE REDUZA TIRADO Y ESCUADRE DE LÍNEAS DE JUEGO OFICIALES</p> <p>SE REDUZA INSTALACIÓN DE LÍNEAS BARRIDAS CON ADHESIVO DE LATEX Y CINTA UNIÓN ESPECIAL DE IMPORTACIÓN.</p> 

Maribel  
Moreno



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VÁZQUEZ A SIMÓN SOTO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUÁREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

39

UBICACIÓN:


JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATISTA:

MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ

CONTRATO:

PROGREG-DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
039	20/DIC/2016 (TRABAJOS)	<p>SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EL SIGUIENTE AVANCE POR FRENTES:</p> <p>SE TERMINAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO Y LA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE JUEGO OFICINALES.</p> <p>SE REDUZAN RELLENOS: CON ARENA SILÍCEA (28 KG/M2) Y CACHO GRANULAR DE 3-5 MM. (8 KG/M2).</p> 

maribel moreno

MC CONSTRUCCIONES

Parque Noroeste # 540 Ote. fracc. El Parque

C.P.: 81 259

R.F.C.: MOLM820221DU2



LOS MOCHIS, SIN., A 14 DE AGOSTO DEL 2017

**C. ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS**  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.  
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" LO SIGUIENTE:

1).-HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y EN FORMA LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES A LOS 5 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES; ASI COMO TAMBIEN HEMOS PRESENTADO LAS DECLARACIONES QUE CONTIENEN LOS PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS 5 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES.

2).-QUE NO TENGO ADEUDOS FISCALES FIRMES A MI CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES.

COMUNICO QUE NO SE INCURRIÓ DURANTE EL AÑO 2016 EN LOS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO No. 66, FRACC. DE III, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ADEMAS COMUNICO A USTED ESTAR AL CORRIENTE CON LA DECLARACION ANUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR AL PRESENTE.

COMO PRUEBA DE LO ANTERIOR ANEXO, OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (POSITIVA), DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 32-D, DEL MISMO CODIGO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A USTED A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

ATENTAMENTE

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

◆◆◆

◆◆

◆◆◆◆◆

◆◆◆

◆

◆◆◆◆◆

◆

◆◆

FECHA: 14 de agosto de 2017

## Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 17NB2983898  
Clave de R.F.C.: MOLM820221DU2  
Nombre, Denominación o Razón social: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

### Estimado contribuyente:

#### Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 14 de agosto de 2017, a las 11:56 horas

#### NOTAS:

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
2. Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
4. La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
5. Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMA<sub>LS</sub> elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

#### Cadena Original:

||MOLM820221DU2|17NB2983898|14-08-2017|P||000001000007000112188||

#### Sello Digital:

LgVMs3vQOH9E2JErXDtFin6mD62KgFPFk0r11Bx0/jH/ovajmHEsT4rjWpyAEDUrI5vq59b1Pt7iPuscVCqpkcFX11  
v1C3WnNf1Ei+A79bv4NZ5ATzi6eam51o7U5Xwb3iKxpz1ulcUovs9SBHOAdrIcCv8rJE0ds/R1DJewRA4=





AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

## CERTIFICADO DE NO ADEUDO

FOLIO: 15856

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DANDO UNA MINUCIOSA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA HACEMOS CONSTAR QUE EL C: \_\_\_\_\_

**MORENO LOPEZ MARIBEL CRISTINA**

NO TIENE NINGÚN ADEUDO ANTE ESTE MUNICIPIO DE AHOME DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL ARTÍCULO 4, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, POR CONCEPTO DE: MULTAS MUNICIPALES Y FEDERALES, IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS Y PERMISOS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 08 DÍAS DEL MES DE AGOSTO  
17  
DEL AÑO 20\_\_\_\_ PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME PERTINENTE.

**TRAMITE EXCLUSIVO PARA OBRAS PUBLICAS  
CONTRATISTA**

ATENTAMENTE



GOBIERNO  
MUNICIPAL  
AHOME

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS VALENZUELA OSORNIO  
DIRECTOR DE INGRESOS

*Maribel Moreno*

**AHOME**  
TRABAJAMOS CONTIGO
