



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLONICA, POSTES Y REJACERO UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #94, COL. NUEVO HORIZONTE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-006-15

PROGRAMA:

MONTO: \$ 605,286.03

SUBPROGRAMA:

FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 27/02/15 REAL 27/02/15

FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 28/03/15 REAL 28/03/15

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA FRANK-FER, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SONORA No. 1853 PTE., COL. ESTRELLA, LOS MOCHIS, SINALOA

TELÉFONOS:

TIPO DE TRABAJO: CONSTRUCCION DE BARDA

REPRESENTANTE: ING. FRANCISCO GASTELUM GASTELUM

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1.- CONSTRUCTORA FRANK-FER S.A. DE C.V.

2.- REPRESENTANTE LEGAL

3.-

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:

DEL MUNICIPIO DE AHOME

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON

SUPERVISOR DE OBRA





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLONICA, POSTES Y REJACERO UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #94, COL. NUEVO HORIZONTE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 001

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FRANK-FER S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-006-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

#1 27/02/15 Se inicia con la construcción de
Cerca perimetral en Secundarias
Ubicada en el fracc. Nvo.
horizonte, se colocan Nivellos
> se realiza trazo


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLONICA, POSTES Y REJACERO UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #94, COL. NUEVO HORIZONTE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FRANK-FER S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-006-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#2	2/10/3/15	Se desmonta cerca existente de Malla soldada y se inicia con las excavaciones para construcción de cerco, simultaneamente se trabaja en habilitando de acero para los de replante y arbolado





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

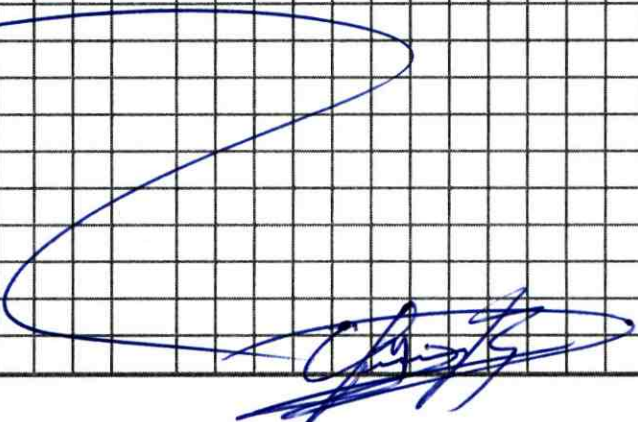
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE
MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLONICA, POSTES Y REJACERO
UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #94, COL. NUEVO
HORIZONTE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 003

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FRANK-FER S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-006-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#3	5/03/15	Se realiza Colado de concreto, Se elabora convenio ampliatorio ya que la cantidad de ml de block que existe en proyecto no, son suficientes para la construcción de ml de barrido proyectado o real a construir  



DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

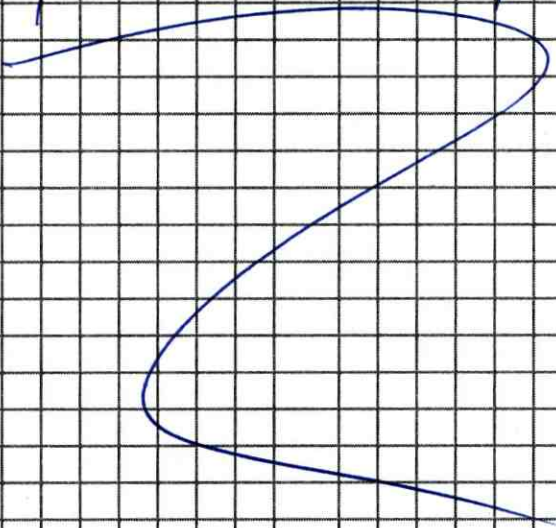


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE
MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLONICA, POSTES Y REJACERO
UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #94, COL. NUEVO
HORIZONTE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA✓

HOJA DE BITACORA No. 004

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FRANK-FER S.A. DE C.V.✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-006-15✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#9	9/03/15	Se continua con el cobado de dado y se inicia con la colocación de Arco y cimbras para data de desplante 
		 



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

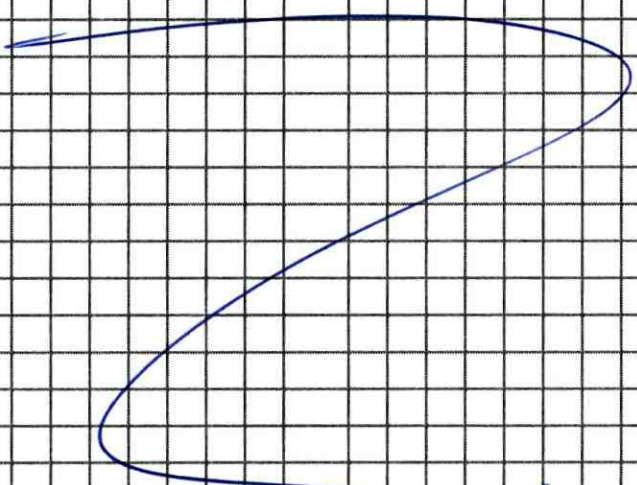
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLONICA, POSTES Y REJACERO UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #94, COL. NUEVO HORIZONTE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FRANK-FER S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-006-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#5	12/03/15	Se termina el trabajo de colado de dador y se inicia con el colado de dala de desplante en perimetro de cercas   


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

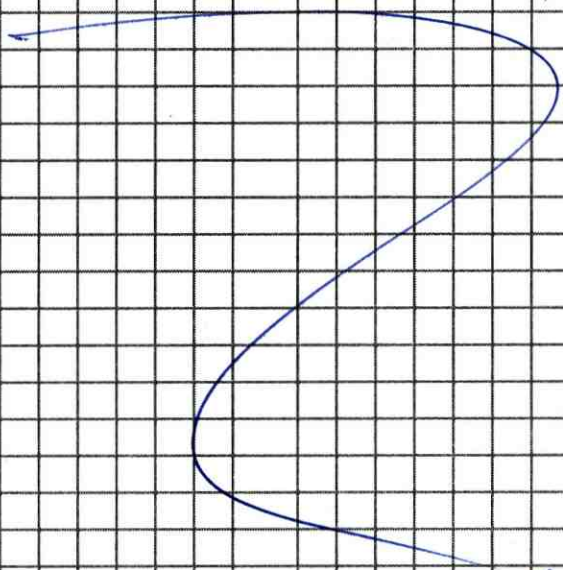
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLONICA, POSTES Y REJACERO UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #94, COL. NUEVO HORIZONTE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 006

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FRANK-FER S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-006-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#6	15/03/15	Se continua con el habilitado y colado de data de deplante, Simultaneamente se coloca Muro de block (2 mltados) 
		 





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

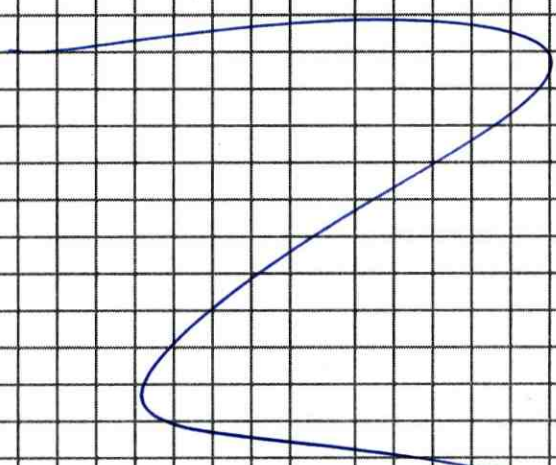
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE
MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLONICA, POSTES Y REJACERO
UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #94, COL. NUEVO
HORIZONTE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 007

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FRANK-FER S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-006-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#7	19/03/15	Se continua con la construcción de Muro de block, y se insere con el habilitado de Acero y cimbra para colado de repozón de concreto
		
		
		

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

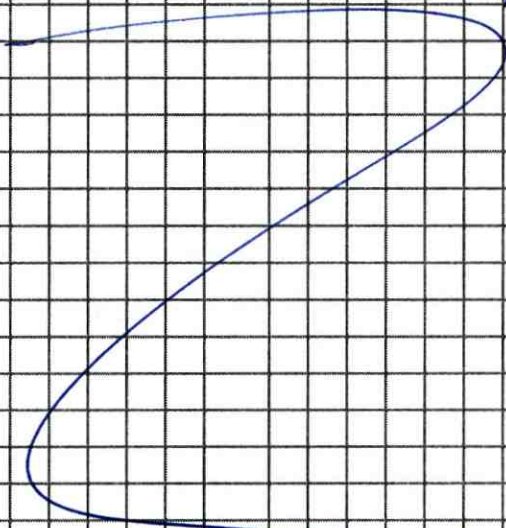
OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLONICA, POSTES Y REJACERO UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #94, COL. NUEVO HORIZONTE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 009

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FRANK-FER S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-006-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#9	23/03/15	Se inicia con la colocación de Malla ciclónica en banda lateral y rejadero en cerca frontal, tal y como se indica en proyecto
		
		
		


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

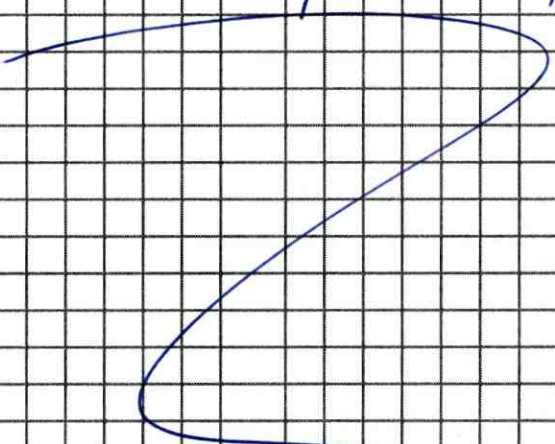
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLONICA, POSTES Y REJACERO UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #94, COL. NUEVO HORIZONTE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 010

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FRANK-FER S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-006-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#10	25/03/15	se colocan espada y clamping de pvc en todo el perimetro, se colocan 2 puertas vehiculares, se termina de colocar Malla, rejis y Barras superiores y Retenidas   


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

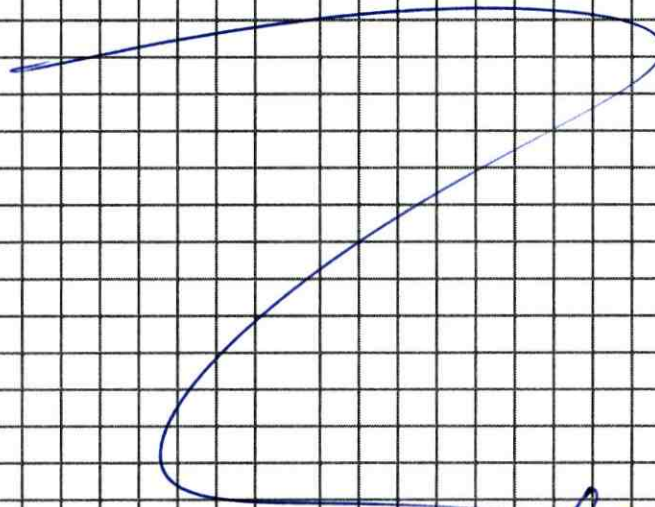

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLONICA, POSTES Y REJACERO UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #94, COL. NUEVO HORIZONTE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 011

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FRANK-FER S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-006-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#11	28/03/15	Se pinta Bordo, frontal y se realiza limpieza general de la obra. Se cierra la presente Bitacora!   


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN
