



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE:

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O MALEZA DE DRENES, ESTADIO, TERRENOS OFICIALES, DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

UBICACIÓN:

DIFERENTES PUNTOS DE EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

No. CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-015-15

PROGRAMA

MONTO :

750,566.40, IVA INCLUIDO

SUBPROGRAMA

FECHA DE INICIO:

PROGRAMADA 27 FEB 2015 REAL: 27 FEB 2015

FECHA DE TERMINO:

PROGRAMADA 26 JUN 2015 REAL: ?

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RALMA MONTAJES S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO: CIRCUITO VILLA PAZCUARO No. 2892, COLONIA VILLAS DEL RIO

TELÉFONOS: (668) 8-15-94-92

TIPO DE TRABAJO:

REPRESENTANTE: LIC. CASIMIRO QUIROZ ESTRADA

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1.-

LIC. CASIMIRO QUIROZ ESTRADA
RESIDENTE

2.-

3.-

DEL MUNICIPIO DE AHOME

ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O
MALEZA DE DRENES, ESTADIO, TERRENOS OFICIALES,
DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 01

UBICACIÓN:

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

CONTRATISTA:

RALMA MONTAJES S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-015-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

01

27/02/2015

Con esta fecha 27/02/2015 se abre la
siguiente Bitacora referente a los trabajos
de limpieza y carga de escombros y/o maleza
de drenes, Estadio, Terrenos Oficiales, Demoliciones
en distintos puntos del Municipio de Ahome,
Sinaloa.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O
MALEZA DE DRENES, ESTADIO, TERRENOS OFICIALES,
DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 02

UBICACIÓN:

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

CONTRATISTA:

RALMA MONTAJES S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-015-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

02

28/02/2015

Se Informa que los dias 27 y 28 de febrero
del 2015 se da inicio con los trabajos de
limpieza y desazolve de dren. por el -
Buz. Mariana Gaxiola y Catteriano entre l.
de las instalaciones del Edificio de Segunda
pública municipal y por lo cual se trabajan
(16 Hrs Efectivas).

También se Informa que Inicio los
trabajos sin haber recibido aun el Activo
del Contrato.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

2.3.4.T, 6.7
02 - 07 Marzo



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O
MALEZA DE DRENES, ESTADIO, TERRENOS OFICIALES,
DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 03

UBICACIÓN:

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

CONTRATISTA:

RALMA MONTAJES S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-015-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
03.	07/marzo/15	Se Informa que los días 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de marzo se continúa trabajando con la Retro Excavadora, en las limpiezas de terrenos y desarrollo de drenes. Con esta fecha se desarrollan trabajos de desarrollo del dren y limpieza de terreno en Blvd. Mariano Gaxiola y Blvd. Centenario. Se trae a la Oficialía de Seguridad Pública municipal terrenos en los cuales se concluyen dichos trabajos. También se inicia con la demolición de marquesinas en mal estado y carga de escombros producto de las demoliciones en el centro de la Ciudad de los machis, sin por otra parte se inicia con la limpieza carga de Basura y Tierra en Areas Deportivas de la colonia Alamos # 2 por el Blvd. Chihuahuita. Con dichos trabajos desarrollados durante estos días se llevan a cabo 07. (50 Hrs Efectivas) de Trabajo con la Retro Excavadora.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O
MALEZA DE DRENES, ESTADIO, TERRENOS OFICIALES,
DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 05

UBICACIÓN:

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

CONTRATISTA:

RALMA MONTAJES S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-015-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

05. 21/marzo/2015

Se informa que los días 16, 17, 18, 19, 20 y
21 de marzo del 2015.
Se inicia con los trabajos de desazolve
del dren pluvial ubicado por la Av.
División del Norte entre las calles -
Santos Degollado y la calle Gabriel-
León en la colonia Texcal de los
Mochis Sinaloa
dichos trabajos se llevan a cabo con una
Puma Excavadora con la cual se desazolve
(53) Horas Efectivas de Trabajo



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O
MALEZA DE DRENES, ESTADIO, TERRENOS OFICIALES,
DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 06

UBICACIÓN:

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

CONTRATISTA:

RALMA MONTAJES S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-015-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

06

28/marzo/15

Se continua trabajando con la Retroexcavadora
las dia. 23, 24, 25, 26, 27, 28 de marzo
del 2015
Se sigue con la limpieza (desazolve) del
dren pluvial ubicado por la Av. Division
del Norte entre Calle Santos degollado
y la calle Gabon el agua. en la colonia.
Texas delos machos Sinaloa.
en cuya limpieza se trabajan 53 Hrs
Efectuales de Trabajo



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O
MALEZA DE DRENES, ESTADIO, TERRENOS OFICIALES,
DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 07

UBICACIÓN:

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

CONTRATISTA:

RALMA MONTAJES S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-015-15

No. DE
NOTA


FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

07

02/Abril/2015

Se informa que los días 30 y 31 de
marzo y 01, 02 de abril del 2015
se continúa trabajando con la limpieza
y desazolve del dren pluvial ubicado
por Av. División del Norte entre Santos
decedado y la calle Gabriel Leyva de
la colonia Texas Lormachil Sinaloa
dichos trabajos se llevan a cabo con
una Retroexcavadora en (35) hrs.
efectivas de trabajo

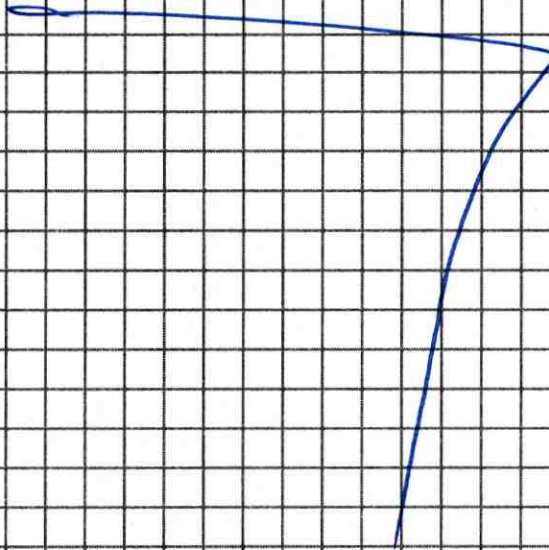

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O
MALEZA DE DRENES, ESTADIO, TERRENOS OFICIALES,
DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 08

UBICACIÓN:

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

CONTRATISTA:

RALMA MONTAJES S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-015-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

08

11/06/15

Se Informa que los días 06, 07 y 08.
09, 10 y 11 de Abril del año 2015 -
se Continúa trabajando con la -
Retro Excavadora en la limpieza
derrolve del dren pluvial ubicado
por la Av. División del Norte entre
las calles Gabriel Reyna y Santos.
de la colonia de la colonia Texas
de los Machis Sinaloa.
en dichos días se trabajó (53) Hrs



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O
MALEZA DE DRENES, ESTADIO, TERRENOS OFICIALES,
DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 09

UBICACIÓN:

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

CONTRATISTA:

RALMA MONTAJES S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-015-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

09. 18/Abr/15

Se Informa que los días 13, 14, 15, 16,
17 y 18 de abril/2015 continúan
fechas. Se continúa trabajando con
la Retroexcavadora en la limpieza y
desdoble del dren pluvial ubicado
por la Av. División del Norte entre
las calles Santos degobado y Gabriel
Leyva en la Colonia Texas. La mancha
Sinaloa. y se llevan Acaba (53 Hrs
Efectivos de trabajo efectivo.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O
MALEZA DE DRENES, ESTADIO, TERRENOS OFICIALES,
DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 10

UBICACIÓN:

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

CONTRATISTA:

RALMA MONTAJES S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-015-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

10.

25/Abril/15

Se informa que los días 20, 21, 22,
23, 24 y 25 abril del 2015
Se continúa trabajando con la máquina
retroexcavadora en la limpieza y carga
de escombros en la Ciudad Deportiva
Ubicada en Santos degollado y Av. 10
de mayo. También se trabaja en la
limpieza, carga de escombros y basura
en el E. 5 de mayo Municipio de Ahome
en dichos trabajos se desarrollan -
(53) HRS Efectivos de Trabajo





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O
MALEZA DE DRENES, ESTADIO, TERRENOS OFICIALES,
DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 11

UBICACIÓN:

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

CONTRATISTA:

RALMA MONTAJES S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-015-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
11	02/mayo/15	Se informa que los días 27, 28, 29, 30 abril y el 01 de mayo 2015 se continuó trabajando con la Petro- Excavadora y con la Petroexcavadora Adaptada con Motomartillo los cuales trabajan en la demolición de Edificios (viviendas) en mal estado en el campo pesquero el Colorado. Dichos trabajos se llevan a cabo en - (106) hrs de trabajo efectivo. También se ordena al contratista que deberá cargar el escombros para ser retirados del lugar de las demoliciones.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O
MALEZA DE DRENES, ESTADIO, TERRENOS OFICIALES,
DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 12

UBICACIÓN:

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

CONTRATISTA:

RALMA MONTAJES S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-015-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

11

09/MAYO/15

Se Informa que los días 04, 05, 06, 07
08 y 09 de mayo de 2015
Se sigue trabajando con la Retroexcavadora
en la demolición de edificios en mal estado
en el campo pesquero el colorado municipio
de Ahome y en estos días se Trabajan
(53) HRS EFECTIVAS de mayo



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN
