



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R., TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME, SINALOA

UBICACIÓN: LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME, SINALOA

No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-025-15 PROGRAMA

MONTO : 285,877.77 IVA INCLUIDO SUBPROGRAMA

FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 20/MARZ/2015 REAL: 20/MARZ/2015

FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 18/ABR/2015 REAL: 18/ABR/2015

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RENE ODILON CARDENAS GARCIA

DOMICILIO: CALLE TULIPANES No. 1128, JARDINES DEL FATIMA, LOS MOCHIS, SINALOA

TELÉFONOS: (668) 8-15-41-48

TIPO DE TRABAJO:

REPRESENTANTE: RENE ODILON CARDENAS GARCIA

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1.- 
RENE ODILON CARDENAS GARCIA
RESIDENTE

2.- _____

3.- _____

DEL MUNICIPIO DE AHOME


ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:



DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R.,
TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME,SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 02

UBICACIÓN:

LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA,
SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA:

RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

002

20-mar-15

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE
CONTRATO, CON EL DESMANTELAMIENTO DE LA CERCA EXISTENTE EN
MAL ESTADO Y LAS DEMOLICIONES





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R.,
TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME,SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 04

UBICACIÓN:

LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA,
SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA:

RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
004	26-mar-15	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DE POSTES A BASE DE P.T.R. DE 3"X3" COMO ESQUINEROS,DE REFUERZO Y DE PUERTAS
		SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE POSTES DE LINEA A BASE DEP.T.R. DE 2"X 2" EN LALINEA DE ENFRETE DE LA ESCUELA
		SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LOS MUERTOS DE CONCRETO PARA LA CERCA DE MALLA CICLONICA
		SE COLOCAN LAS ESPADAS A BASE DE P.T.R. DE 2" X 2"
		SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE EL BASTIDOR A BASE DE P.T.R. DE 2"
		
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R.,
TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 05

UBICACIÓN:

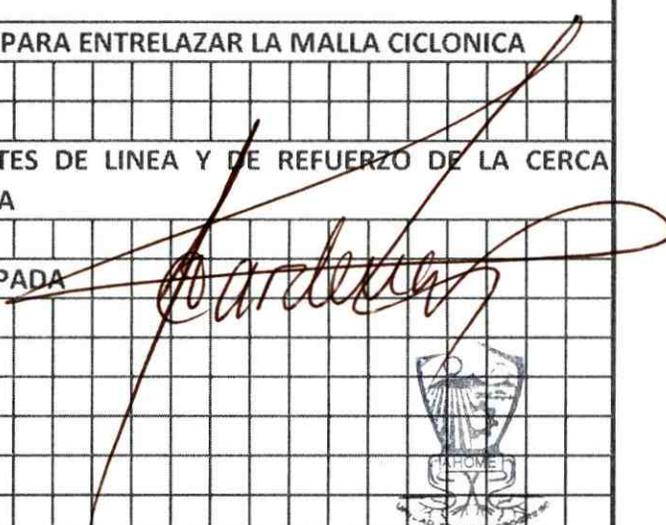

LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA,
SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA:

RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
005	31-mar-15	SE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO EN LOS SIGUIENTES FRENTES
		COLOCACION DE LA MALLA FORRADA DE PVC EN LA LINEA DE ENFRETE DE LA ESCUELA
		HABILITADO Y COLOCADO DE EL ACERO PARA LA CADENA DE DESPLANTE
		CIMBRADO DE LA CADENA DEDESPLANTE EN LA LINEA DE ENFRETE DE LA ESCUELA
		SE COLOCA LA SOLERA PARA ENTRELAZAR LA MALLA CICLONICA
		COLOCACION DE POSTES DE LINEA Y DE REFUERZO DE LA CERCA LATERAL DE LA ESCUELA
		COLOCACION DE LA ESPADA
		
		
		
		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R.,
TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 06

UBICACIÓN: LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA,
SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA: RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
006	02-abr-15	SE TERMINA EL COLADO DE LA DALA DE DESPALNTE EN LA LINEA DE ENFRENTA DE LA ESCUELA
		SE INICIA LA COLOCACION DE LAS TRES LINEAS DE EL ALAMBRE DE PUAS DE LA LINEA DE ENFRENTA DE LA ESCUALA
		SE COLOCA LA MALLA CICLONICA EN EL LADO ISQUIERDO DE LA ESCUELA
		
		
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R.,
TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME,SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 07

UBICACIÓN:

LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA,
SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA: RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
007	04-abr-15	SE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE OBRA EN LOS SIGUIENTES FRENTE
		HABILITADO Y COLOCADO DE EL ACERO DE LA DALA DE DESPLANTE
		CIMBRADO Y COLADO DE LA DALA DE DESPLANTE DE LA LINEA DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN EL LADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA
		<i>HSS</i>
		<i>Cardenas</i>





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 08

UBICACIÓN:

LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA:

RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
008	07-abr-15	SE CONTINUA CON EL COLADO DE LA DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" EN EL LADO IZQUIERDO DE LA ESCUALA
		SE COLOCA Y SE COMPACTA EL BALASTRE CRIBADO EL LALINEA DE EL CERCO ATRAZ DE LA ESCUELA
		SE HABILITA EL ACERO DE REFUERZO DE LA DALA DE DESPLANTE
		





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R.,
TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 10

UBICACIÓN:

LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA,
SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA:

RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
010	11-abr-15	SE TERMINA LA COLOCACION DE LA BARRA SUPERIOR EN LA PARTE DE EL CERCO DE MALLA CICLONICA
		SE CONTINUA CON EL COLADO DE LA DALA DE DESPLANTE EN LALINEA DE CERCO DE ATRAS DE LA ESCUELA
		SE COLOCAN LAS AESPADAS DE LA LINEA DEL CERCA DE LA PARTE DE ATRAS DE LA ESCUELA
		
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R.,
TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME,SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 11

UBICACIÓN:

LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA,
SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA:

RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

011

13-abr-15

SE COLOCAN LAS PUERTAS, TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR, A
BASE DE P.T.R. DE 2" Y POSTES DE REFUERZOS DE P.T.R. DE 3" X 3" Y
MALLA CICLONICA

SE TERMINA EL COLADO DE LA DALA DE DESPLANTE DE LA PARTE DE
ATRÁS DE LA ESCUELA

SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA DETALLAR DONDE SE SOLDÓ LA
SOLERA PARA ENTRELAZAR LA MALLA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R.,
TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME,SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 12

UBICACIÓN:

LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA,
SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA:

RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA


NOTAS Y CROQUIS

012

15-abr-15

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DE LAS TRES LINEAS DE
ALAMBRE DE PUAS DE LA LINEA DE CERCO DE ATRÁS DE LA ESCUELA

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EL ACARREO DE LOS MATERIALES
SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y DE LA DEMOLICIONES FUERA DE
LA OBRA



DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R.,
TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME,SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 13

UBICACIÓN:

LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA,
SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA:

RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

013

17-abr-15

SE CONTINUA CON EL ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE
LA EXCAVACIONES Y DE LA DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
TANTO EN INTERIORES COMO EN LOS EXTERIORES, PARA LA ENTREGA
DE LA OBRA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R.,
TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 14

UBICACIÓN:

LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA,
SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA: RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

014

18-abr-15

CON LA TERMINACION DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE EL
ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LA EXCAVACIONES Y
LAS DEMOLICIONES Y LA TERMINACION DE LA REALIZACION DE LA
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, SE TERMINAL AL **100 %** LOS
TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R.,
TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME,SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 15

UBICACIÓN:

LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA,
SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA:

RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

015

18-abr-15

CON ESTA FECHA SE PRESENTA POR PARTE DE LA CONTRATISTA LA
ESTIMACION # UNICA DE ESTA OBRA, CON UN MONTO TOTAL DE
285,830.79, IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE EL 27
DE MARZO AL 18 DE ABRIL DEL 2015

PARA SU REVISION Y POSTERIO TRAMITE DE PAGO



DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R.,
TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME,SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 16

UBICACIÓN:

LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA,
SINDICATURA DE AHOME

CONTRATISTA:

RENE ODILON CARDENAS GARCIA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-025-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

016

18-abr-15

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, DE LA
OBRA DENOMINADA " RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE
P.T.R., TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " EUSEBIO MELENDRES " UBICADA EN LAS GRULLAS
MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME,SINALOA "

