



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL
SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL
KM 2+450, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

UBICACIÓN: CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

PROGRAMA:

MONTO: \$ 691,798.57 ✓

SUBPROGRAMA:

FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 20/03/15 ✓ REAL 20/03/15 ✓

FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 3/05/15 ✓ REAL 29/04/15 ✓

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓

DOMICILIO: CALLEJON PINO SUAREZ # 530 OTE. COL. CENTRO C.P. 81200 ✓

TELÉFONOS:

TIPO DE TRABAJO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ✓

REPRESENTANTE: ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES ✓

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1.- ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES ✓

2.- REPRESENTANTE LEGAL

3.- _____

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:

DEL MUNICIPIO DE AHOME

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON ✓

SUPERVISOR DE OBRA





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 001

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

~~1~~ 20/03/15 ✓ Se inicia con la construcción
de puente vehicular ubicado en
Bvda. Rarler, se inicia con
trazas y excavaciones ✓



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

2 24/03/15

Se continua con la Excavaciones
y se realizan retiros de
material producto de
Excavaciones ✓



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

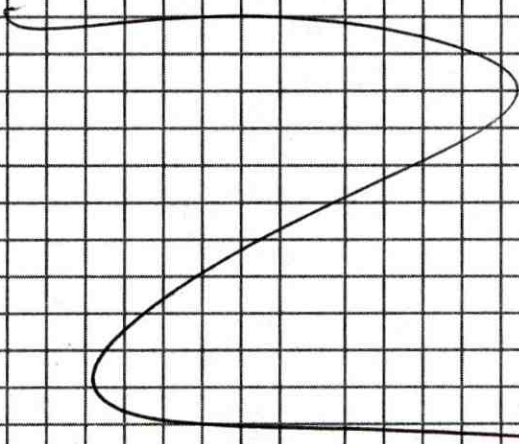
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 003

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#3	27/03/LS	se estabilizan el terreno natural con balastre, para construir Zapatas de Muro de contención, simultaneamente se trabaja en habilitado de Acero para Muros 





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

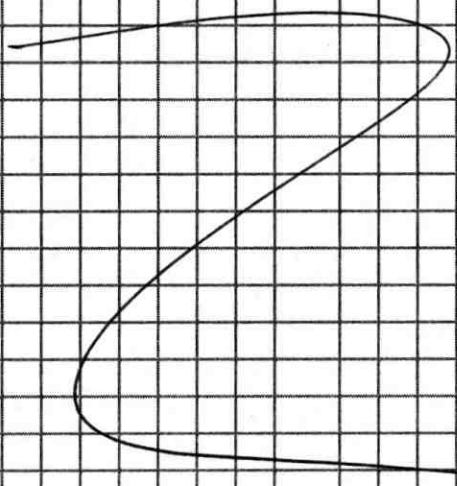


OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 004

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#4	31/03/15	se trabaja en habilitado de Acero y cimbras para zapafar de Muro de Contencion ✓   





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

#5 3/04/15

Se realiza Colado Zapatar,
simultaneamente se habilita
Acera para muros y se
inicia con el cimbrado de
los mismos





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 006

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

#6 7/04/15 Se realiza Colado de
Muro de contención, se insch,
con relleno o tendido de arena,
para recibir tubería



DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 007

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#7	11/04/15	se colocaran tubería de 90 cm y se coloca tendido a acortado de arena en la parte superior y lateral de las tuberías, tal y como se indica en proyecto, se indica con suministro de D. 400-400





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 008

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

#8 14/04/15 se realiza Descimbrar de la Muro
de retencion, se realiza
suministro, tendido y
colocacion de Material Inerte
(Balastre) Compactado



DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 009

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

#9 18/04/15 se terminan los trabajos de
suministro y compactacion de
Balastro, se inicia con
trazo para realizar colado
de garniciones tipo "L"



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 010

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#10	22/04/15	se realiza colado de guarnición tipo "Y" en un lateral de puente ✓ 
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 011

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA



NOTAS Y CROQUIS

#11 25/04/15

Se realiza cobro de ganancia
en extremo lateral del
puente ✓



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 012

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

#12 27/04/15 Se realiza colado de losas
de 15 cms de espesor ✓



[Handwritten signature]



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 013

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-026-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

43 29/04/15

Se termina con los trabajos de
calado de losa, dando así
por terminada la obra, ✓
se realiza limpieza general,
se cierra la presente
bitacora.

