



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15 ✓

PROGRAMA:

MONTO: \$ 377,526.15 ✓

SUBPROGRAMA:

FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 01/05/15 ✓ REAL 01/05/15 ✓

FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 20/05/15 ✓ REAL 20/05/15 ✓

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. ✓

DOMICILIO: CALLE BENITO JUAREZ No. 284 OTE. COL. CENTRO, CULIACAN, SINALOA

TELÉFONOS:

TIPO DE TRABAJO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO ✓

REPRESENTANTE: C. JAVIER ANTONIO PINEDA MENDI

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1.- C. CARLOS PÓSADA RIOS

2.- REPRESENTANTE LEGAL

3.- 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:

DEL MUNICIPIO DE AHOME

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO
EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

HOJA DE BITACORA No. 001

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#1	02/05/15	El día de hoy iniciamos con el trabajo de construcción del sistema de riego en parque 13 de Septiembre, se realizan trazos y se inicia con excavaciones para tuberías principal <i>Carlos Farías</i> <i>[Signature]</i>





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

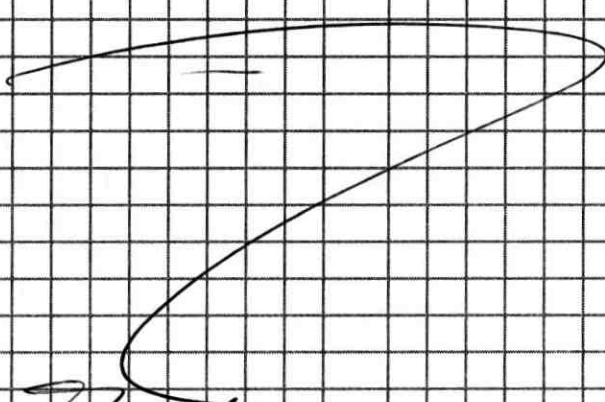


OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO
EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓


HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA. ✓

CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#2	4/05/15	Se continua con la excavaciones por tuberías principal y se inicia con las excavaciones para las tuberías secundarias, se trabaja en Afinaiones de excavaciones
		
		
		



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

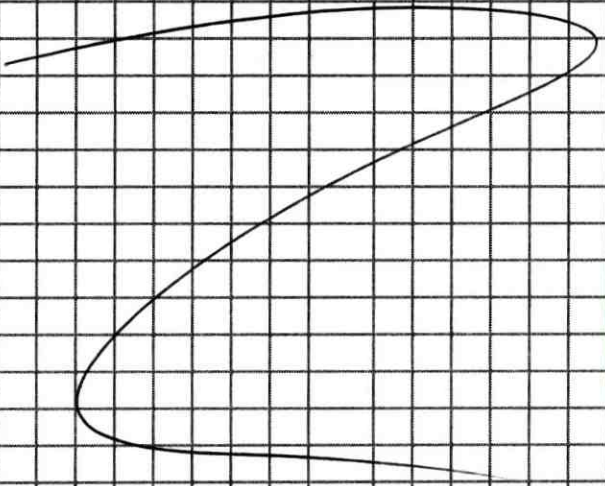

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO
EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

HOJA DE BITACORA No. 003

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#3	6/05/15	Se coloca arena fina y se inicia con la colocacion de tuberia principal, se continua con Excavaciones 
		 



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

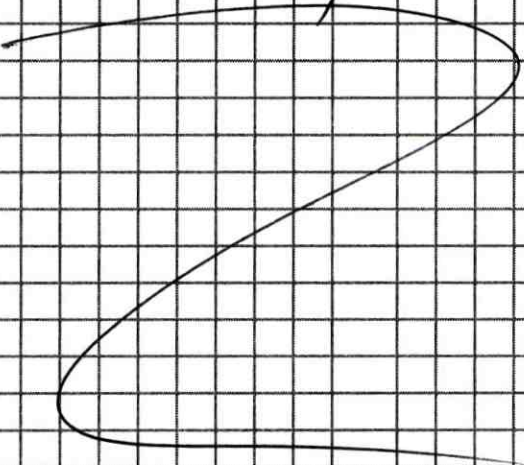

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO
EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No. 004

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#4	9/05/15	Se continua con los trabajos mencionados en la Nota #3 y se retira el material producido de excavaciones, se colocan tubos para líneas secundarias   Carlos Pazos 



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO
EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#5	12/05/15	Se termina con el tendido de tuberías principales y secundarias, se inicia con la instalación de tuberías o rumbos para aspersores, se rellena excavaciones con material producto de excavaciones
		 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
		 



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

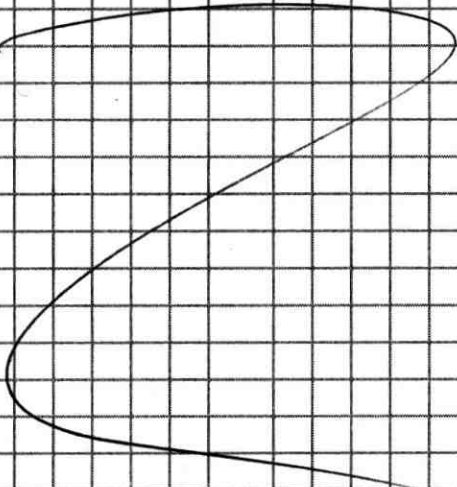

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO
EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No. 006

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#6	15/05/15	Se inicia con la colocación de Aspersores e instalación de electrovalvulas
		
		
		
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO
EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

HOJA DE BITACORA No. 007

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#7	18/05/15	se instalan Boquilla en Aspersore y se realizan pruebas del sistema, se reparan fugas, se deja funcionando correctamente
		
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO
EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No. 008

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#8	20/05/15	Se realiza limpieza general del lugar, se da por terminada la obra, se cierra la presente bitacora.
