



DESARROLLO VISTA SUR SA. DE CV.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,6 DE LAS BASES)PROGRAMA CALENDARIZADO DE USO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
MAKAM	Camion Volteo, marca: Dina capacidad: 7 m3 motor: de 175 HP	28/Jul/2014	06/Ago/2014*	<input type="checkbox"/>			
MAKBAI	Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	02/Ago/2014*	04/Ago/2014*	<input type="checkbox"/>			
MAKREVO	Revolvedora de 1 saco mipsa 4 hp	07/Ago/2014*	18/Oct/2014*		<input type="checkbox"/>		

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,10 DE LAS BASES)RELACIÓN Y PROGRAMA DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
MOCA-001	Ayudante de fierreero	13/Ago/2014*	15/Oct/2014*		[Barra]		
MOCA-002	Ayudante general	29/Jul/2014*	25/Oct/2014*	[Barra]			
MOCA-003	Ayudante de electricista	29/Sep/2014*	09/Oct/2014*			[Barra]	
MOCA-004	Oficial albañil	29/Jul/2014*	25/Oct/2014*	[Barra]			
MOCA-005	Oficial carpintero	08/Sep/2014*	15/Oct/2014*			[Barra]	
MOCA-006	Oficial electricista	29/Sep/2014*	09/Oct/2014*			[Barra]	
MOCA-007	Oficial fierrero	13/Ago/2014*	15/Oct/2014*		[Barra]		
MOCA-009	Pintor	16/Oct/2014*	18/Oct/2014*				[Barra]
MOCA-010	Peón	29/Jul/2014*	25/Oct/2014*	[Barra]			
MOCA-016	Plomero	30/Sep/2014*	25/Oct/2014*			[Barra]	
MOCA-018	Carpintero General	16/Oct/2014*	23/Oct/2014*				[Barra]
MOCA-028	Vidriero	10/Oct/2014	16/Oct/2014*				[Barra]
MOCA-029	Soldador	09/Oct/2014*	15/Oct/2014*				[Barra]

ATENTAMENTE


 ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
 REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--07-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 1



DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,10 DE LAS BASES)RELACIÓN Y PROGRAMA DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
MOCA-038	Ayudante plomero	30/Sep/2014*	25/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA:
LICITACIÓN No.:
ESPECIALIDAD:
UBICACIÓN:
FECHA:

PROGRAMA DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS A UTILIZARSE EN LA OBRA (PLANTILLA DE OBRA).

No.	CANT.	PERSONAL													OBSERVACIONES				
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO: _____ DIAS NATURALES NOMBRE Y FIRMA

FORMT03A

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,11 DE LAS BASES)RELACION DEL PERSONAL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS

Descripción	Inicia	Duración	Cantidad	Termina	2014			
					Jul	Ago	Sep	Oct
Director General	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Gerente de Control	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Jefe del departamento técnico	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Jefe de obras	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Jefe del departamento administrativo	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Jefe del departamento de compras	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				

ATENTAMENTE


 ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
 REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--07-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 1

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							
		CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.							
		TRABAJOS PRELIMINARES							
30	1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	29/Jul/2014*	0.33t	29/Jul/2014*				

ATENTAMENTE

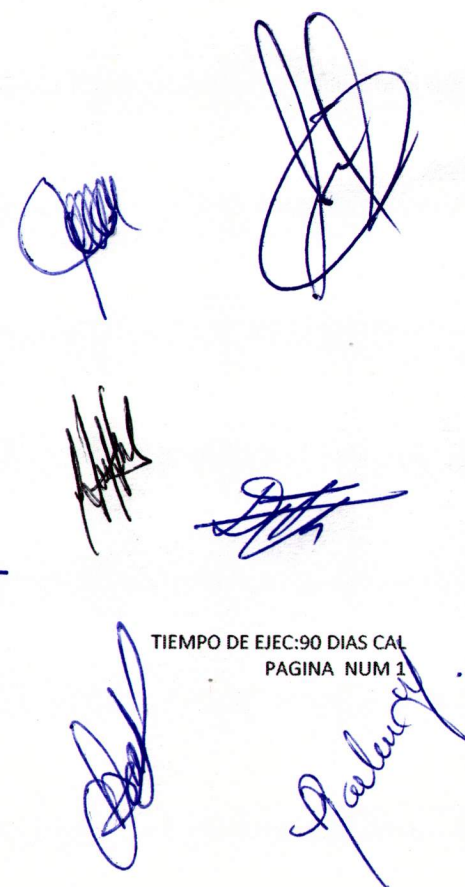

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

Roberto Luna valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1



(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
MOVIMIENTOS DE TIERRAS									
50	1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	29/Jul/2014*	7.02t	06/Ago/2014*	<input type="checkbox"/>			
60	1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR CONTRATRABE DE CIMENTACION EN MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	02/Ago/2014*	1.25t	04/Ago/2014*	<input type="checkbox"/>			
70	1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE : AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	02/Ago/2014*	1.36t	04/Ago/2014*	<input type="checkbox"/>			

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
80	1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO.	28/Jul/2014	9.33c	06/Ago/2014*	<input type="checkbox"/>			
90	1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90 % PRÓCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE : MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	05/Ago/2014*	4.21t	09/Ago/2014*	<input type="checkbox"/>			
		LOSA DE CIMENTACION.							
110	1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	07/Ago/2014*	11.36t	21/Ago/2014*	<input type="checkbox"/>			
120	1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN	11/Ago/2014*	6.83t	19/Ago/2014*	<input type="checkbox"/>			

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

Roberto Luna Valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 3

DVS

DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : CIMBRA ARMADO Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		CASTILLOS							
140	1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	13/Ago/2014*	4.09t	18/Ago/2014*		<input type="checkbox"/>		
150	1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=	16/Ago/2014*	14.5c	31/Ago/2014*		<input type="checkbox"/>		

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 4

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		MUROS Y ENRASES							
170	1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30/Ago/2014*	56c	25/Oct/2014*				
180	1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE PROMEDIO DE 12 X 15 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO CONCRETO F' C=150KG/CM2 INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES,	08/Sep/2014*	29.89t	15/Oct/2014*				

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

Roberto Luna Valdez

TIEMPO DE BIEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 5

DVS

DESARROLLO VISTA SUR SA. DE CV.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		LOSA DE CONCRETO							
200	1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 9 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGUN DETALLE DE PROYECTO. ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8" , COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	20/Sep/2014*	6.79t	29/Sep/2014*				<input type="checkbox"/>
		RECUBRIMIENTOS							

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

Roberto Luna Valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 6

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
220	1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	20/Sep/2014*	0.74t	22/Sep/2014*			<input type="checkbox"/>	
		INSTALACION ELECTRICA							
240	1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE : PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4x2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE	29/Sep/2014*	9.36t	09/Oct/2014*			<input type="checkbox"/>	

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 7

Roberto Luna U.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
260	1.9.1	<p>4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE # 14 (2.50 M.), CABLE # 12 (30 M.), CABLE # 10 (4.00 M.),MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</p> <p>INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC., LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO, MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C.(4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (</p>	30/Sep/2014*	13.65t	16/Oct/2014*				

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 8

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLÉ CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
270	1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLÉ Ó CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML) , TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML) , CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2" X 90 (4.00 PZA), CEPOL BOTE CON	04/Oct/2014*	13.65t	22/Oct/2014*				

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 9

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
280	1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	07/Oct/2014*	4.88t	13/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
290	1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 Ó SIMILAR, LLAVE	08/Oct/2014*	4.88t	14/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 10

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA , CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA							
300	1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DICA 4501 REDONDA Ó SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	11/Oct/2014*	1.95t	14/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
310	1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00 X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA NIVELAR INCLUYE : MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	13/Oct/2014*	5.07t	18/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
320	1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO BIOPLAST	12/Oct/2014*	13.5c	25/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 11

Roberto Luna Valdez



DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		HERRERIA Y CANCELERIA							
340	1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M.	09/Oct/2014*	4.88t	15/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
350	1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	10/Oct/2014	6.33c	16/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

Roberto Luna valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 12

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014				
						Jul	Ago	Sep	Oct	
HERRAMIENTA.										
360	1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	16/Oct/2014*	2.34t	18/Oct/2014*					<input type="checkbox"/>
CARPINTERIA Y CERRAJERIA										
380	1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO	16/Oct/2014*	6.24t	23/Oct/2014*					<input type="checkbox"/>

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 13

Roberto Luna valdez

DVS

DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
		LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA							
400	1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	18/Oct/2014*	7c	25/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
410	1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL.	23/Oct/2014*	0.09t	23/Oct/2014*				

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 14

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.							
		BIODIGESTOR							
		PRELIMINARES E INSTALACIÓN							
440	2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD	04/Oct/2014*	7.33c	11/Oct/2014*				
450	2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN, CON ADEME DE TABIQUE DE	11/Oct/2014*	7.43t	21/Oct/2014*				

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 15

Roberto Luna U.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		BARRO 7X14X28 CAPUCHINO, CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.							
460	2.1.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	11/Oct/2014*	14c	25/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
470	2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	16/Oct/2014*	6.5c	23/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
480	2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS MARCA BIOPLAST, INCLUYE:	22/Oct/2014*	2.67c	25/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 16

Roberto Luna U.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS WELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 17

Roberto Luna U.

[Handwritten signatures]

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
30	1.1.1	<p>(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.</p> <p>TRABAJOS PRELIMINARES</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	941.64	941.64			

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

Roberto Luna valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
MOVIMIENTOS DE TIERRAS							
50	1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	3,633.41	1,552.74	2,080.67		
60	1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR CONTRATRABE DE CIMENTACION EN MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	605.57		605.57		
70	1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE : AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	6,926.64		6,926.64		

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

Roberto Lona valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
80	1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO.	7,856.08	4,189.89	3,666.19		
90	1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90 % PRÓCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE : MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,711.83		2,711.83		
		LOSA DE CIMENTACION.					
110	1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	40,887.39		40,887.39		
120	1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN	30,438.38		30,438.38		

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 3

Roberto Luna Valdez

7

DVS

DESARROLLO VISTA SUR SA. DE CV.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : CIMBRA ARMADO Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
		CASTILLOS					
140	1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	8,687.83		8,687.83		
150	1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=	26,063.48		26,063.48		

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

Roberto Luna valdez

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NÚM 4

DVS

DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
		MUROS Y ENRASES					
170	1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	145,877.05		1,657.58	79,569.36	64,650.11
180	1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE PROMEDIO DE 12 X 15 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES,	55,037.53			34,069.90	20,967.63

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 5

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014		
				Jul	Ago	Sep

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO

200 1.6.1

LOSA DE CONCRETO DE 9 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGUN DETALLE DE PROYECTO, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8", COLADO CON CONCRETO F/C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

110,694.80

110,694.80

RECUBRIMIENTOS

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

Roberto Luna Valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 6

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
220	1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,398.48			2,398.48	
		INSTALACION ELECTRICA					
240	1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE : PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4x2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE	33,012.12			7,053.87	25,958.25

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJE:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 7

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

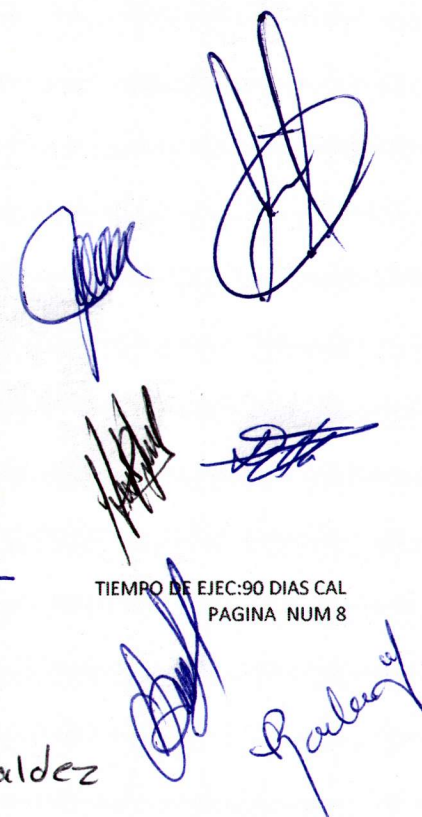
ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
260	1.9.1	<p>4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE # 14 (2.50 M.), CABLE # 12 (30 M.), CABLE # 10 (4.00 M.), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</p> <p>INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC., LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO, MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C.(4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (</p>	33,522.04			2,455.82	31,066.22

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



Roberto Luna Valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 8

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLÉ CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
270	1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLE Ó CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML) , TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML) , CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2" X 90 (4.00 PZA), CEPOL BOTE CON	29,442.40				29,442.40

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 9

Roberto Luna valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS



ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
280	1.9.3	SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	44,049.98				<input type="checkbox"/> 44,049.98
290	1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	29,842.92				<input type="checkbox"/> 29,842.92

ATENTAMENTE




ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014



TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 10


Roberto Luna valdez



DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA , CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA					
300	1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DICA 4501 REDONDA O SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	7,235.96				<input type="checkbox"/> 7,235.96
310	1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00 X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA NIVELAR INCLUYE : MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	13,789.44				<input checked="" type="checkbox"/> 13,789.44
320	1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO BIOPLAST	63,257.08				<input checked="" type="checkbox"/> 63,257.08

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 11

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
		HERRERIA Y CANCELERIA					
340	1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M.	19,431.68				<input type="checkbox"/> 19,431.68
350	1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	22,136.52				<input type="checkbox"/> 22,136.52

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EIEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 12

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
HERRAMIENTA.							
360	1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	5,349.26				5,349.26
CARPINTERIA Y CERRAJERIA							
380	1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO	45,241.28				45,241.28

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 13

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
		LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA					
400	1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	7,573.02				7,573.02
410	1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL.	947.94				947.94

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 14

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.					
		BIODIGESTOR					
		PRELIMINARES E INSTALACIÓN					
440	2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD	24,162.16				<input type="checkbox"/> 24,162.16
450	2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN, CON ADEME DE TABIQUE DE	36,176.76				<input type="checkbox"/> 36,176.76

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJE 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 15


Roberto Luna valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS




ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
460	2.1.3	BARRO 7X14X28 CAPUCHINO, CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	12,971.60				12,971.60
470	2.1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	319,378.98				319,378.98
480	2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	42,022.30				42,022.30
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS MARCA BIOPLAST, INCLUYE:					


ATENTAMENTE


ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014




TIEMPO DE EJEC 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 16


Roberto Luna Valdez




DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					

ATENTAMENTE


 ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014





 Roberto Luna U.

 TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 17



DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
7X14X28	LADRILLO DE BARRO REGIONAL DE 7 x 14 x 28 CMS.	PZA	5,510.00				<input type="text" value="5,310.00"/>
ACCESO1	ACCESORIOS PARA W.C.(MANGUERAS, LLAVES, PIJAS, PEGAMENTO, ASIENTO, ETC	JGO	5,778.66				<input type="text" value="5,778.66"/>
ACCESO2	ACCESORIOS PARA LAVABO.(MANGUERAS, LLAVES, PIJAS, PEGAMENTO, CESPOL, ADAPTADOR, ETC	PZA	10,538.54				<input type="text" value="10,538.54"/>
ADACPVC13	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 13 MM	PZA	532.00			38.97	<input type="text" value="493.03"/>
AGUA	AGUA	M3	45.71		<input type="text" value="19.09"/>	<input type="text" value="11.86"/>	<input type="text" value="14.76"/>
ALUM1	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA	PZA	3,382.00			722.65	<input type="text" value="2,659.35"/>
ALUM11	CABLE CONDULAC # 14	ml	807.50			172.54	<input type="text" value="634.96"/>
ALUM2	CABLE CONDULAC # 8	ML	1,937.81			414.06	<input type="text" value="1,523.75"/>
ALUM3	CABLE CONDULAC # 10	ML	687.80			146.97	<input type="text" value="540.83"/>

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
ALUM4	APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS, INCLUYE; TAPA	PZA	2,817.32			601.99	2,215.33
ALUM5	CAJA GALVANIZADA DE 3"	PZA	307.80			65.77	242.03
ALUM6	CABLE CONDULAC # 12	ML	2,881.92			615.79	2,266.13
ALUM8	CAJA GALVANIZADA DE 2"X4"	PZA	1,033.60			220.85	812.75
ALUM9	POLIDUCTO NARANJA DE 1/2"	ML	1,402.20			299.62	1,102.58
ANUNCIO	ANUNCIO DE OBRA DE ACUERDO A MODELO DE LA CONTRATANTE	PZ	703.76				703.76
ARBOR1	MADERA DE PINO EN DUELA	PT	19,945.51			17,704.10	2,241.41
BIODI600	BIODIGESTOR DE 600 LTS	PZ	238,458.36				238,458.36
BOIDI450	PAQUETE DE TINACO BIOPLAST DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE, MATERIALES,	PZA	38,000.00				38,000.00

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VE DERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014


TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
	ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
CAL-HIDRA	CALHIDRA MARCA CALPAC	TON	37.24	37.24			
CANTOROD1	GRAVA DE 3/4"	M3	9,704.69		4,078.90	683.28	4,942.51
CANTOROD2	ARENON	M3	6,938.96		2,433.10	458.33	4,047.53
CEM-GRI	CEMENTO GRIS	TON	38,868.66		16,697.22	9,909.66	12,261.78
CESPVC102	CESPOL DE BOTE PVC 102 MM C//SAL/2	PZA	1,330.00				1,330.00
COCPVC13	COPE LISO CPVC DE 13 MM	PZA	769.50			56.37	713.13
CODCPVC13	CODO LISO CPVC DE 13 MM X 90°	PZA	233.70			17.12	216.58
CODPVC102	CODO PVC 102 MM X90°	PZA	1,077.30				1,077.30
COPCPVCRI	COPE CPVC ROSCA EXTERIOR	PZA	649.80			47.60	602.20
COPPVC102	COPE PVC 102 MM	PZ	570.00				570.00

ATENTAMENTE


 ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
 REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 3



DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
COPPVC51	COPLE PVC DE 51 MM	PZ	76.00				76.00
COPVC38	CODO PVC 38 MM X90°	PZA	692.55				692.55
HYLOPLAST	HILO DE NYLON	ROLLO	18.38	18.38			
LLAVE1	LLAVE PARA REGADERA CON CHAPETON Y MANERAL	PZA	4,484.00			328.50	4,155.50
M-MUR	BLOCK CONCRETO 12X20X40 CMS.	PZ	57,602.31		654.52	31,419.47	25,528.32
PAINT001	THINER COMERCIAL TRANSPARENTE	LITRO	108.30				108.30
PAINT002	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA ADLER	LT	798.00				798.00
PTA65X210	PUERTA MULTYPANEL LISA DE 65X210 CM., INCLUYE: CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, CHILILLOS	PZA	29,450.00				29,450.00
REDPVC51	REDUCCIÓN PVC 51 MM A 38 MM	PZA	233.70				233.70

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS WELDERRAIN REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 4

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
REG001	REGISTRO DE LODOS BIOPLAST	PZ	27,293.50				27,293.50
REGAECO1	REGADERA ECONOMICA DICA	PZA	3,258.50				<input type="checkbox"/> 3,258.50
SANIT1	SANITARIO BLANCO (PAQUETE)	PZA	23,180.00				<input type="checkbox"/> 23,180.00
SANIT2	LAVABO BLANCO ECONOMICO	PZA	7,030.00				<input type="checkbox"/> 7,030.00
SIDER1	ARMEX 12X20-4	PZA	5,761.03		<input type="checkbox"/> 5,761.03		
SIDER11	CLAVO DE ACERO CON CABEZA DE 2" A 4".	KG	2,106.34			<input type="checkbox"/> 1,869.64	236.70
SIDER12	MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M	TRAMO	5,510.00				<input type="checkbox"/> 5,510.00
SIDER14	ACERO DE REFUERZO FY = 4200KG/CM2 DE 3/8" A 3/4" DE Ø	KG	13,787.52		<input type="checkbox"/> 8,592.22	<input type="checkbox"/> 3,216.05	1,979.25
SIDER2	Malla electosoldada 6-6 10/10 (rollo	2,688.74		<input type="checkbox"/> 2,688.74		

ATENTAMENTE



ARQ. CARLOS ALBERTO TRÁPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 5

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
	100M2)						
SIDER3	Alambre recocido # 16.	kg	523.99			465.11	58.88
SIDER4	Malla electosoldada 6-6 6/6 (100M2)	rollo	5,346.98			5,346.98	
SIDER5	Acero de refuerzo núm. 2 (1/4")	kg	2,407.24			2,136.72	270.52
SIDER6	CLAVO DE 2 1/2"	KG	4.49	4.49			
SOQPORCE	SOCKET DE PORCELANA	PZA	950.00			202.99	747.01
TAPACPVC13	TAPON HEMBRA DE CPVC DE 13 MM	PZA	58.90			4.32	54.58
TEECPVC13	"TEE" LISA DE CPVC DE 13 MM	PZA	684.00			50.11	633.89
TERRACE1	BALASTRE CRIBADO	M³	3,275.22	1,746.78	1,528.44		
TUCPVC13	TUBERIA DE CPVC DE 13 MM	ML	6,748.79			494.41	6,254.38
TUPVC102	TUBO PVC 102 MM SANITARIO	ML	2,063.76				2,063.76
TUPVC38	TUBO PVC 38 MM SANITARIO	ML	8,486.05				8,486.05

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 6

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
TUPVC51	TUBO PVC 51 MM SANITARIO	ML	3,079.51				3,079.51
VENT40X40	VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	15,200.00				5,200.00
YEPCVC102	YEE PVC DE 102 A 51 MM	PZA	2,014.49				2,014.49

ATENTAMENTE


 ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
 REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 7

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACION No.: _____

ESPECIALIDAD: _____
UBICACION: _____
PLAZO DE EJECUCION: _____
FECHA: _____

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES

FOLIO O CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	MONTO TOTAL	MESES			

FORME10



DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,8 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA EL USO DE LA PLANTILLA DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
MOCA-001	Ayudante de fierreero	jor	5,882.00		2,364.06	2,737.39	780.55
MOCA-002	Ayudante general	jor	70,804.00	288.83	10,878.00	27,086.96	32,550.21
MOCA-003	Ayudante de electricista	jor	4,629.92			989.30	3,640.62
MOCA-004	Oficial albañil	jor	98,852.80	386.45	21,161.52	51,040.56	26,264.27
MOCA-005	Oficial carpintero	JOR	23,636.38			20,980.20	2,656.18
MOCA-006	Oficial electricista	jor	5,628.71			1,202.71	4,426.00
MOCA-007	Oficial fierreero	jor	9,654.28		4,455.39	3,727.83	1,471.06
MOCA-009	Pintor	jor	1,613.67				1,613.67
MOCA-010	Peón	JOR	40,574.29	1,208.73	8,783.22	602.44	29,979.90
MOCA-016	Plomero	jor	39,451.74			535.22	38,916.52
MOCA-018	Carpintero General	jor	3,873.63				3,873.63
MOCA-028	Vidriero	jor	1,368.72				1,368.72
MOCA-029	Soldador	jor	6,843.61				6,843.61

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1



DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,8 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA EL USO DE LA PLANTILLA DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
MOCA-038	Ayudante plomero	jor	29,208.16			396.26	28,811.90

ATENTAMENTE



ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACION No.: _____
ESPECIALIDAD: _____
UBICACION: _____
PLAZO DE EJECUCION: _____
FECHA: _____

**PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA OCUPACION DEL PERSONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (PLANTILLA DE OBRA)**

FOLIO O CLAVE	DESCRIPCION	NUM. DE PERSONAS	MONTO TOTAL	MESES						

FORME11



(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,9 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA EL USO DE LA PLANTILLA TECNICO ADMISNITRATIVA

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2014			
			Jul	Ago	Sep	Oct
Director General	213.55	11,755.12	612.26	3,979.59	3,979.59	3,183.68
Gerente de Control	164.27	14,769.25	769.25	5,000.00	5,000.00	4,000.00
Jefe del departamento técnico	197.13	10,850.88	565.16	3,673.47	3,673.47	2,938.78
Jefe de obras	180.70	16,246.18	846.17	5,500.00	5,500.00	4,400.00
Jefe del departamento administrativo	180.70	9,946.64	518.07	3,367.35	3,367.35	2,693.87
Jefe del departamento de compras	131.42	11,815.40	615.40	4,000.00	4,000.00	3,200.00

ATENTAMENTE


 ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
 REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--07-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 1

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACION No.: _____

ESPECIALIDAD: _____
UBICACION: _____
PLAZO DE EJECUCION: _____
FECHA: _____

**PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA OCUPACION DEL PERSONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (PLANTILLA TECNICO-ADMINISTRATIVA)**

FOLIO O CLAVE	DESCRIPCION	NUM. DE PERSONAS	MONTO TOTAL	MESES						

FORME11A
